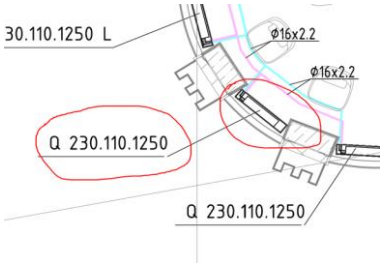
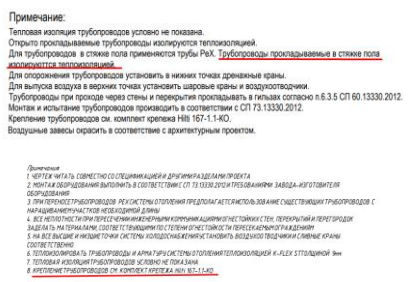



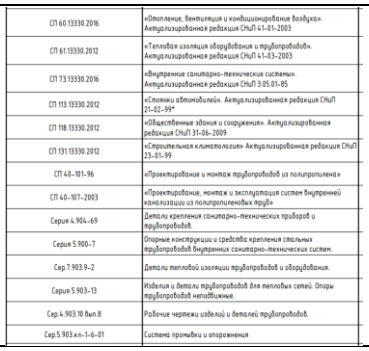

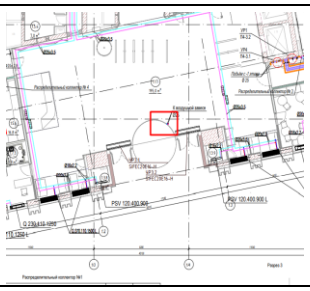
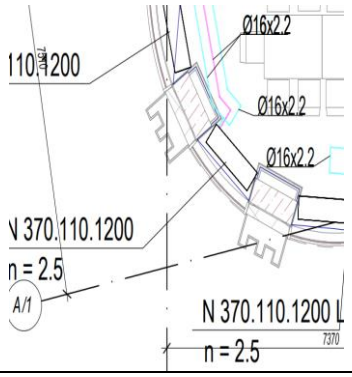
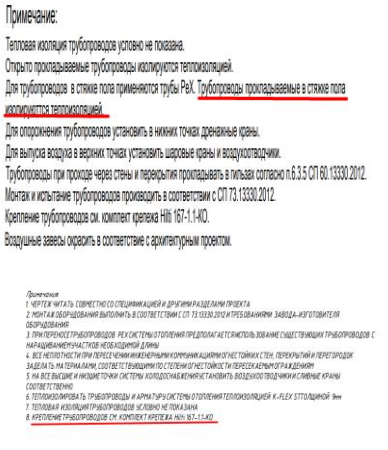
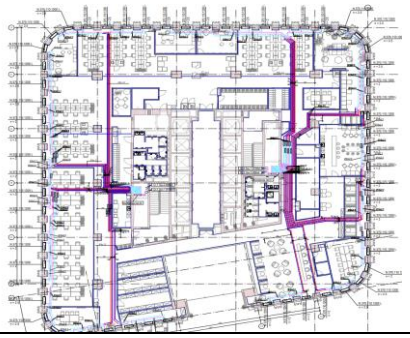
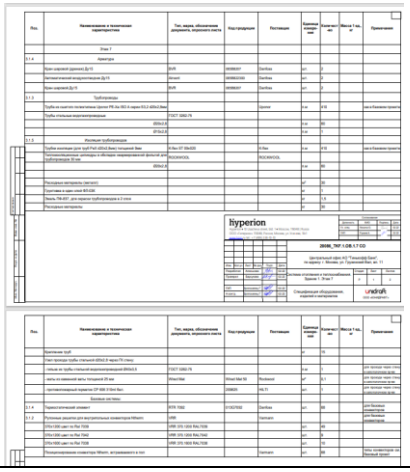





Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	1			Добавить ХОВС на тепловые завесы в ОД		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в ОД перечислены не все виды скрытых работ, для которых необходимо составлять акты		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В Общих данных в разделе климатические данные дописать расчетные температуры внутреннего воздуха для помещений различного назначения (по аналогии с UNI)		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Как предполагается защищать смонтированные трубопроводы PEX в теплоизоляции на время производства монтажных работ?		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Совместно с разработчиками электрических и слаботочных систем, разработать узлы совместной прокладки (параллельная и перпендикулярная) коммуникаций в фальшполу. Указать приоритетность прокладки для спорных участков		Антон Серков
1.ОВ.1	1			На РД проверить возможность монтажа существующих конвекторов с учетом отделки АИ. По критичным местам оповестить Заказчика. См. письмо от 09.06.2022	Пример 1-го этажа: 	Антон Серков
1.ОВ.1	1			По примечаниям: 1) Если фальшпол а не стяжка, трубы не изолируются? Какая изоляция применяется? 2) Крепление Hilti не используем. Заменить ссылку на Termoclip 3) Написать в примечаниях, что узлы ввода остаются существующие 4) Чем изолируются стальные трубы		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Скоординировать решение по переносу коллекторов с разработчиком ОВ1 по -1-ому этажу		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Прописать (планы, схемы), какие узлы обвязки новые, какие существующие		Антон Серков
1.ОВ.1	1			На планах на приборах отопления указать настройку клапана		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Какой изоляцией покрываются трубопроводы проложенные в пространстве подшивного потолка? Выполнить требование СТУ ПБ		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Тип завес и цвет RAL завес согласованы с АИ?		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Тип приборов отопления и Цвет RAL приборов отопления согласованы с АИ		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Проверить возможность установки головки ручного привода Varmann на терморегулирующий клапан Danfoss		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Выделить заголовок демонтируемого материала жирным цветом		Антон Серков



Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	1			Позиции пробить согласно нумерации WBS		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в общие указания по монтажу по установки приборов внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в монтажную спецификацию работы по установки приборов **БАЗОВЫХ** внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Как крепятся тепловые завесы? Дать указания. Заложить в спецификацию опциональные крепежные принадлежности.		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В документации отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям. Добавить приложение		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Добавить приложение		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Дополнить документацию расчетами теплопотерь, для помещений где происходит замена приборов отопления		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов и теплоизоляции заложенных в спецификации		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В спецификации теплоизоляцию для полиэтиленовых труб заложить отдельной позицией. Повторное использование изоляции не предполагаем. Количество изоляции должно быть равно новые труб + перекладываемые	 Вот так примерно: 	Антон Серков
1.ОВ.1	1			Заложить дополнительную рулонную изоляцию в м2, для изоляции трубопроводной арматуры		Антон Серков
1.ОВ.1	1			При проектировании учесть: последнюю ревизию РД Горпроекта от 2021_12_17; записи зафиксированные в журнале авторского надзора Горпроект;		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Отчертить перекладываемые и наращиваемые участки трубопроводов в Revit модели. Заполнить параметры: WBS, уровня, здания		Антон Серков




Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	1			Добавить подписи на титульный лист		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в перечень нормативной документации		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Поменять фамилию ГИПа в клятве. Рузаев на проекте не участвует		Антон Серков
1.ОВ.1	1			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD). Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
1.ОВ.1	1			По примечаниям на планах просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD). Выписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить подписи в штампы		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Увязать трубопроводы систем отопления и теплоснабжения со смежными разделами		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Выдать задания смежникам. Предоставить список выданных/не выданных заданий		Антон Серков
1.ОВ.1	1			В спецификацию заложить комплект крепежного материала; комплект расходного материала; комплект крепежного материала для тепловых завес		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Переименовать папку RWT на RVT		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Даны не все привязки к трубам Даны не все выноски		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в проект схему узла обвязки приточной установки		Антон Серков
1.ОВ.1	1			На плане отобразить существующую завесу. В спецификации заложить покраску. Цвет согласовать с АИ		Антон Серков




Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	1			На плане показано 4 узла обвязки, на схеме 2. В спецификации 2. Схемы показать для 4-х узлов. Для остальных приточных установок существующие узлы не демонтируются?		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Том 20086_TKF.1.OB.4 не соответствует тому 20086_TKF.1.OB.1.1 по расположению точек подвода теплоносителя. Привести в соответствие		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Добавить в проект схему узла обвязки приточной установки		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Добавить в ОД перечислены не все виды скрытых работ, для которых необходимо составлять акты		Антон Серков
1.ОВ.1	2			В Общих данных в разделе климатические данные дописать расчетные температуры внутреннего воздуха для помещений различного назначения (по аналогии с UNI)		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Как предполагается защищать смонтированные трубопроводы PEX в теплоизоляции на время производства монтажных работ?		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Совместно с разработчиками электрических и слаботочных систем, разработать узлы совместной прокладки (параллельная и перпендикулярная) коммуникаций в фальшполу. Указать приоритетность прокладки для спорных участков		Антон Серков
1.ОВ.1	2			На РД проверить возможность монтажа существующих конвекторов с учетом отделки АИ. По критичным местам оповестить Заказчика. См. письмо от 09.06.2022	Пример с 2-го этажа: 	Антон Серков
1.ОВ.1	2			По примечаниям: 1) Если фальшпол а не стяжка, трубы не изолируются? Какая изоляция применяется? 2) Крепление Hilti не используем. Заменить ссылку на Termoclip 3) Написать в примечаниях, что узлы ввода остаются существующие 4) Чем изолируются стальные трубы		Антон Серков



Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	2			Подложку выполнить в серых полутонах, сливаются с подложками		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Оформление спецификации выполнить по аналогии 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD)		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Позиции пробить согласно нумерации WBS		Антон Серков
1.ОВ.1				указать способ управления (индивидуальное от датчика внутри помещения или группой или вручную)внутрипольными конвекторами; приложить схему, дополнить спецификацию. Если автоматическое управление не применяется - приложить таблицу уставок всех балансировочных клапанов. Для всех этажей.		Сергей Павлов
1.ОВ.1	2			Добавить в общие указания по монтажу по установки приборов внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Добавить в монтажную спецификацию работы по установки приборов **БАЗОВЫХ** внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
1.ОВ.1	2			В документации отсутствуют указания к креплению труб PEX		Антон Серков
1.ОВ.1	2			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Добавить приложение		Антон Серков
1.ОВ.1	2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов и теплоизоляции заложенных в спецификации		Антон Серков




Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	2			В спецификации теплоизоляцию для полиэтиленовых труб заложить отдельной позицией. Повторное использование изоляции не предполагаем. Количество изоляции должно быть равно новые труб + перекладываемые	 Вот так примерно: 	Антон Серков
1.ОВ.1	2			При проектировании учесть: последнюю ревизию РД Горпроекта от 2021_12_17; записи зафиксированные в журнале авторского надзора Горпроект;		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Отчертить перекладываемые и наращиваемые участки трубопроводов в Revit модели. Заполнить параметры: WBS, уровня, здания		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Добавить подписи на титульный лист		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Добавить в перечень нормативной документации		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Поменять фамилию ГИПа в клятве. Рузаев на проекте не участвует		Антон Серков
1.ОВ.1	2			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD). Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
1.ОВ.1	2			По примечаниям на планах просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD). Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Добавить подписи в штампы		Антон Серков

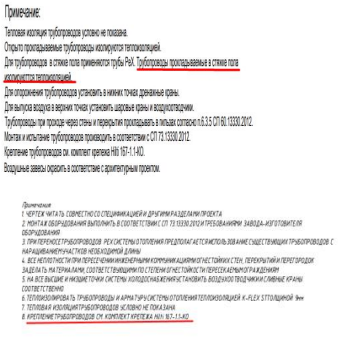
Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	2			В спецификацию заложить комплект крепежного материала; комплект расходного материала; термоголовку, решетки с указанием RAL для конвекторов и т.д. (по аналогии 20086_TKF.1.ОВ.1.7)		Антон Серков
1.ОВ.1	2			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7_Выписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
1.ОВ.1	2			Даны не все привязки к трубам Даны не все выноски		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить ХОВС на тепловые завесы в ОД		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить в ОД перечислены не все виды скрытых работ, для которых необходимо составлять акты		Антон Серков
2.ОВ.2	1			В Общих данных в разделе климатические данные дописать расчетные температуры внутреннего воздуха для помещений различного назначения (по аналогии с UD)		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Как предполагается защищать смонтированные трубопроводы PEX в теплоизоляции на время производства монтажных работ?		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Совместно с разработчиками электрических и слаботочных систем, разработать узлы совместной прокладки (параллельная и перпендикулярная) коммуникаций в фальшполу. Указать приоритетность прокладки для спорных участков		Антон Серков
2.ОВ.2	1			На РД проверить возможность монтажа существующих конвекторов с учетом отделки АИ. По критичным местам оповестить Заказчика. См. письмо от 09.06.2022	Пример с 1-го этажа: 	Антон Серков
2.ОВ.2	1			По примечаниям: 1) Если фальшпол а не стяжка, трубы не изолируются? Какая изоляция применяется? 2) Крепление Hilti не используем. Заменить ссылку на Termoclip 3) Написать в примечаниях, что узлы ввода остаются существующие 4) Чем изолируются стальные трубы		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Скоординировать решение по переносу коллекторов с разработчиком ОВ1 по -1-ому этажу		Антон Серков

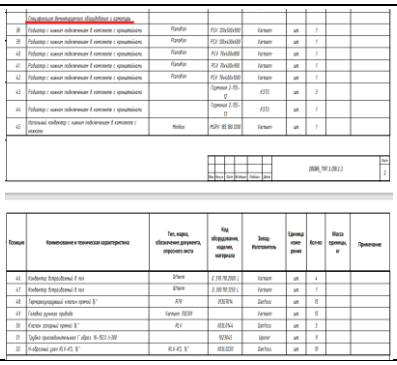Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	1			Прописать (планы, схемы), какие узлы обвязки новые, какие существующие		Антон Серков
2.ОВ.2	1			На планах на приборах отопления указать настройку клапана		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Какой изоляцией покрываются трубопроводы проложенные в пространстве подшивного потолка? Выполнить требование СТУ ПБ		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Тип завес и цвет RAL завес согласованы с АИ?		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Тип приборов отопления и Цвет RAL приборов отопления согласованы с АИ		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Проверить возможность установки головки ручного привода Varmann на терморегулирующий клапан Danfoss		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Выделить заголовок демонтируемого материала жирным цветом		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Позиции пробить согласно нумерации WBS		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить в общие указания по монтажу по установки приборов внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить в монтажную спецификацию работы по установки приборов **БАЗОВЫХ** внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Как крепятся тепловые завесы? Дать указания. Заложить в спецификацию опциональные крепежные принадлежности.		Антон Серков
2.ОВ.2	1			В документации отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям. Добавить приложение		Антон Серков
2.ОВ.2	1			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Добавить приложение		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Дополнить документацию расчетами теплопотерь, для помещений где происходит замена приборов отопления		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	1			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов и теплоизоляции заложенных в спецификации		Антон Серков
2.ОВ.2	1			В спецификации теплоизоляцию для полиэтиленовых труб заложить отдельной позицией. Повторное использование изоляции не предполагаем. Количество изоляции должно быть равно новые труб + перекладываемые	 Вот так примерно: 	Антон Серков
2.ОВ.2	1			Заложить дополнительную рулонную изоляцию в м2, для изоляции трубопроводной арматуры		Антон Серков
2.ОВ.2	1			При проектировании учесть: последнюю ревизию РД Горпроекта от 2021_12_17; записи зафиксированные в журнале авторского надзора Горпроект;		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Дополнить документацию ВОQ		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Отчертить перекладываемые и наращиваемые участки трубопроводов в Revit модели. Заполнить параметры: WBS, уровня, здания		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить подписи на титульный лист		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить в перечень нормативной документации		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Поменять фамилию ГИПа в клятве. Рузаев на проекте не участвует		Антон Серков
2.ОВ.2	1			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD). Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
2.ОВ.2	1			По примечаниям на планах просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7 (UD)Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков

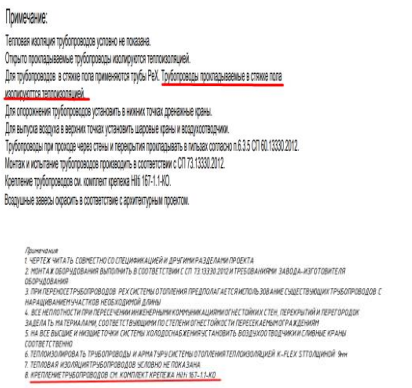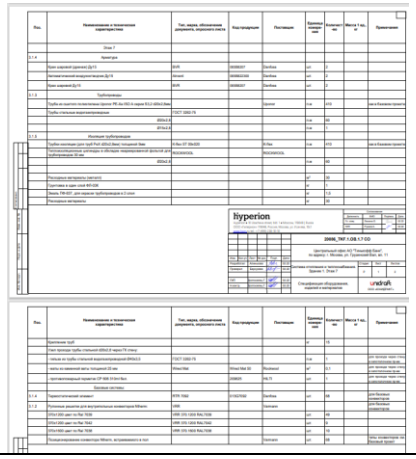Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	1			Добавить подписи в штампы		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Увязать трубопроводы систем отопления и теплоснабжения со смежными разделами		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Выдать задания смежникам. Предоставить список выданных/не выданных заданий		Антон Серков
2.ОВ.2	1			В спецификацию заложить комплект крепежного материала; комплект расходного материала; комплект крепежного материала для тепловых завес		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Даны не все привязки к трубам Даны не все выноски		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Добавить в проект схему узла обвязки приточной установки		Антон Серков
2.ОВ.2	1			На плане отобразить существующую завесу. В спецификации заложить покраску. Цвет согласовать с АИ		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Добавить в ОД перечислены не все виды скрытых работ, для которых необходимо составлять акты		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В Общих данных в разделе климатические данные дописать расчетные температуры внутреннего воздуха для помещений различного назначения (по аналогии с UD)		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Как предполагается защищать смонтированные трубопроводы PEX в теплоизоляции на время производства монтажных работ?		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Совместно с разработчиками электрических и слаботочных систем, разработать узлы совместной прокладки (параллельная и перпендикулярная) коммуникаций в фальшполу. Указать приоритетность прокладки для спорных участков		Антон Серков
2.ОВ.2	2			По примечаниям: 1) Если фальшпол а не стяжка, трубы не изолируются? Какая изоляция применяется? 2) Крепление Hilti не используем. Заменить ссылку на Termoclip 3) Написать в примечаниях, что узлы ввода остаются существующие 4) Чем изолируются стальные трубы		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Оформление спецификации выполнить по аналогии 20086_TKF.1.ОВ.1.7		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	2			Позиции пробить согласно нумерации WBS		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Добавить в общие указания по монтажу по установки приборов внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Добавить в монтажную спецификацию работы по установки приборов **БАЗОВЫХ** внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В документации отсутствуют указания к креплению труб PEX		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Добавить приложение		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов и теплоизоляции заложенных в спецификации		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В спецификации теплоизоляцию для полиэтиленовых труб заложить отдельной позицией. Повторное использование изоляции не предполагаем. Количество изоляции должно быть равно новые труб + перекладываемые	 Вот так примерно: 	Антон Серков
2.ОВ.2	2			При проектировании учесть: последнюю ревизию РД Горпроекта от 2021_12_17; записи зафиксированные в журнале авторского надзора Горпроект;		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Отчертить перекладываемые и наращиваемые участки трубопроводов в Revit модели. Заполнить параметры: WBS, уровня, здания		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Добавить подписи на титульный лист		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	2			Добавить в перечень нормативной документации		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Поменять фамилию ГИПа в клятве. Рузаев на проекте не участвует		Антон Серков
2.ОВ.2	2			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7_Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
2.ОВ.2	2			По примечаниям на планах просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7_Вписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Добавить подписи в штампы		Антон Серков
2.ОВ.2	2			В спецификацию заложить комплект крепежного материала; комплект расходного материала; термоголовку, решетки с указанием RAL для конвекторов и т.д. (по аналогии 20086_TKF.1.ОВ.1.7_(UD))		Антон Серков
2.ОВ.2	2			По общим данным просьба из тома 20086_TKF.1.ОВ.1.7. (UD). Выписать дополнительные требования и указания Предлагаю по данному вопросу созвониться и обсудить		Антон Серков
2.ОВ.2	2			Даны не все привязки к трубам Даны не все выноски		Антон Серков
1.ОВ.1	20			Добавить в ОД перечислены не все виды скрытых работ, для которых необходимо составлять акты. Добавить: испытание приборов отопления на тепловой эффект.		Антон Серков
1.ОВ.1	20			Увязать системы теплоснабжения с другими инженерными системами		Антон Серков
1.ОВ.1	20			В спецификации отсутствует теплоизоляция для систем теплоснабжения		Антон Серков
1.ОВ.1	20			При необходимости добавить на систему теплоснабжению сливные краны и воздухоотводчики		Антон Серков
1.ОВ.1	20			Добавить в монтажную спецификацию работы по установки приборов **БАЗОВЫХ** внутрипольных конвекторов в проектное положение (в плане и по высоте)		Антон Серков
1.ОВ.1	3-19			Обновить архитектурную подложку, при необходимости внести корректировку в трассировку трубопроводов		Антон Серков
1.ОВ.1	1-20			Дать указание по привязке внутрипольного конвектора в плане (Например 100 мм от остекления и выполнить центрирование относительно зашивки пилонов);		Антон Серков
1.ОВ.1	1-2			Отсутствуют типоразмеры декоративных решеток для внутрипольных конвекторов		Антон Серков
1.ОВ.1	1-2			Узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Исключить узлы не используемые в проекте.		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ОВ.1	1-2			Узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкция. Исключить узлы не используемые в проекте.		Антон Серков
1.ОВ.1	1-2			Зачем выполняется демонтаж/монтаж систем в помещения арендодателя в осях 1/3-1/4:К-П		Антон Серков
1.ОВ.1	1			Повторное использование стальных трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения не допускается. Скорректировать указания и спецификацию.		Антон Серков
2.ОВ.2	3-11			Обновить архитектурную подложку, при необходимости внести корректировку в трассировку трубопроводов		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Дополнить примечания на планах недостающими пунктами из типовой книги 20086_TKF.2.ОВ.2.7		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Добавить настройки клапанов на прибор отопления		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Конвекторов 91 шт, а термоэлементов 93шт. Где правильное количество?		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Заложено 20 пустых секций конвектора. Всего меняем 10 приборов в зоне ГА. Зачем 20 секций. Необходимо указать, что меняется корпус, а сам теплообменник и арматура к нему остается		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			В документации отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Дать указание как крепить трубопроводы из сшитого полиэтилена в полу		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции: - проходки негорючих горючих труб через ограждающие конструкции без предела огнестойкости; - проходками негорючих труб через ограждающие конструкции с пределом огнестойкости; - проходки горючих труб через ограждающие конструкции без предела огнестойкости; - проходками горючих труб через ограждающие конструкции с пределом огнестойкости (если таковые имеются в системе отопления). Для таких проходок предусмотреть противопожарные манжеты (вспенивающаяся противопожарная лента);		Антон Серков
2.ОВ.2	1-13			Дать указание по привязке внутрипольного конвектора в плане (Например 100 мм от остекления и выполнить центрирование относительно зашивки пилонов);		Антон Серков
2.ОВ.2	12-13			Дать указания по теплоизоляции трубопроводов при их прокладке в пространстве подшивного потолка (согласно СТУ ПБ);		Антон Серков
2.ОВ.2	12			На системе теплоснабжения фанкойлов отсутствуют: тип изоляции, сливные краны и воздухоотводчики, сетевая запорная арматура;		Антон Серков
2.ОВ.2	12			На аксонометрической схеме систем теплоснабжения фанкойлов отсутствуют: уклоны, расходы, высотные отметки;		Антон Серков
2.ОВ.2	13			Отсутствуют узлы подключения для напольных конвекторов с нижним подключением		Антон Серков
2.ОВ.2	13			Почему позиционирование конвекторов заложено в количестве 71шт, если всего приборов отопления 65?		Антон Серков
2.ОВ.2	1-2			Отсутствуют типоразмеры декоративных решеток для внутрипольных конвекторов		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ОВ.2	1-2			Узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции. Исключить узлы не используемые в проекте.		Антон Серков
2.ОВ.2	1-2			Узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкция. Исключить узлы не используемые в проекте.		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Повторное использование стальных трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения не допускается. Скорректировать указания и спецификацию.		Антон Серков
2.ОВ.2	1			Спецификация не соответствует BOQ и решениям на плане. Привести в соответствие.		Антон Серков
2.ОВ.2	3-4			Не проработан узел подключения приборов отопления с боковым подключением (в частности подвода трубопроводов к прибору отопления).		Антон Серков
2.ОВ.2	4			Исключить из спецификации стальные трубопроводы используемые в системе рекуперации с промежуточным теплоносителем. Они учтены в книге 20086_TKF.2.OB.5.4		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			В ОД добавить нормативную документацию, по которой разрабатывалась РД Арендодателя. Дополнить монтажные указания отсутствующими пунктами из книги 20086_TKF.1.OB.1.7		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Отсутствуют привязки к перекладываемым участкам трубопроводов		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Отсутствуют выноски с указанием номеров перекладываемых существующих систем		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Для наглядности на монтажных планах желательно показать разводку базовых систем отопления в серых тонах		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Фитинги (отводы, переходы, тройники и т.д.) включить в длину трубопровода. Отдельно каждый элемент (фитинг) не расписывать. Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов и теплоизоляции заложенных в спецификации		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
0.ОВ.3	-2			В спецификации не заложены сливные краны и воздухоотводчики на магистральных трубопроводов		Антон Серков
0.ОВ.3	-2			Отсутствует аксонометрическая схема перекладываемых участков систем отопления и теплоснабжения		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Аксонометрические схемы. Добавить: - что принято за нулевую отметку? Указать в примечаниях; - дать указания по проходкам трубопроводов через ограждающие конструкции (если требуются); - показать уклоны трубопроводов; - указать номер систем (они должны соответствовать базовым системам); и т.д.		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
0.ОВ.3	-1, -2			Узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, узлы прохода воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции для всех механических разделов должны быть выполнены в едином стиле, согласно альбомов типовых решений производителя указанного в вендор-листе		Антон Серков
0.ОВ.3	-1, -2			Системы отопления и теплоснабжения увязать со смежными разделами		Антон Серков
