

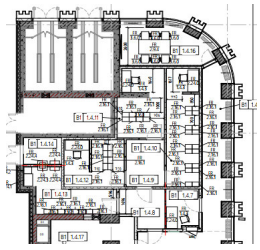









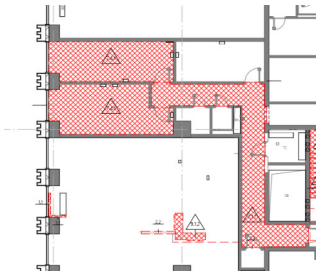

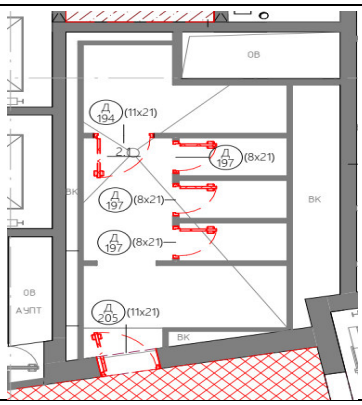

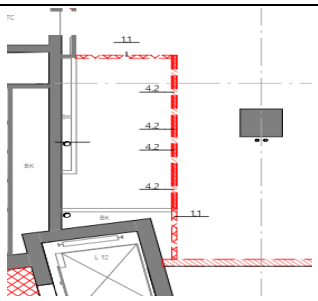


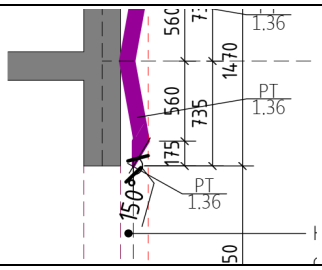





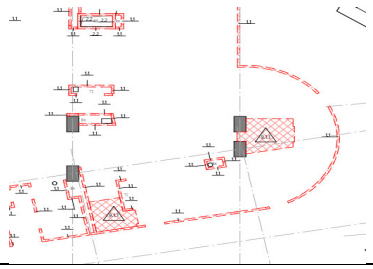

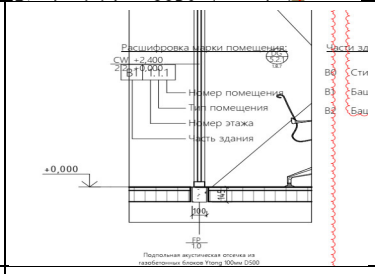









Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1	План демонтажа		Случайная дверь в техническое помещение под демонтаж? На плане заполнения дверных проемов потом только декоративная фальш-дверь указана		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План демонтажа		В зоне су не предусмотрен монтаж дверей базовым проектом		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План демонтажа		Какие блоки мы демонтируем за дверью? Проверить по РД здания Наверное предполагалось указание по расширению проема для установки нашей проектной двери?		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План расстановки мебели		Задвоение спецификации мебели/оборудования с разделом ТХ, проверить		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План полов		В чем принципиальная разница FC1.7.0. и FC1.7.2?	FC1.7.0 Цементно-песчаная стяжка по полистеролбетону, толщина 145 мм FC1.7.2 Цементно-песчаная стяжка по полистеролбетону, толщина 146 мм	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План перегородок	Примечания	Пояснить на что ссылка? Типовой комментарий для всех книг	10. Типы обшивок фасадных колонн см. -КМ	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План перегородок	Примечания	Дать отсылку на шифр тома. Проекта SAVO в документации нет	12. Способ крепления ТВ панелей по периметру фасада см. отдельный проект мультимедиа SAVO.Способ крепления ТВ панелей по периметру фасада см. отдельный проект мультимедиа SAVO	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План полов	Спецификация	Дать пояснения по составу пирога стяжки		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План полов	Примечания	Что такое "ИД", напишите, пожалуйста, "инженерных сетей" для избежания путаницы. Типовой комментарий для всех книг	2. Устройство полов производить после прокладки всех инженерных сетей (см. соответствующий раздел ИД).	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План полов	Примечания	Пояснить примечание	11. Если в чертеже имеются несоответствия с другой документацией, данные несоответствия должны быть доведены до сведения архитектора, который предоставит письменные указания о том, какой информации необходимо следовать, и до тех пор, пока не будут предоставлены указания, любые работы на основе данных несоответствий будут считаться несанкционированными	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План полов	Примечания	Как выполнять стык разных покрытий? Нет указаний и нет узлов, может добавить в примечание?		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План потолков		Отсутствуют высотные отметки по балке		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План потолков		Слетела марка, непонятно к чему относится. Также без высотной отметки		Анастасия Васильева	






Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1	План перегородок		Проверить перегородку должно быть быть бронированное стекло, по маркировке - блоки		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План перегородок		Аналогичная история и в передаточном шлюзе		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План перегородок		Непонятно из чего выполнять контур зоны ценностей, по марке - штукатурка, а что штукатурить не понятно		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План розеток		Убрать лишние обозначения с плана		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План отделки стен		Отсутствуют марки на плане, не читаем		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	Развертки		Какая глубина ниши?		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	Развертки		Дублируются в книге развертки по лобби		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	Развертки	Лист 01.13.11	Вид 4 - потерялась дверь на развертке		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1			Нет отсылки на потолочную декоративную инсталляцию лобби от Диджестив		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	План полов		На 2 этаже нет перехода, но помимо этого такое примечание недопустимо	10. Устройство конвекторов в переходе пом. В1 8.1.0 будет уточнено на стадии РД	Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов	Примечания	Нет указаний по цвету решеток конвекторов		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов	Примечания	Нет указаний по цвету решеток конвекторов		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	План потолков		Не корректно отражен потолок в переговорной с трансформируемой перегородкой: отсутствует лобик, парковка! Пом. 2.2.4, 2.2,5 Типовое замечание для этажей		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	План расстановки светильников		На этом этаже нет перехода, а на подложке есть - некорректное отображение		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	План розеток		Где учтены розетки для ТВ в зоне ресепшн		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	Развертки	02.13.03	Развертка некорректна относительно плана мебели		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	План перегородок	Примечания	Отсутствует информация про закладываемый клапан КИД		Анастасия Васильева	
1.АИ.1				Пом. 7.1.10 и пом. 7.1.11 поменять в спецификации, сейчас писсуары в женском санузле		Анастасия Васильева	










Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1		План полов		Необходимо четко специфицировать пирог/конструкцию пола. Толщина и фракция подсыпки из керамзита; толщина и марка ЦПС. Специфицировать фальшпол.		Анастасия Васильева	
2.АИ.2		План полов		Необходимо четко специфицировать пирог/конструкцию пола. Толщина и фракция подсыпки из керамзита; толщина и марка ЦПС. Специфицировать фальшпол.		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План полов		Отметка стяжки пола -0.010 явно не достаточно под облицовку керамогранитом с учетом выполнения гидроизоляции. Исправить отметку.		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План полов		Рассмотреть возможность укладки подрезанных плиток фальшпола в зоны с низкой проходимостью (переориентировать подрезки с проходов, к фасадам);		Иван Коваленков	
1.АИ.1		План полов		Отсутствует проектное решение по устройству переточных решеток в уровне фальшпола для аварийного слива после срабатывания системы АУВПТ;		Иван Коваленков	
1.АИ.1		План потолков	Примечания	Указать или дать отсылку на сводный план потолков цветовое исполнение видимых оконечных устройств		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План потолков		Отсутствует проектная информация по необходимому шагу потолочных акустических панелей		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План дверей		Дать указания по декорированию базовых дверей, которые остаются		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План декоративных элементов		Если озеленение указывается в отдельном томе, отсутствует отсылка на него и соответственно спецификация		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		Демонтаж		Зачем мы демонтируем зону в уже выполненной базовой отделке арендодателя? Тем более зачем мы демонтируем отделку в помещении с базовым инженерным оборудованием Арендодателя?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Демонтаж		Почему все базовые фасадные двери красные если мы их не демонтируем?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Демонтаж		В данном санузле перегородки крайне низкого качества. Необходимо всё удалить до состояние шел энд кор		Иван Коваленков	








Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1		Демонтаж		Какой потолок над лестничными маршами мы демонтируем?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Демонтаж		Эта стена не построена (не существует)		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Демонтаж		Эта стена не построена (не существует)		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.01.01		CW 3.1 - что такое стекло марки ЩИТ?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.01.01		Отделка не примыкает к лифтовому порталу.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.01.01		Зачем мы оштукатуриваем колонны? У нас нет места между колонной и фасадным импостом		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.01.01		Эта стена не построена (не существует)		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.03.01		Это что за узел? В узлах другое решение.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		01.13.01		Фасадные конструкции не соответствуют фактически выполненным работам		Иван Коваленков	







Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2		01.00.01		Почему все базовые фасадные двери красные если мы их не демонтируем?		Иван Коваленков	
2.АИ.2		01.00.01		Большая часть указанных перегородок отсутствует по факту.		Иван Коваленков	
2.АИ.2		01.01.01		Часть колон срезают облицовку.		Иван Коваленков	
2.АИ.2		01.01.01		Что за мертвая зона?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		08.04.01		Некорректный узел. Стеклянная перегородка устанавливается на фальшпол.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		08.04.01		Узел на завершен. Отсутствует спецификация всех элементов.		Иван Коваленков	
1.АИ.1	1	План розеток		Отсутствуют функциональные розетки в помещении 1.7.2		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1	План розеток		Зачем тут розетка?		Анастасия Васильева	




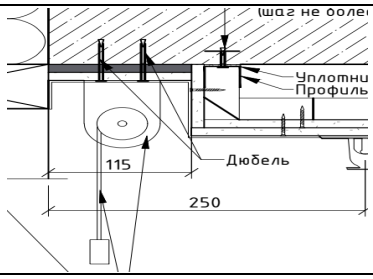

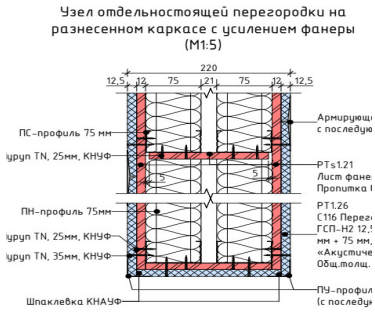

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL	План покрытий полов		Заменить покрытие на FF2.3		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		План покрытий полов		Уточнить соответствие размерности заливки покрытия размеру финишного покрытия (Пример типы FF2.3 и FF2.1), указать размерность для ПВХ покрытия вокруг ядра на изломах		Анастасия Васильева	
2.АИ.2		План покрытий полов		Уточнить соответствие размерности заливки покрытия размеру финишного покрытия (Пример типы FF2.3 и FF2.1), указать размерность для ПВХ покрытия вокруг ядра на изломах		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	2	Развертки	02.13.02	На развертке указаны несуществующие типы отделки потолков		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План розеток		Отсутствует маркировка лючков и части розеток		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL		08.13.01	Расхождение в развертках по трансформируемому пространству: лист ПМК Проект и Гиперион, непонятно чему верить		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		13-20 этаж		Скорректировать геометрию стены		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		Пояснительная записка				Анастасия Васильева	
1.АИ.1		Пояснительная записка				Анастасия Васильева	
1.АИ.1		Пояснительная записка		Дополнить раздел ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА фразой что цвет установки оконечных устройств на потолке согласовать с ГАП		Анастасия Васильева	
2.АИ.2		Пояснительная записка				Анастасия Васильева	
2.АИ.2		Пояснительная записка				Анастасия Васильева	
2.АИ.2		Пояснительная записка		Дополнить раздел ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА фразой что цвет установки оконечных устройств на потолке согласовать с ГАП		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	1	План демонтажа		Объем демонтажа потолка отражен некорректно		Анастасия Васильева	

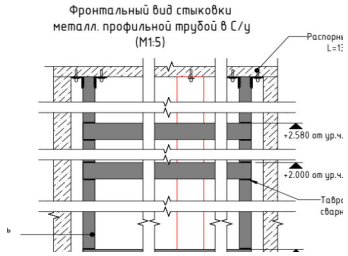
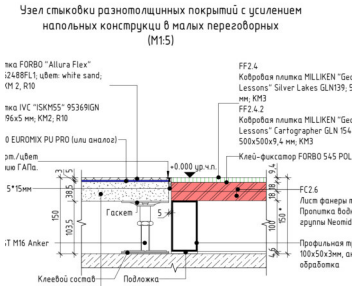
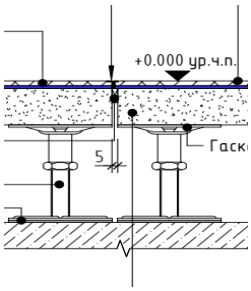
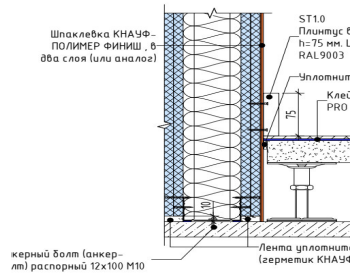
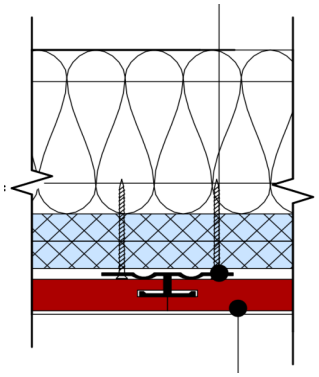
Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	1		1.4.9	Непонятно зачем выполнена зашивка, уточнить необходимость, скорректировать		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	1			Не выполнено напольное покрытие и конструкция пола, а должна быть!		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	3			Непонятно зачем выполнена зашивка, уточнить необходимость, скорректировать		Анастасия Васильева	
2.АИ.2		Пояснительная записка		Привести в соответствие с ПБ		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов		Некорректно указана отметка уровня стяжки, нет места для финишного покрытия		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План покрытий полов		Отсутствует марка финишного покрытия		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План покрытий полов		Некорректно указана отметка уровня покрытия в зоне зум-переговорных. Не соответствие с планом полов		Анастасия Васильева	


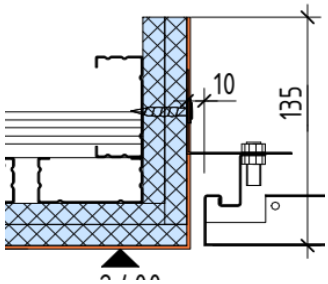
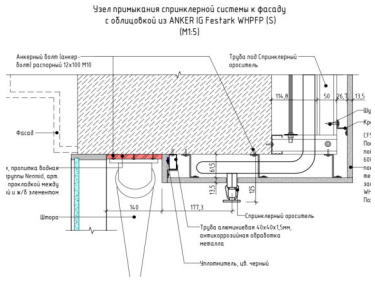
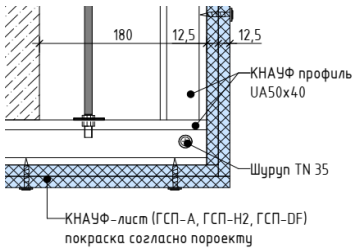
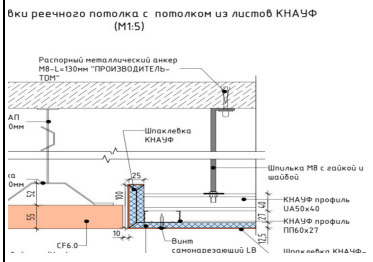
Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL	План полов		Убрать лишние марки с листа		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов		Отсутствует отображение части радиаторов		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	15	План полов		Некорректная отметка уровня пола, не учитывает финишное покрытие		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	15	План полов		Некорректная отметка уровня пола, не учитывает финишное покрытие		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов		Исключить стяжку/фальшпол за зашивкой ГКЛ по колоннам		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов		Исключить подрезку фальшпола под дверьми. Рассмотреть возможность укладки подрезанных плиток фальшпола в зоны с низкой проходимостью (переориентировать подрезки с проходов, к фасадам);		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов		Исключить подрезку фальшпола под дверьми. Рассмотреть возможность укладки подрезанных плиток фальшпола в зоны с низкой проходимостью (переориентировать подрезки с проходов, к фасадам);		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План полов		FC.2.6 - почему нельзя использовать в этой зоне фальшпол только на другой отметке? Обосновать решение		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов		FC.2.6 - почему нельзя использовать в этой зоне фальшпол только на другой отметке? Обосновать решение		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План потолков	Спецификация	Отсутствует детальная спецификация материала: производитель, артикул, RAL, иные характеристики		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План потолков	Спецификация	Отсутствует детальная спецификация материала: производитель, артикул, RAL, иные характеристики		Анастасия Васильева	

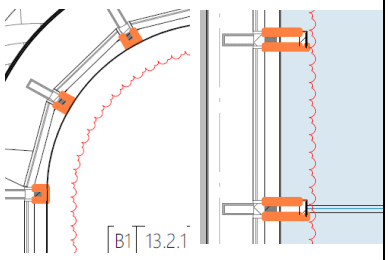





Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL	План потолков		Несоответствие указания по отделке фасадной балки и визуализаций, отсутствует отметка		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План потолков		Несоответствие указания по отделке фасадной балки и визуализаций, отсутствует отметка		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План расстановки светильников		На плане отсутствуют размеры и привязки светового оборудования		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План расстановки светильников		На плане отсутствуют размеры и привязки светового оборудования		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План розеток		Отсутствует маркировка лючков и части розеток		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План дверей		Дать указания по декорированию базовых дверей, которые остаются		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План покрытий полов		FF2.4, FF2.4.2 не соответствует СТУ здания так как КМ3, необходима замена материала		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План отделки стен		Отсутствуют указания по окраске лобиков на потолке над стеклянными перегородками или в зонах трансформации		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План отделки стен		Отсутствуют указания по окраске лобиков на потолке над стеклянными перегородками или в зонах трансформации		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL			Раскладка керамогранита в санузлах не учитывает наличие перегородок. Выполнить раскладку учитывает технологические процессы производства работ. Исправить раскладку в санузлах.		Иван Коваленков	
2.АИ.2	AL			Раскладка керамогранита в санузлах не учитывает наличие перегородок. Выполнить раскладку учитывает технологические процессы производства работ. Исправить раскладку в санузлах.		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Общие данные		Оформить альбом в соответствии с нормативными требованиями. Добавить лист общи данных с необходимой информацией (нормативные ссылки, монтажные требования, требования по приемке и т.д.)		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.1		Убрать производителя TDM. Анкеровка кладки к несущим конструкциям выполняется арматурой.		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.1		Некорректный узел. Необходимо скопировать узлы разработанные компанией Горпроект. Раздел КР 167-1-КР-03 Лист 4. Выбрать все необходимые узлы с данного листа.		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.1		Необходимо корректно отрисовать ПС-профиля. Сейчас их или нет, или отрисован ПН-профиль. Специфицировать дюбеля в соответствии с назначением (крепление к блоку \ крепление к монолиту).		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.2		Это просто "схема пандуса". Необходимо доработать все элементы. Какой клеевой состав, как стоят и крепятся металлические ребра жесткости и т.д. Сама металлическая рама пандуса должна быть выполнена в виде КМ - схема, сварные соединения, спецификация и вес металлических элементов и т.д.		Иван Коваленков	






Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
0.АИ.3		Лист 3.2		Саморез должен крепиться в соседнюю плиту фальшпола, а не в торец той же плиты. Исправить.		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.4		Определить тип подвесного КГЛ потолка по Кнауф. И добавить четкое отображение данного потолка по Кнауф. Стоечных профилей в потолках не бывает.		Иван Коваленков	
0.АИ.3		Лист 3.4		Окраску выполнить по слою шпатлевки. Штукатурку потолка выполняют в редких случаях. Заменить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.1		Верхний дюбель-гвоздь заменить на металлический дюбель. Заменить на всех узлах и листах.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.1		Кнауф ротбанд это штукатурка, а не шпатлевка. Указать корректный материал для заделке стыков листов ГКЛ. Заменить на всех листах.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.1		Заменить на Кнауф на всех узлах и листах	Базальтовый утеплитель ТехноНиколь Техновент Стандарт 1200х600х50 мм	Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.1		Заменить на Кнауф на всех узлах и листах	Винт самонарезающий ЗУБР 3,5х25мм	Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.1		Заменить на "КНАУФ-уголок крепежный для UA-профиля	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку	Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.3		Блок устанавливается на подушку из цпс. Исправить толщину монтажной пены. 7 мм - это очень мало.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.3		Странное решение по подклейке ковровой плитки. Предложить более эстетичное проектное решение.		Иван Коваленков	






Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1		Лист 1.3		Исправить блок Бонолит на Ютонг		Иван Коваленков	
2.АИ.2	AL	План полов		Заложить фальшпол под бонсай		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	12	План полов		Скорректировать раскладку в соответствии с переданной раскладкой от ПМК		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов		Отсутствуют марки и высотные отметки в оупенспейс, зимний сад-коворкинг		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов		Отсутствует указание по стяжке вокруг конвекторов и сами конвектора на плане		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL	План полов		Отсутствует высотная отметка и марка в местах поднятого пола		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	16	План полов		Отсутствует маркировка плинтуса на плане		Анастасия Васильева	
1.АИ.1		Лист 1.4		Определить тип подвесного КГЛ потолка по Кнауф. И добавить четкое отображение данного потолка по Кнауф. Кнауф ротбанд это штукатурка, а не шпатлевка. Указать корректный материал для заделке стыков листов ГКЛ. Заменить на всех листах.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.4		Зачем здесь распорный дюбель? Что за закладная под ГКЛ листом? Если это фанера, то достаточно крепления саморезом.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.4		Специфицировать верхний крепежный элемент (металлический дюбель)		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.5		Убрать лишнюю фанеру. Внутренний слой зашивки выполнить из ГКЛ листов.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.5		Некорректной и недоработанный узел. Исправить.		Иван Коваленков	






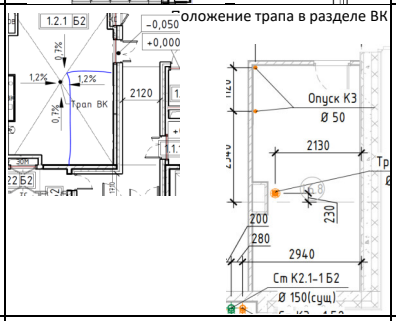

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1		Лист 1.5		Горизонтальные связи профильной трубы, полностью срежут полки стоечного оцинкованного профиля. Исправить. Предоставить альтернативное решение по установке стоечных оцинкованных профилей.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.6		Зачем разработан данный узел? Узел не корректный.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.6		Стык плит фальшпола не подразумевает установку уплотнительной ленты. Исправить. Также зачем использовать декоративный профиль если происходит стык финишного напольного материала одинаковой толщины?		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.6		Зачем указанный слои финишной отделки в подфальшпольном пространстве? Исправить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.7		Крепление должно выполнятся или в стоечный профиль или специализированным крепежом для ГКЛ листов. Исправить.		Иван Коваленков	




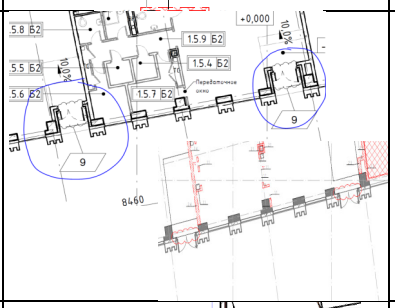


Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1		Лист 1.8		Стык профилей не соответствует техническим решениям Кнауф. Исправить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.8		Стык профилей не соответствует техническим решениям Кнауф. Исправить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.8		Данный узел не соответствует узлу представленному на листе 1.4. Привести в соответствие. Убрать сложные нагромождения конструкции. Выполнить в типовых элементах Кнауф.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.8		Данный узел не соответствует узлу представленному на листе 1.4. Привести в соответствие. Стык профилей не соответствует техническим решениям Кнауф. Исправить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1		Лист 1.8		Почему конструкция потолка держится на шпильке? Выполнить в соответствии с техническим решениям Кнауф. Исправить.		Иван Коваленков	
1.АИ.1	16	План полов		Отсутствует маркировка плинтуса на плане		Анастасия Васильева	
1.АИ.1				Нанесение отверстий КР (новых и базовых, с указанием требуют ли заделку) на планы		Иван Коваленков	
2.АИ.2				Нанесение отверстий КР (новых и базовых, с указанием требуют ли заделку) на планы		Иван Коваленков	

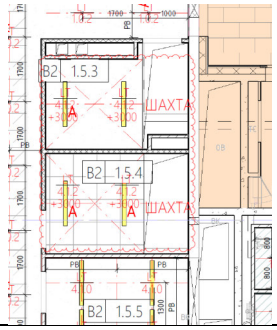
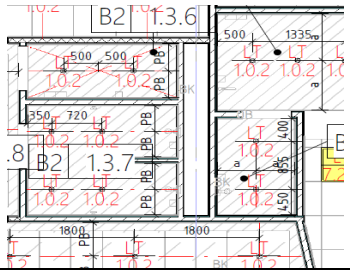



Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
0.АИ.3				Нанесение отверстий КР (новых и базовых, с указанием требуют ли заделку) на планы		Иван Коваленков	
1.АИ.1	1			Не соответствие визуализациям АР, изменить дверь.1 этаж В1		Ирина Кравченко	
1.АИ.1				Разработать решение по обшивке металлических колонн 13-20 этаж. Узел		Иван Коваленков	
2.АИ.2	2	План электро оборудования		Проработать управление ролл-шторами на 2 этаже В2. Скоординировать со смежными разделами (Автоматика).		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План дверей/ Ведомость дверей		Изменить высоту дверей на 1500 мм min на 2-20 этажах. Не удобно для эксплуатации, требования от смежного слаботочного раздела.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	2	План потолков		Учесть требования Акустического расчета в части добавления зашивок на потолке 2 этажа В2 (см. проект Акустического расчета конференц этажа)		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL	План дверей/ Ведомость дверей		Добавить оборудование СКУД из смежного раздела в наполнение дверей.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План дверей/ Ведомость дверей		Добавить оборудование СКУД из смежного раздела в наполнение дверей.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Разработать фермы под освещение и их крепления к потолку в видеостудии		Анастасия Васильева	
1.АИ.1				В базовом проекте Горпроекта замаркированная стена есть на планах стен, но на планах дверей и др планах она отсутствует, соответственно, необходимо перезонировать пространство. Можем организовать выход только прямо из ЛМ на 16-17 этажах В1		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Исключение рукохватов на 5-11 этажах В2, проверить, тк попадает в зону открывания ШПК, согласовать с АН		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1	План перегородок		Проверить фактическое выполнение данной стены, при отсутствии внести на план перегородок		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План перегородок		Исключить черновые работы Оштукатуривание под типом финишной отделки Лакобель. Необходимо применить 1 ГКЛ лист.		Иван Коваленков	
1.АИ.1	AL	План перегородок		Исключить черновые работы Оштукатуривание под типом финишной отделки Лакобель. Необходимо применить 1 ГКЛ лист.		Иван Коваленков	





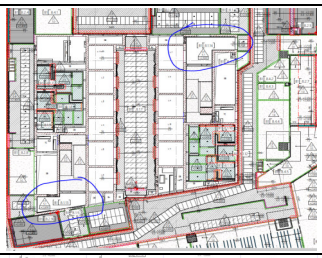


Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1	План дверей/ Ведомость дверей		Совместно с проектом фасадов сверить расположение и конфигурацию существующей двери из депозитария.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1	План перегородок		Наложение стен из стадии Shell&Core на новые перегородки. Перенести в демонтаж		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1	План перегородок		Свериться с проектом ВПВ, если это существующий шкаф в зоне Арендодателя, то там не должно быть наших перегородок.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1	План мебели и оборудования		Проверить возможность размещения МГН в данном су. Добавить радиус перемещения МГН		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1	План осветительного оборудования		Пропали светильники в зоне вестибюля, необходимо восстановить. В спецификации они отражены.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	2			Добавить разрез по данной зоне с указанием отметок потолков. Увязать приемную зону с воздуховодами и запотолочными коммуникациями		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	2	План финишного покрытия полов		Отсутствует отделка плиткой лестничных маршей в BOQ. Проверить, добавить по типологии 3 этажа.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План осветительного оборудования		Все светильники по ядру в съёмных панелях проверить на попадание в панель, должны вырезать в панельке отверстие		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План осветительного оборудования		Все светильники по ядру в съёмных панелях проверить на попадание в панель, должны вырезать в панельке отверстие		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План потолка		Подвесной потолок в переходе (B1 5-9) скорректировать отметку потолка с инженерными системами. Скорректировать описание высоты дверей в переход после понимания нижней отметки. Согласовать с АН и Заказчиком		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План потолка		Подвесной потолок в переходе (B2 3-4) скорректировать отметку потолка с инженерными системами. Скорректировать описание высоты дверей в переход после понимания нижней отметки. Согласовать с АН и Заказчиком		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	2	План осветительного оборудования		Заменить старое семейство светильников на корректное в зоне архивов 2 этажа B1		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План дверей/ Ведомость дверей		Доработать планы дверей в части фурнитуры, наполнения всех элементов в Ведомости		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План дверей/ Ведомость дверей		Доработать планы дверей в части фурнитуры, наполнения всех элементов в Ведомости		Ирина Кравченко	


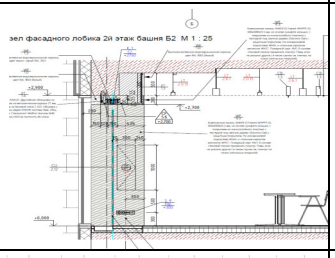




Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL	Планы отделки		Добавить информация о необходимости применения матирующей ленты безопасности на витражных перегородках		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	Планы отделки		Добавить информация о необходимости применения матирующей ленты безопасности на витражных перегородках		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	2	План финишного покрытия полов		Заменить тип штриховки для пвх по ядру на 500х500 как на других этажах в соответствии с спецификацией материала		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	Планы мебели и сантехнического оборудования		Сопоставить подобранные сантехнические приборы с комментариями от Тех.Заказчика и заказчика, при необходимости внести изменения (белая кнопка для писсуаров на сером керамограните)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	Планы мебели и сантехнического оборудования		Сопоставить подобранные сантехнические приборы с комментариями от Тех.Заказчика и заказчика, при необходимости внести изменения (белая кнопка для писсуаров на сером керамограните)		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План расстановки электрооборудования		Отсутствует вывод под вторую секцию локеров по всей башне В1 в локерной по южному фасаду ядра		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	Модель		Двери в переходе (В1 5-9)должны быть с фрамугой, согласно визуализации. Привести в соответствие с визуализацией		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	Модель		Двери в переходе (В2 3-4)должны быть с фрамугой, согласно визуализации. Привести в соответствие с визуализацией		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План отделки стен		Промаркировать все планы отделки, в том числе в переходе.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План электро оборудования		Скоординировать высоту расположения розеток под ТВ по фасаду с проектом САВО - выставить корректную.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План электро оборудования		Скоординировать высоту расположения розеток под ТВ по фасаду с проектом САВО - выставить корректную.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	Модель		Дотянуть отделку поверх конструкций стены по всей башне.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	Модель		Дотянуть отделку поверх конструкций стены по всей башне.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План отделки стен		Скорректировать высоту отделку панелями до отметки потолка, за подшивным потолком панелей не должно быть		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План отделки стен		Скорректировать высоту отделку панелями до отметки потолка, за подшивным потолком панелей не должно быть		Ирина Кравченко	









Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL			Доработать решение по трансформируемой перегородке в переговорной. Добавить закладную и стоечный профиль для трансформируемой перегородки. Увязать расположение ТВ с парковкой перегородок.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	10			Разработать лестницу		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План осветительного оборудования		Домаркировать все планы осветительного оборудования с указанием высот светильника от УЧП		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План осветительного оборудования		Домаркировать все планы осветительного оборудования с указанием высот светильника от УЧП		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План отделки стен		Домаркировать планы отделки, где слетела маркировка		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	12			Добавить развертку помещения зум-кабинок на 12 этаже		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	12	План осветительного оборудования		Сделать светильники отображаемыми на плане осветительного оборудования 12- го этажа в помещении Зум-кабинок		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL	План перегородок		Предоставить решение и узел по обшивке колон, приходящих в "стекло". Как будет организован стык примыкания около фасадного остекления (13-20 этажи)		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	13	План дверей/ Ведомость дверей		На 13 этаже расположена дверь выхода на парапет, необходимо скорректировать модель фасадов и добавить дверь затем при необходимости скорректировать АИ.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Добавить разуклонку в помещении мусорокамеры. Трап ВК согласовать с смежным разделом ВК		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Добавить на планы спецификацию вертикальных монтажных профилей по этажам с трансформируемыми зонами, плюс добавить их в моделях и посчитать корректное количество		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Добавить на планы спецификацию вертикальных монтажных профилей по этажам с трансформируемыми зонами, плюс добавить их в моделях и посчитать корректное количество		Ирина Кравченко	





Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1			Повысить пределы огнестойкости дверей до требуемых, согласно стадии П. Проверить решения.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Привести в соответствие спецификации на планах (подвинуть съехавшие элементы)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Проверить 1 этаж В2 на соответствие дверей и остекления EI		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1			1 этаж башни В2, план демонтажа,проверить необходимость в демонтаже шахты ОВ из пеноблоков, увязаться с смежными разделами		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Привести в соответствие контур фасада на плане демонтажа 1 этажа		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Убрать задвоение осей со всех планов		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Убрать задвоение осей со всех планов		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1			План конструкции полов 1 этажа, пропала штриховка конструкции пола		Ирина Кравченко	




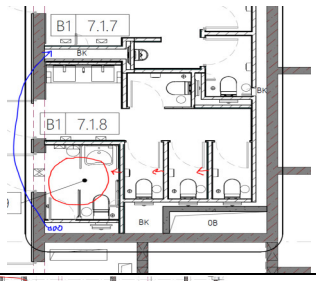



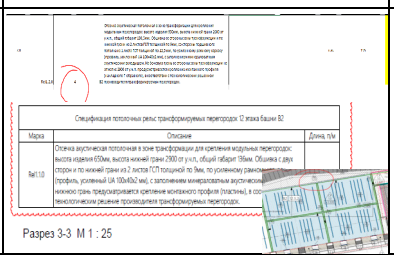
Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1			На плане освещения пропала модель КР, подгрузить		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1			Что за шахты в помещении 1.5.3 и 1.5.4 ? Если это просто перекидка воздуховодов - убрать надпись Шахта. Увязаться с смежными разделами		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Увязать в помещении 1.3.7 новые отверстия, сместить шахты.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Помещение 1.2.8 отсутствует штриховка конструкции пола		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Что за помещение в синем кружке? У него отсутствует дверь, которая была раньше		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Вернуть исчезнувшие перегородки/обшивки		Ирина Кравченко	









Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	1			Пропала видимость финишного покрытия пола в области. Настроить/замаркировать		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Если убралась шахта, то необходимо поправить финишное покрытие		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Пропала зашивка шахты ВК, вернуть к первозданному виду		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Пропала зашивка		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Пропала зашивка		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Заменить листы 01.16.03 и 01.16.01 на разработанную и согласованную с конструкторами лестницу, либо доработать Листы до актуального состояния.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Настроить видимость потолка Армстронг в Тамбурах. Проверить попадание в спецификацию		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Убрать оштукатуривание поверхности бетона под типом отделки декоративными панелями.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Не корректное отображение ступени выхода из Лифтовых кабин. Исправить, указать корректные отметки на развертках		Ирина Кравченко	








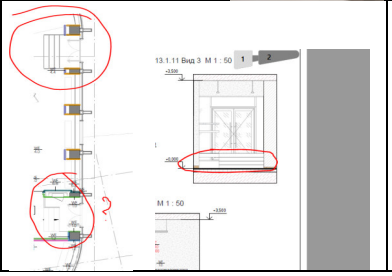
Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	1			Не корректное отображение ступени выхода из Лифтовых кабин. Исправить, указать корректные отметки на развертках		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	2			Скорректировать развертку. Привести в соответствие высоты светильников, видимость лестницы и тд		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Скорректировать все высоты светильников, которые находятся не на своей высоте. Корректная отметка определена должна быть после увязки инж. систем		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Скорректировать все высоты светильников, которые находятся не на своей высоте. Корректная отметка определена должна быть после увязки инж. систем		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	2			Скорректировать узел зашивки фасадной балки, тк данный узел не учитывает наличие сплинкера. Разработать корректный для рол-штор на управлении		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Перекомпоновать, вынести спецификацию ограждений в видимый диапазон		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Что обозначают условные зеленые линии на плане конструкций полов, добавить в примечания.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			3 этаж В2 план с усилениями стен - добавить условные обозначения, маркировку, высоты и прочее, увязаться с планом перегородок с усилениями под ТВ		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Переход - план финишного покрытия полов - по границе перегородок подрезать		Ирина Кравченко	





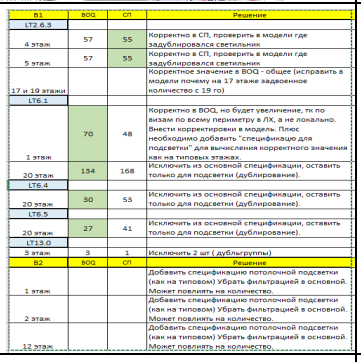

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL			Уточнить напольное покрытие в переходах на этажах 5-9 В1. Не сходится с визуализациями. Согласовать с АН		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			Не учтены двери в Фор камеры на 4 этаже		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			Пропал из видимости потолок частично по этажу.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			На план потолка добавить узел, ранее разработатанный. Доработать до актуального состояния		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			Проверить и убрать, при необходимости, отметки с плана потолков, написанные текстом.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			Доработать развертки по 4 этажу, не корректное отображение обшивки фасадной балки		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Заменить участок обшивки (PT1.3) на тип отдельностоящая стена С626 (PT1.20). 5-11 этажи		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Образмерить все планы конструктивных полов (дать привязки акустическим отсечкам под фальшполом. Указать недостающие точки раскладки		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Доработать спецификации конструкций полов - добавить пироги пола в соответствии с типами конструкции и финишным покрытием		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Доработать спецификации конструкций полов - добавить пироги пола в соответствии с типами конструкции и финишным покрытием		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Доработать узел обшивки фасадной балки или исключить его и дать ссылку на типовые Узлы		Ирина Кравченко	




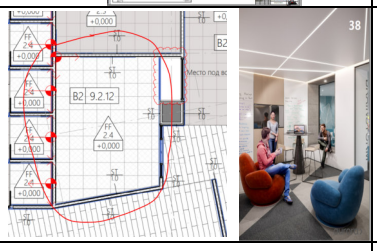

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	AL			Добавить технологический зазор (10мм) по линии съемных панелей на потолках. Пример на 12 этаже B2		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Добавить технологический зазор (10мм) по линии съемных панелей на потолках. Пример на 12 этаже B3		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			На планах финишных полов указать типы и дать узлы состыковки различных финишных покрытий (указать тип уголка, материал креплений и тд). Заспецифицировать и добавить объем		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			На планах финишных полов указать типы и дать узлы состыковки различных финишных покрытий (указать тип уголка, материал креплений и тд). Заспецифицировать и добавить объем		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Дать типовые привязки по расположению конвекторов между колоннами		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Дать типовые привязки по расположению конвекторов между колоннами		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Исправить съехавшие маркировки потолков		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Отразить конвекторы и решетки в переходе		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Отразить конвекторы и решетки в переходе		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Планы декоротивных элементов: На листе есть примечание про декорирование граффити, однако какие-либо указания отсутствуют		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Планы декоротивных элементов: На листе есть примечание про декорирование граффити, однако какие-либо указания отсутствуют		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL	План отделки стен		Ошибка. Исправить линию отделки в соответствии с линией стены		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разработать недостающие и доработать существующие узлы подфальшпольных отсечек (противопожарные/акустические) в зонах перегородок/дверей и т.д.	По двум башням. Дать ссылку на типовое решение в книге Узлов	Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Убрать примечание с планов демонтажа о сохранении потолка Армстронг в тамбурах - под демонтаж	По двум башням.	Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Указать толщину, демонтируемой стяжки на планах демонтажа	По двум башням.	Ирина Кравченко	
2.АИ.2	4			Стяжка пола FC1.17.1 и FC1.17.2. Некорректное проектное решение. Предоставить расчеты на продавливаемость стяжки пола.		Иван Коваленков	
2.АИ.2	4			Скорректировать финишное покрытие в соответствии с уклоном и подрезками		Ирина Кравченко	




Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
1.АИ.1	AL			Убрать некорректные текстовые примечания на планах отделки об окраске лобиков		Ирина Кравченко	
1.АИ.2	AL			Убрать некорректные текстовые примечания на планах отделки об окраске лобиков		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	8			Настроить корректное отображение потолка по ядру - тип CF2.3, сейчас отображается белым, хотя он темно серый.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Разместить усиления фанерой на требуемых высотах, ориентируясь на крепления ТВ и панелей		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Проверить комфортное размещение инвалида в су на 2-20 этажах Б1, возможно перекомпоновать расположение сантехоборудования. Рассмотреть возможность переноса гребенки водоснабжения в противоположную нишу, есть возможность обеспечить доступ из мужского су. При монтаже по проектному решению обнаружилось недостаточное расстояние в кабинках женских су, необходимо сдвинуть хотя бы на 100мм и выровнять расстояние в каждой кабинке.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Проверить на соответствие нормам СанПин отделку в су по В2 и В1, при необходимости скорректировать по согласованию с Заказчиком и АН. Проверить открывания дверей в соответствии с нормами СП (ширина, открывание).		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			В башне В1 проверить неизвестный элемент в зум-переговорных, удалить из группы.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Некорректно экспортированные двг-файлы, проверить		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разобраться почему в спецификацию по акустическим отсечкам для крепления трансформируемых перегородок летит не весь объем. В BOQ летит корректный		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	12			Разобраться почему в BOQ уровень потолочных отсечек присвоен предыдущей, нежели этаж и значения на чертеже. На 12 в спеку не летит rel 1.2.0, хотя на чертеже есть и в BOQ тоже есть (но присвоено 11 этажу). Доработать Rel 1.2.0 (создать новый подтип) в соответствии в соответствии с отметкой потолка по ядру +2800		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	13			Добавить недостающее усиление под крепления ТВ (увязать с РД от САВО по расположению ТВ). Проверить весь 13 этаж		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разобраться с количеством сушилок на 5-11 этажах в В2 (по подсчету 9 шт, в спеку летит 11)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			В узлах и описании перегородок из кирпича или пеноблока добавить упоминание об анкеровке кладки (сетка, арматура и тд)		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			В узлах и описании перегородок из кирпича или пеноблока добавить упоминание об анкеровке кладки (сетка, арматура и тд)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Добавить разрезы по этажам.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Добавить разрезы по этажам.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Разработать решение и предоставить узел по наружному углу из керлита		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разработать решение и предоставить узел по наружному углу из керлита		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	8			Добавить типовое сечение по потолку в зоне яда с ссылками на соответствующие узлы		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	8			Докорректировать развертки, подрезать отделку в соответствии, уточнить отделку по покраске выше панелей, сейчас различная		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Отсутствуют сводные планы потолков по этажам		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL			Отсутствуют сводные планы потолков по этажам		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Замаркировать лобики, если отсутствуют - добавить		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Настроить отображение потолка перед МГН, сейчас отсутствует на планах		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Остистую укрупненные планы по освещению в су на типовых этажах, добавить		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Не соответствие отделки и способа декорации существующих дверей по ядру, исправить. По обеим башням		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Не соответствие АИ и исходных данных. На 11 этаже нет выходов в переход. Скорректировать все планы		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	AL			Не соответствие АИ и исходных данных. На 10 этаже нет выходов в переход, только сущ дверь в венткамеру. Скорректировать все планы		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Отсутствуют укрупненные фрагменты планов оконечных устройств в су, добавить		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разработать и согласовать исполнение капсул сна в В2		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	11			Зачем клеить лакобель на стекло? Исправить, скорректировать все планы. Рассмотреть возможность переноса вендинговых аппаратов		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	11			Данным решением мы глухо зашиваем фасадное остекление, рассмотреть возможность переноса шкафа ПК.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Данная дверь исключена из базового проекта, проем заложен, скорректировать планы В1.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	13			Шторы над второй дверью на эксплуатируемую кровлю?		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	13			Расхождение решения с визуализацией, уточнить, при необходимости согласовать замену с АН и Заказчиком		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	13			Дать отсылку к разделу КР-3 где разрабатываются лестницы выхода на кровлю. В демонтаж внести существующую по центру фасада.		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	13			Не соответствие отметки низа фасадной двери и площадки лестницы, исправить		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Убрать черный плинтус по керамограниту в местах, где расположены писсуары в обеих башнях.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Убрать черный плинтус по керамограниту в местах, где расположены писсуары в обеих башнях.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Заспецифицировать лестницы для капсул сна		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	12			Убрать лобики SB4.0 на 12 этаже, переход будет выполнен по узлу из книги Узлов.		Ирина Кравченко	
	AL			Произвести корректировку светильников согласно таблице.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	19			В Лифтовом холле 19го этаж в В1 отразить расположение панелей управления лифтами (пример на 12 этаже В2)		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	1			Расположение ленты подсветки в ЛХ не соответствует визуализации. Исправить, добавить. Подсветка ломаной линией по всей линии.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Расположение ленты подсветки в ЛХ не соответствует визуализации. Исправить, добавить. Подсветка ломаной линией по всей линии.		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	AL			Расположение ленты подсветки на типовых этажах в ЛХ отличается от визуализации (локально) привести в соответствие. Подсветка только над Лифтовыми порталами.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разработать разрез по лестницам В2, вывести объем керамической плитки на листы		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Проверить учтены ли выводы под рукосушители в Обеденном зале, добавить если нет.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Проверить решение по отделке плиткой колонн в технологическом коридоре с заданием ТХ		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Отсутствуют ВК трапы и разуклонка плитки к ним		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Для чего в помещениях кроссовых и электрощитовых используем моющую краску с антисептическим эффектом?		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Две развертки перехода 3 этажа, исключить неинформативную.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Не соответствие напольной отделки с визуализациям. Разработать укрупненный фрагмент с указанием размеров нарезки покрытий. Согласовать с АН и Заказчиком		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	8			Некоторые элементы мебели в модели не соответствуют своему описанию - домоделить. Например шкаф в кабинетах на типовом этаже		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Данные стены выполнены из пеноблока, а не из Аквапанели (2-13 этажи) В2		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
	AL			Доработать развертки и чертежи спецзаказной мебели, предоставить на согласование		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Отсутствует стена в су 1.1.13 и нет вывода под Dyson		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Сопоставить описание дверей для помещений переговорных СЗИ (7 и 14 жтажи) в В1 и В2. В В2 (12 этаж) корректное описание и наполнение. Привести к единому виду		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Расставить и замаркировать лючки доступа		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Расставить и замаркировать лючки доступа		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL			Разработать варианты обшивки фасадной балки с разными типами отделки. Предоставить узлы		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Разработать варианты обшивки фасадной балки с разными типами отделки. Предоставить узлы		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Добавить на планы электровыводы под трансформируемые перегородки (при необходимости, в соотвесвии с регламентом от поставщика)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Добавить на планы электровыводы под трансформируемые перегородки (при необходимости, в соотвесвии с регламентом от поставщика)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Добавить электрические люки в комнату медитаций на 12 этаже В2 (как на 8 этаже)		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	3			Привести в соотвесвие раздел ТХ 3 этажа Столовая с планами АИ 3 этажа, имеются разночтения, например помещение 3.4.17.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Разработать устройство подвесного потолка с обшивками из плит КНАУФ-Файерборд и КНАУФ-листов Сапфир с огнестойкостью REI150 (Подвесной потолок П 232) в помещении электрощитовой на 1м этаже В1 (пом. 1.5.2) на металлическом каркасе с опуском от перекрытия на высоту под транзитный воздуховод.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Рассмотреть замену раковины в туалетах для МГН в Б1 с учетом нормативных габаритов 1400мм в диаметре разворота. Согласовать с Заказчиком и смежными разделами.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Разработать решения по подиуму в ситуационном центре на 1 этаже (профильная труба, обшитая фанерой - согласовать с конструктором, предоставить узел).		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Разработать сводные планы потолков по всем этажам.		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Разработать сводные планы потолков по всем этажам.		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	1			Доработать решение по устройству передаточных шлюзов и бронестекла		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Доработать решение по расположению, маскировке шкафов ПК, снаружи ЛХ на типовых этажах 5-11 в В2. Увязать с проектом ВПВ, и размещением слаботочных элементов доступа для разблокирования дверей.		Ирина Кравченко	

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал	Комментарий в смежный том/ раздел
2.АИ.2	12			12 этаж В2 светильники в зоне отдыха с камином заменить на типовое решение с 8 этажа)		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Добавить зашивки систем ВК на потолке, согласно заданию от инженеров.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Добавить зашивки систем ВК на потолке, согласно заданию от инженеров.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	1			Проработать решение по размещению шкафа ПК на 1 этаже в зоне лифтового холла. На данный момент положение существующей двери отличается от проектного. Увязаться в разделом ВПВ		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Произвести доработку в части детализации разверток, внесения ссылок на корреткные узлы и пр.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Произвести доработку в части детализации разверток, внесения ссылок на корреткные узлы и пр.		Ирина Кравченко	
1.АИ.1	AL			Рассмотреть возможность крепления на кронштейн ТВ по периметру фасада либо разработать узел крепления ТВ к фасадным колоннам.		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Рассмотреть возможность крепления на кронштейн ТВ по периметру фасада либо разработать узел крепления ТВ к фасадным колоннам.		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL			Предусмотреть увеличение количества локеров на 30%		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	AL			Предусмотреть увеличение количества локеров на 30%		Анастасия Васильева	
2.АИ.2	1			Скоординировать АИ с разделом ЭОМ - 2.В зоне рецепции (сейчас это Холл) на этажах, установить энергораспределитель (точка консолидации), лючок на 3 РМ (3 розетки 220В грязного питания + 3 вывода для 3 офиблоков гарантированного электропитания + СКС уточнить!), вместо лючка на 2 розетки. 3.На рецепции 1 этажа заложить энергораспределитель (гарантированное электропитание) под столешницей и 5 офиблоков (как на РМ)		Анастасия Васильева	
1.АИ.1	AL			Произвести увязку планов оконечных устройств АИ со смежными разделами.		Ирина Кравченко	
2.АИ.2	AL			Произвести увязку планов оконечных устройств АИ со смежными разделами.		Ирина Кравченко	
