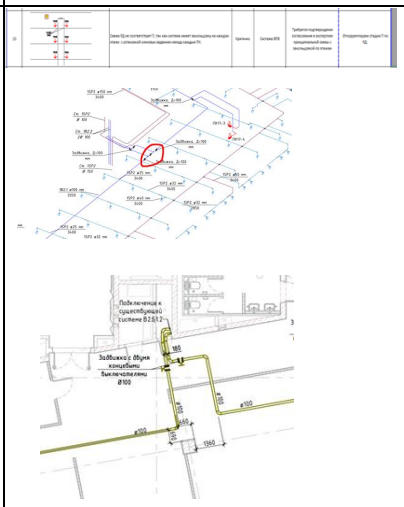
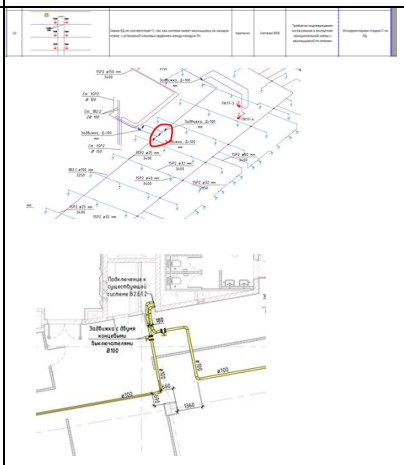




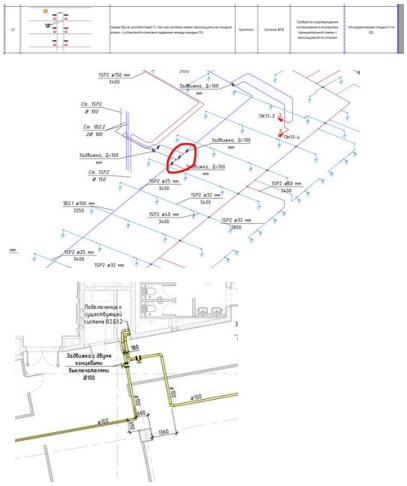
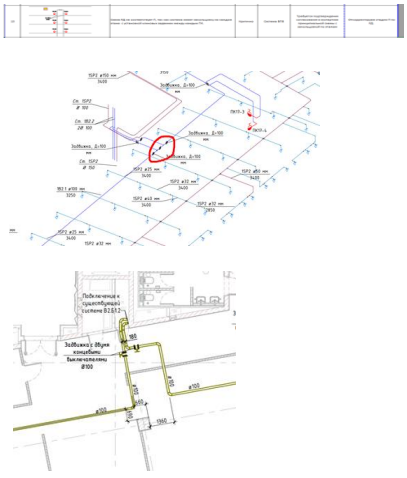







Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВПВ.1	1			Принципиальные схемы ПТ и гидравлический расчет. Дать ссылку на том, где они будут приложены.		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Принципиальные схемы ПТ и гидравлический расчет. Дать ссылку на том, где они будут приложены.		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			На вводе трубопроводов на этаж используем 5 задвижек, согласно решению базового проекта		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			На вводе трубопроводов на этаж используем 5 задвижек, согласно решению базового проекта		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Увязать перенос ШПК на первом этаже и проход труб на -1-вый этаж с разработчиком раздела ПТ по -1-ому этажу		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Отсутствует подбор диаметра диафрагм		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			При наполнении ОД, Узлы прохода, Примечания на планах использовать том 20086_TKF.1.ВПВ.1.7 Предлагаю созвониться, обсудить		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Оформить планы: проставить выноски на арматуре, ШПК; указать номер системы и подключения к стояку; показать на планах узлы		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Согласовать с АИ цвет ШПК и сторону открывания дверей		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Для возможных позиций в спецификации заполнить код продукции (артикул)		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. В противном случае "Труба" необходимо заменить на "Трубопровод"		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВПВ.1	2			Увязать перенос ШПК на первом этаже и проход труб на -1-вый этаж с разработчиком раздела ПТ по -1-ому этажу		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Отсутствует подбор диаметра диафрагм		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			При наполнении ОД, Узлы прохода, Примечания на планах использовать том 20086_TKF.1.ВПВ.1.7 Предлагаю созвониться, обсудить		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Оформить планы: проставить выноски на арматуре, ШПК; указать номер системы и подключения к стояку; показать на планах узлы		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Согласовать с АИ цвет ШПК и сторону открывания дверей		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Для возможных позиций в спецификации заполнить код продукции (артикул)		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. В противном случае "Труба" необходимо заменить на "Трубопровод"		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Расписать что входит в комплект существующего шкафа. В противном случае нельзя будет проверить его комплектность		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Расписать что входит в комплект существующего шкафа. В противном случае нельзя будет проверить его комплектность		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Выполнить подложку в серых полутонах		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Исключить попадание фасонных изделий, мест соединения трубопроводов в толщу ограждающих конструкций. Нормативно такое решение не допускается и физически не смонтировать		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Спецификация. Указать производителя крепления		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Revit модель. Не на всех элементах заполнены параметры: WBS, здание, этаж		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Добавить опросники на основное оборудование ШПК, задвижки)		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Добавить подписи в штампы и на титульные листы		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Отсутствует демонтажная спецификация. Где она учтена?		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Выполнить подложку в серых полутонах		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Исключить попадание фасонных изделий, мест соединения трубопроводов в толщу ограждающих конструкций. Нормативно такое решение не допускается и физически не смонтировать		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Спецификация. Указать производителя крепления		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВПВ.1	2			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Revit модель. Не на всех элементах заполнены параметры: WBS, здание, этаж		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Добавить опросники на основное оборудование ШПК, задвижки)		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Добавить подписи в штампы и на титульные листы		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Отсутствует демонтажная спецификация. Где она учтена?		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Данный шкаф используется (справа от главного входа)? Почему нет выносок и привязок?		Антон Серков
1.ВПВ.1	2			Данный шкаф используется (справа от главного входа)? Почему нет выносок и привязок?		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Принципиальные схемы ПТ и гидравлический расчет. Дать ссылку на том, где они будут приложены.		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Принципиальные схемы ПТ и гидравлический расчет. Дать ссылку на том, где они будут приложены.		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			На вводе трубопроводов на этаж используем 5 задвижек, согласно решению базового проекта		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			На вводе трубопроводов на этаж используем 5 задвижек, согласно решению базового проекта		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ВПВ.2	1			Увязать перенос ШПК на первом этаже и проход труб на -1-вый этаж с разработчиком раздела ПТ по -1-ому этажу		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Отсутствует подбор диаметра диафрагм		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			При наполнении ОД, Узлы прохода, Примечания на планах использовать том 20086_TKF.1.ВПВ.1.7 Предлагаю созвониться, обсудить		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Оформить планы: проставить выноски на арматуре, ШПК; указать номер системы и подключения к стояку; показать на планах узлы		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Согласовать с АИ цвет ШПК и сторону открывания дверей		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Для возможных позиций в спецификации заполнить код продукции (артикул)		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. В противном случае "Труба" необходимо заменить на "Трубопровод"		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Увязать перенос ШПК на первом этаже и проход труб на -1-вый этаж с разработчиком раздела ПТ по -1-ому этажу		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Отсутствует подбор диаметра диафрагм		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			При наполнении ОД, Узлы прохода, Примечания на планах использовать том 20086_TKF.1.ВПВ.1.7 Предлагаю созвониться, обсудить		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Оформить планы: проставить выноски на арматуре, ШПК; указать номер системы и подключения к стояку; показать на планах узлы		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Согласовать с АИ цвет ШПК и сторону открывания дверей		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Для возможных позиций в спецификации заполнить код продукции (артикул)		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. В противном случае "Труба" необходимо заменить на "Трубопровод"		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Расписать что входит в комплект существующего шкафа. В противном случае нельзя будет проверить его комплектность		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Расписать что входит в комплект существующего шкафа. В противном случае нельзя будет проверить его комплектность		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Выполнить подложку в серых полутонах		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ВПВ.2	2			Исключить попадание фасонных изделий, мест соединения трубопроводов в толщу ограждающих конструкций. Нормативно такое решение не допускается и физически не смонтировать		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Спецификация. Указать производителя крепления		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Дополнить документацию BOQ		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Revit модель. Не на всех элементах заполнены параметры: WBS, здание, этаж		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Добавить опросники на основное оборудование ШПК, задвижки)		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Добавить подписи в штампы и на титульные листы		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Отсутствует демонтажная спецификация. Где она учтена?		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			На плане отсутствует существующий шкаф		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			На плане отсутствует существующий шкаф		Антон Серков
2.ВПВ.2	1			Укоротить оси, сейчас они налезают на таблицы и узлы		Антон Серков
2.ВПВ.2	2			Укоротить оси, сейчас они налезают на таблицы и узлы		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Принципиальные схемы ПТ и гидравлический расчет. Дать ссылку на том, где они будут приложены. (книга 20086_TKF.1.ВПВ.1.ПС)		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Отсутствует подбор диафрагм для каждого ПК на каждом этаже		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Общие данные по наполнению: схемы работы ВПВ; указаний по монтажу выполнить по аналогии с комплектом 20086_TKF.1.ВПВ.1.7 (UD)		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Оформить планы: проставить выноски на арматуре, ШПК; указать номер системы и подключения к стояку; показать на планах узлы		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Исключить из примечания		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Согласовать с АИ цвет ШПК.		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
1.ВПВ.1	1-20			Открытие дверок противопожарных шкафов увязать с открытием декоративных дверок в разделе АИ		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Исключить попадание фасонных изделий, мест соединения трубопроводов, габарита шкафа в толщу ограждающих конструкций. Нормативно такое решение не допускается и физически не смонтировать		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Обеспечить доступ к запорно-регулирующей арматуре и оборудованию		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Спецификация. Указать производителя крепления		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Отсутствует демонтажная спецификация		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Спецификация не соответствует BOQ		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			В спецификации отсутствует эмаль, грунтовка для трубопроводов		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Добавить опросники на основное оборудование ШПК, задвижки)		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Добавить подписи в штампы и на титульные листы		Антон Серков
1.ВПВ.1	13-20			Revit модель. Не на всех элементах заполнены параметры: WBS, здание, этаж		Антон Серков
1.ВПВ.1	1-20			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
1.ВПВ.1	1			Спецификация не корректна, количество материалов и оборудования не соответствует планам. Исправить		Антон Серков
1.ВПВ.1	ПС			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков
1.ВПВ.1	ПС			В документации отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Отсутствует подбор диафрагм для каждого ПК на каждом этаже		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Согласовать с АИ цвет ШПК.		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Открытие дверок противопожарных шкафов увязать с открытием декоративных дверок в разделе АИ		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Исключить попадание фасонных изделий, мест соединения трубопроводов, габарита шкафа в толщу ограждающих конструкций. Нормативно такое решение не допускается и физически не смонтировать		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Обеспечить доступ к запорно-регулирующей арматуре и оборудованию		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			В спецификацию добавить комплект расходных материалов		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Revit модель. Не на всех элементах заполнены параметры: WBS, здание, этаж		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-13			Системы ВПВ увязать со смежными коммуникациями.		Антон Серков

Том	Этаж	Документация/Файл	Лист/часть документа	Комментарии	Часть плана	Комментарий выдал
2.ВПВ.2	1			Спецификация не корректна, количество материалов и оборудования не соответствует планам. Исправить		Антон Серков
2.ВПВ.2	1-2			Спецификация не соответствует BOQ		Антон Серков
2.ВПВ.2	ПС			В документации отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков
1.ВПВ.1	ПС			В документации отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Дать ссылку в общих данных на книгу, где будет представлена общая структурная схема ВПВ и гидравлический расчет (20086_TKF.1.ВПВ.1.ПС и (20086_TKF.2.ВПВ.2.ПС)		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			В ОД: исключить упоминание СП 485, СП 486. Проектирование ведется по СП 5 и СП 10.		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			В ОД добавить нормативную документацию, по которой разрабатывалась РД Арендодателя. Дополнить монтажные указания отсутствующими пунктами из книги 20086_TKF.1.ВПВ.1.7		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Архитектурную подложку выполнить в более бледном цвете, затрудняется читабельность чертежа. Выноски сливаются.		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			На планах: не даны привязки к перекладываемым участкам трубопроводов;		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Для наглядности на монтажных планах желательно показать разводку базовых систем отопления в серых тонах		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Фитинги (отводы, переходы, тройники и т.д.) включить в длину трубопровода. Отдельно каждый элемент (фитинг) не расписывать. Понятие "Трубопровод" включает в себя как прямой участок трубы, так и фитинги. Если в спецификации указана "Труба", то должна быть и отдельная позиция фитингов. Заменить на понятие "Труба" на "Трубопровод"		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			В ответах на данный вопрос указать значение принятого коэффициента запаса, для трубопроводов заложенных в спецификации		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Отсутствуют аксонометрические схемы систем оформленные по ГОСТ Р 21.101-2020		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Добавить расстояние между координационными осями		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы крепления трубопроводов к ограждающим конструкциям		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			В документации Отсутствуют узлы прохода трубопроводов через ограждающие конструкции		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Узлы крепления воздуховодов и трубопроводов, узлы прохода воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции для всех механических разделов должны быть выполнены в едином стиле, согласно альбомов типовых решений производителя указанного в вендор-листе		Антон Серков
0.ВПВ.3	-1, -2			Системы ВПВ увязать со смежными разделами		Антон Серков
