МФС | Генеральный подрядчик

КР

Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Для объектов Реновации

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Разработчик: Отдел стандартизации

Версия 4
06/2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной
ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ УЗЛОВ

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

РАЗДЕЛ Р1. МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ И ЧЕРДАКА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ РЕНОВАЦИИ

Версия 4

Генеральный директор — Карапетян Е.О.

Главный инженер проекта — Биктимиров А.Ф.

Руководитель Отдела стандартизации — Бочкин Н.Д.

Москва, 2024 г.

Содержание

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание	
2	Общие указания (начало)	
3	Общие указания (продолжение 1)	
4	Общие указания (продолжение 2)	
5	Общие указания (продолжение 3)	
6	Общие указания (продолжение 4)	
7	Общие указания (продолжение 5)	
8	Общие указания (продолжение 6)	
9	Общие указания (продолжение 7)	
10	Общие указания (окончание)	
11	Ведомость элементов монтажных связей (начало)	
12	Ведомость элементов монтажных связей (окончание)	
13	Деталь 1 (заделка горизонтального стыка). Деталь 2 (заделка горизонтального стыка под монолитной плитой)	
14	Деталь 3 (горизонтальный стык в зоне установки петли)	
15	Деталь 4 (установка навесной панели переходного балкона) (начало)	
16	Деталь 4 (установка навесной панели переходного балкона) (окончание)	
17	Узел 1/Р1	
18	Сечение 1-1 к узлам 1/Р1, 2/Р1, 3/Р1, 5/Р1, 6/Р1, 7/Р1, 9/Р1, 11/Р1, 27/Р	
19	Узел 2/Р1	
20	Узел 3/Р1 (вариант 1)	
21	Узел 3/Р1 (вариант 2)	
22	Узел 4/Р1	
23	Сечение 3-3 к узлам 4/Р1, 26/Р1	
24	Узел 5/Р1	
25	Узел 6/Р1	
26	Сечение 3-3 к узлу 6/Р1	
27	Сечение 4-4 к узлу 6/Р1	
28	Узел 7/Р1	
29	Узел 8/Р1	
30	Узел 9/Р1	
31	Сечение 3-3 к узлу 9/Р1	
32	Узел 10/Р1	
33	Сечение 4-4 к узлам 7/Р1, 10/Р1	
34	Узел 11/Р1	
35	Узел 13/Р1	
36	Сечение 1-1 к узлу 13/Р1	
37	Узел 14/Р1	
38	Сечение 2-2 к узлу 14/Р1	
39	Узел 15/Р1	
40	Сечение 1-1 к узлу 15/Р1	
41	Узел 16/Р1	
42	Сечение 2-2 к узлам 16/Р1, 18/Р1	
43	Узел 17/Р1	
44	Сечение 1-1 к узлу 17/Р1	
45	Узел 18/Р1	
46	Узел 19/Р1	
47	Сечения 1-1, 2-2 к узлу 19/Р1	
48	Узел 20/Р1	
49	Сечения 1-1, 3-3 к узлу 20/Р1	
50	Узлы 21/Р1, ..., 24/Р1	
51	Узел 25/Р1	
52	Узел 26/Р1	
53	Узел 26/Р1 в уровне плиты перекрытия	
54	Узел 27/Р1	
55	Сечения 3-3, 4-4 к узлу 27/Р1	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	1	55

Содержание

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Альбом ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ содержит рабочие чертежи узлов, деталей сопряжения и заделки стыков сборных конструкций с монолитными несущими конструкциями типовых этажей и чердака для жилых домов из изделий производства ООО "Префаб Технологии".
   Настоящий Альбом разработан для применения при реализации программы Реновации жилой застройки в городе Москва.
2. Каждый узел имеет самостоятельный порядковый номер. Ссылки на узлы и сечения даны на схемах расположения наружных стеновых панелей этажей.
3. На каждый узел дана спецификация монтажных связей и расход цементно-песчаного раствора, а также других материалов на заделку швов.
4. Величины допускаемых отклонений строительных параметров принимаются по расчету точности в соответствии с ГОСТ Р 58942-2020 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски".
5. Монтаж сборных конструкций выполняется на цементно-песчаном растворе марки М200. Раскладка раствора производится непосредственно перед установкой панелей в проектное положение. Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается. Прочность раствора следует контролировать испытанием серии образцов в соответствии с ГОСТ 5802-86.
6. Установка сборных конструкций производится поэтажно.
   Проектная ширина опорной части внутреннего слоя наружных стеновых панелей и однослойных панелей парапетов переходных балконов 80 мм. Проектная ширина опорной части однослойных панелей лоджий 60 мм. Проектная глубина опирания лестничных маршей 80 мм. В таблице на листе 5 приведены значения Допускаемых отклонений при приемке установленных сборных конструкций, превышение которых категорически запрещено.
7. Монтаж здания должен осуществляться с применением инструментального геодезического контроля, предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 6.1 СП 70.13330.2012, за исключением отклонений указанных в проекте. При монтаже должны соблюдаться требования СП 70.13330.2012.
8. Соединение панелей наружных стен с монолитными несущими конструкциями осуществляется металлическими монтажными связями на сварке. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75 за исключением оговоренных. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79. На всех деталях узлов указана величина сварных швов, качественное выполнение которых должно быть обеспечено при монтаже. Электросварка должна непрерывно следовать за монтажом конструкций и до замоноличивания стыков сдаваться по акту на скрытые работы представителю надзора.
9. Контроль качества сварных соединений должен проводиться с учетом требований ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия".
   Визуальному и измерительному контролю подлежат все сварные швы в объеме 100 %. Осмотр и измерение сварных соединений производят по всей протяженности швов.
   Ультразвуковому контролю (УЗК) сварных соединений подлежат 100 % всех швов по всей длине при выборке 5 % узлов данного типа. В случае обнаружения хотя бы одного соединения с недопустимым дефектом назначается повторная проверка и УЗК подлежат 100 % всех швов по всей длине при выборке 10 % узлов данного типа. Если в повторной выборке происходит аналогичная ситуация, контролю подлежит 100 % всех швов по всей длине всех узлов данного типа.
   Материалы для сварки, соответствующие сталям, принимать по таблице Г.1 СП16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*".
   Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром, с обязательной зачисткой и последующей подваркой корня шва. Начало и конец стыковых швов и угловых швов с полным проваром выводить за пределы свариваемых деталей на выводные планки с последующим их удалением и зачисткой мест установки. Обеспечить 100 % неразрушающего контроля для данных сварных швов.
   С целью предупреждения образования трещин в сварных соединениях и слоистого растрескивания проката под действием сварочных напряжений и нагрузок, обратить особое внимание на неукоснительное соблюдение технологии сборки и сварки металлоконструкций, обеспечение требований норм, технических условий, стандартов, работы службы ОТК завода на всех этапах изготовления металлоконструкций.
10. Контроль качества сварных соединений конструкций из сталей класса прочности С345 и выше следует проводить не ранее 48 часов с момента завершения сварки проверяемого узла. Выявленные дефекты в сварных конструкциях должны быть освидетельствованы и исправлены. Без выполнения указанных требований запрещается огрунтовка и приемка на монтаже.
11. Металлические связи должны иметь защитное антикоррозийное цинкосиликатное покрытие.
12. Антикоррозийное покрытие сварных соединений, участков закладных деталей и монтажных связей надлежит выполнять способом холодного цинкования цинконаполненными композициями (типа ЦИНОЛ или ХВ-31). Толщина покрытия должна быть 80 мкм.
13. Все места сварных соединений, включая закладные и соединительные детали, после приемки должны быть тщательно заделаны согласно монтажным узлам. Швы перед заполнением очистить от грязи и пыли. Допускается производить заделку в период отделочных работ.
14. Горизонтальные и вертикальные стыки панелей наружных стен приняты закрытого типа.
15. Герметизация стыков производится уплотняющими пенополиэтиленовыми жгутами с последующей заделкой устья стыка однокопонентными герметизирующими мастиками (RAL см. чертежи АР). Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут должен быть обжат на 25-50 % диаметра поперечного сечения.
16. Вертикальные и горизонтальные стыки с внутренней стороны здания заделываются уплотняющими прокладками. Допускается производить заделку в период отделочных работ.
17. Теплозащита стыков обеспечивается упругими прокладками из лент, обжатыми на 50-70 % их поперечного сечения. Прокладки крепятся к утеплителю наружных стеновых панелей при помощи металлических скоб СК-4.28 с шагом 500-600 мм в количестве 6 шт. на 3,0 п.м длины прокладки и к бетонным поверхностям при помощи полиуретанового клея марки SOUDABOND EASY (фирма SOUDAL).
18. В качестве упругих прокладок для вертикальных и горизонтальных стыков использовать маты минераловатные прошивные без обкладок марки МП-75 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011 или аналог со следующими техническими характеристиками:
    - коэффициент теплопроводности: λ10 = 0,038 (не более) Вт/(м×°С);
      λ25 = 0,040 (не более) Вт/(м×°С);
    - водопоглощение не более 3 % (Wм).

    Объем упругих прокладок в спецификациях посчитан в проектном (обжатом) положении.
    Упругие прокладки должны быть применены по всей длине сопряжения смежных наружных панелей, включая угловые области для панелей с угловыми поворотами.
    В зоне монтажных петель наружных стен по месту устанавливается вкладыш из жесткой минплиты с плотностью от 30 до 120 кг/м³. Допускается заполнение ниши в зоне монтажных петель минераловатными прошивными матами, слои матов должны быть плотно уложены друг к другу без зазоров до самой верхней отметки положения зуба наружного слоя панели.
19. При устройстве герметизации стыков в зимнее время стыкуемые поверхности элементов должны быть очищены от снега и льда путем продувки сжатым воздухом. Изолирующие материалы перед началом работ следует выдерживать в теплом помещении в течение суток. Мастики, укладываемые в стыки, должны иметь положительную температуру.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	

Общие указания (начало)

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

20. Монтаж панелей производить с соблюдением требований СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", а также в соответствии с разработанным специализированной организацией "Проектом производства работ" (ППР) и “Типовой технологической картой” (ТТК), в которых необходимо учесть всю специфику данных конструкций.
21. Требования к монтажу сборных конструкций с допускаемыми отклонениями приведены на листе 5.
22. Работы по герметизации стыков должны вестись в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и ТР 196-08 "Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных панелей".
23. В таблице на листах 6, 7 приведены основные отклонения положения монтажных связей относительно закладных деталей в сборных и монолитных конструкциях. При производстве работ превышение указанных предельных отклонений не допускается.
24. Допускается возможность замены указанных материалов на аналоги с идентичными техническими характеристиками без увеличения сметной стоимости. Применение иных материалов требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
25. В таблице на листе 7 приведены значения расчетной несущей способности монтажных узлов. Превышение указанных в таблице значений не допускается.

II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Изготовление элементов стальных связей крепления должно выполняться на специализированном заводе, имеющем опыт изготовления подобных конструкций.
2. Изготовление стальных связей выполнять в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций", данными указаниями, а также с учетом дополнительных технических требований монтажной организации.
3. Сварочные работы на строительной площадке должны проводиться по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР) или соответствующему разделу ППР.
4. Дополнительные крепежные детали, необходимые для строповки и временного закрепления конструкций предусматриваются при разработке чертежей КЖИ на основании "Дополнительных технических требований" (ДТТ) монтажной организации.
5. Подрядчик в процессе монтажа должен установить временные связи и опоры для обеспечения прочности и устойчивости стеновых панелей до завершения монтажа постоянных конструкций в соответствии с ТТК.
6. Электросварка должна непрерывно следовать за монтажом конструкций и до замоноличивания стыков сдаваться по акту на скрытые работы представителю надзора.

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА СВЯЗЕЙ

1. Установить Деталь 1 в проектное положение, обеспечив плотное прилегание к ЗД панели и ЗД монолитной несущей конструкции. При невозможности одновременного плотного прилегания к закладным деталям панели и монолитной несущей конструкции, необходимо обеспечить плотное прилегание Детали 1 прежде всего к ЗД панели.
2. Зафиксировать Деталь 1 на ЗД монолитной несущей конструкции при помощи сварочных прихваток таким образом, чтобы выставленное положение уголка в пункте 1 не изменилось.
3. Установить Деталь 2 в проектное положение, обеспечив плотное прилегание к Детали 1 и ЗД панели. При обеспечении плотного прилегания к Детали 1 в проектном положении, зафиксировать Деталь 2 на ЗД панели сварочными прихватками к ЗД, таким образом, чтобы выставленное положение Детали 2 не изменилось.
4. Приварить Деталь 2 к ЗД панели согласно проекту, используя правила наложения сварных швов с целью обеспечения минимальных усадочных деформаций.
5. Приварить Деталь 1 к ЗД монолитной несущей конструкции согласно указаниям на узле, используя правила наложения сварных швов с целью обеспечения минимальных усадочных деформаций.

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В НЕАГРЕССИВНЫХ И СЛАБОАГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие рекомендации распространяются на защиту от коррозии стальных строительных конструкций, эксплуатирующихся в слабоагрессивных условиях и неагрессивных условиях внутри помещений.

1.2. Защита стальных строительных конструкций от коррозии должна производиться в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии", ГОСТ 9.402-2004 "Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием", СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

1.3. Допускается подготовку поверхности и грунтование проводить на заводе, а окончательную окраску на строительно-монтажной площадке.

1.4. Технологический процесс защиты металлоконструкций от коррозии включает в себя следующие операции:
- подготовку поверхности перед окрашиванием;
- нанесение и сушку лакокрасочных покрытий;
- контроль качества выполняемых работ.

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

2.1. Подготовка поверхности включает в себя очистку поверхности металлоконструкций от окислов (прокатной окалины и ржавчины), механических, жировых и других загрязнений. Предварительно с поверхности металлоконструкций должны быть полностью удалены вспомогательные элементы, заусенцы, сварочные брызги, остатки флюса, зачищены сварные швы, скруглены острые кромки радиусом менее 0,3 мм с помощью ручного или механизированного абразивного инструмента.

2.2. Обезжиривание поверхности следует производить до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004 кистями или ветошью, смоченными уайт-спиритом, нефрасом или бензином марки Б-70.

2.3. Очистку поверхности вновь изготавливаемых конструкций от окислов следует производить дробеметным или дробеструйным (песко-струйным) способами до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004 при условии, что интервал с момента изготовления окрашенных металлоконструкций до подведения тепла в здании не превышает 6 месяцев, и до степени 2 - при интервале более 6 месяцев. При этом окрашенные металлоконструкции должны храниться на деревянных подкладках с прокладками из полиэтиленовой пленки.

Поверхность, очищенная до степени 2, должна быть матовой, серого цвета, с равномерной шероховатостью, максимальная величина которой составляет 40 мкм, без видимых невооруженным глазом остатков продуктов коррозии и прокатной окалины.

На поверхности металлоконструкций, очищенных от окислов до степени 3, допускается наличие отдельных полос и вкраплений ржавчины и прокатной окалины, занимающих не более 5 % поверхности.

2.4. Для исключения образования на очищенной поверхности вторичной ржавчины интервал между подготовкой поверхности и нанесением защитных покрытий должен быть сведен до минимума. Он не должен превышать 6 часов на открытом воздухе и 24 часов внутри помещений в условиях, исключающих попадание на очищенную поверхность пыли, масла, влаги, др. загрязнений и конденсацию на ней влаги.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	3	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Общие указания (продолжение 1)	МФС Генеральный Подрядчик		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3

3. НАНЕСЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

3.1. Нанесение лакокрасочных покрытий следует производить по указаниям раздела КЖ.У. Возможно также применение других материалов, по согласованию с Заказчиком строительства и авторами проекта.

3.2. Подбор материалов лакокрасочных покрытий осуществляется с учётом требований к подготовке поверхностей перед нанесением огнезащитных составов и учетом адгезии этих материалов.

3.3. Нанесение лакокрасочных покрытий следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %, если нет других указаний в нормативно-технической документации на каждый конкретный материал.

3.4. Лакокрасочные материалы следует подготавливать к работе в соответствии с ГОСТ или ТУ на эти материалы.

3.5. Лакокрасочные покрытия, поврежденные в результате транспортирования, хранения и монтажа металлоконструкций, должны быть восстановлены.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

4.1. Используемые лакокрасочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на эти материалы, иметь паспорта заводов-изготовителей и неистекший срок годности.

4.2. Качество нанесенного покрытия контролируют по внешнему виду путем визуального осмотра 100 % поверхности конструкций, времени высыхания, адгезии и толщине.

Нанесенное лакокрасочное покрытие должно быть сплошным (без непрокрашенных мест), без посторонних включений, потеков, морщин, пузырей, оспин и других дефектов, снижающих защитные свойства покрытий.

Покрытие должно быть однородным и достаточным по толщине, иметь удовлетворительную адгезию (1-2 балла). Адгезию покрытий определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.

Толщину лакокрасочных покрытий определяют методом неразрушающего контроля с помощью толщиномеров магнитного или электромагнитного типов, например МТ-33Н, МТ-50НЦ или других марок.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении антикоррозионных работ необходимо руководствоваться:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- ГОСТ 12.3.005-75 "Работы окрасочные. Общие требования безопасности";
- ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты работающих. Общие требования и классификация";
- ГОСТ Р 12.3.052-2020 "Работы антикоррозионные . Требования безопасности";
- ГОСТ 12.1.005-88 "Воздух рабочей зоны".

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	4	
Общие указания (продолжение 2)	МФС Генеральный Подрядчик		

Формат А3

Требования к монтажу сборных конструкций

1. Монтаж панелей наружных стен следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготавливают маяки, не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели (ламинированная фанера, пластик, строительный гипс и пр. см. ТТК). Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать +/- 5 мм. Между торцом панели после ее выверки и растворной постелью не должно быть щелей.
2. В соответствии с требованиями к законченным железобетонным конструкциям отклонение отметок поверхностей и закладных изделий, служащих для опирания сборных элементов -5 мм (п. 9 табл. 5.12 СП 70.13330.2012).
3. Выверку панелей наружных стен следует производить:
   - в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси;
   - из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей;
   - в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели относительно вертикали.
4. Положение смонтированных сборных конструкций фиксируется по ходу их монтажа на геодезических исполнительных схемах в соответствии с требованиями п. 3.5 СП 70.13330.2012.
5. При выявлении по результатам строительного контроля отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и СП 70.13330.2012 (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) составляется акт освидетельствования железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на предмет разработки мероприятий по обеспечению безопасности конструкций.
6. Раскладку цементного раствора следует производить непосредственно перед установкой сборных конструкций в проектное положение. При монтаже разрешается применять только свежеприготовленный раствор марки М200.
7. Непосредственно перед устройством стыков и швов необходимо очистить стыкуемые поверхности от мусора и грязи, снега и наледи. Монтаж сборных железобетонных конструкций на слой замерзшего раствора не допускается.
8. При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует руководствоваться приложением У СП 70.13330.2012, устанавливающим область применения и расход добавок, а также ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.

Допускаемые отклонения при приемке установленных сборных конструкций (начало)

№п/п	Проверяемые элементы	Проверяемые параметры	Допустимые отклонения	Примечание
1	Качество поверхности сборной конструкции	Наличие на поверхности сборной конструкции: - участков неуплотненного бетона, - жировых пятен и пятен ржавчины, - обнаженной арматуры	Не допускается	Метод - визуальный /полная проверка
2		Наличие трещин шириной раскрытия более 0,2 мм	Не допускается	Метод - измерительный (металлический щуп, лупа ценой деления не более 0,05 мм, рулетка, штангенциркуль) / полная проверка
3		Наличие сколов бетона ребер глубиной более 5 мм и длиной более 50 мм на 1 м длины ребра	Не допускается	

Допускаемые отклонения при приемке установленных сборных конструкций (окончание)

№п/п	Проверяемые элементы	Проверяемые параметры	Допустимые отклонения	Примечание
4	Качество устройства растворной постели	Наличие загрязнений, мусора в растворном шве, снега, наледи	Не допускается	Метод - визуальный и измерительный (рулетка, штангенциркуль) / полная проверка / журнал работ
5		Наличие разрывов и пропусков в растворной постели	Не допускается	
6		Толщина растворного шва должна быть 20 мм	-6 / +10 мм	
7	Положение наружных навесных панелей типов: - 3НС, - парапета переходного балкона ОЛ, - лоджии ОЛ	Отклонение от совмещения ориентиров в нижнем сечении панели относительно разбивочных осей	±8 мм	Метод - измерительный, геодезический (отвес, рулетка, линейка) / полная проверка / журнал работ
8		Отклонение от вертикали верха плоскости панели	10 мм	
9		Ширина опорной части панелей 3НС и парапета переходного балкона ОЛ 80 мм	±10 мм	
10		Ширина опорной части однослойной панели лоджии ОЛ 60 мм	±10 мм	
11		Ширина вертикальных и горизонтальных швов между торцевыми частями наружного слоя панелей 15 мм	±6 мм	
12	Положение марша ЛМ	Отклонение от вертикали верха плоскостей марша	±10 мм	
13		Глубина опирания лестничного марша 80 мм	±20 мм	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом







Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Общие указания
(продолжение 3)

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

Допускаемые отклонения положения монтажных связей от проектного положения (начало)

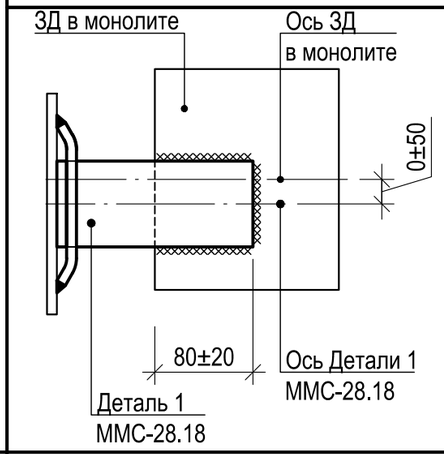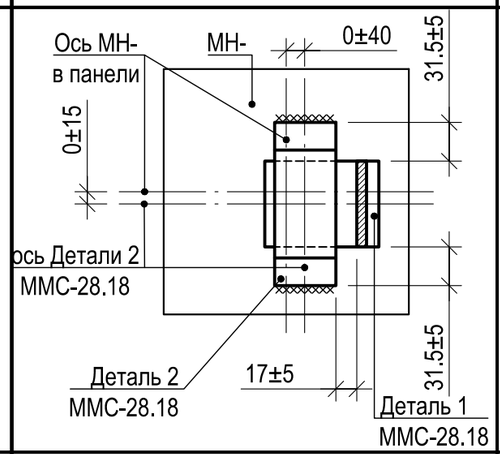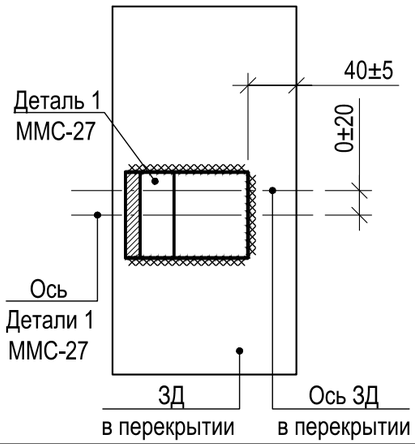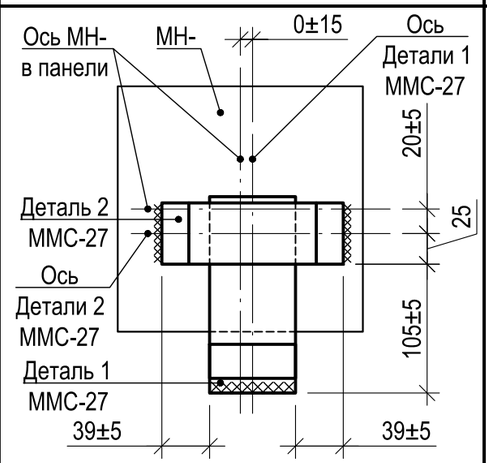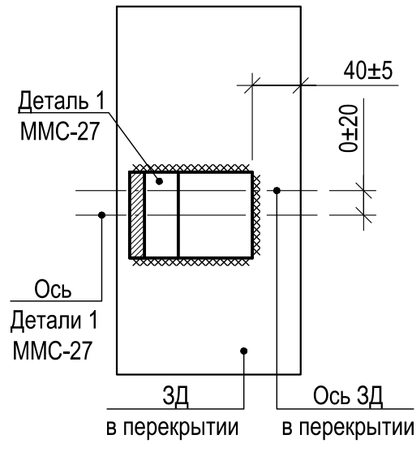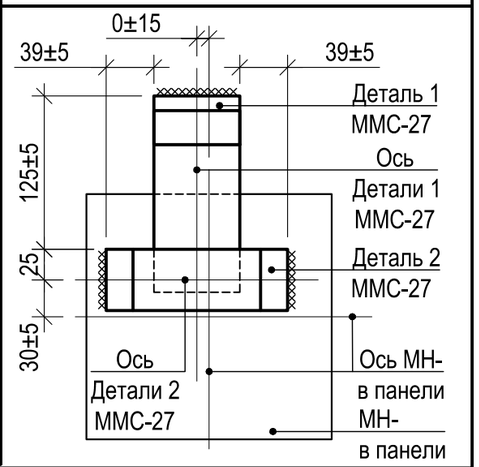Номер узла по альбому	Эскиз или допускаемые отклонения			
1/P1, 2/P1, 3/P1, 4/P1, 5/P1, 6/P1, 7/P1, 9/P1, 10/P1, 11/P1, 13/P1, 15/P1, 17/P1, 26/P1, 27/P1	Привязка монтажной связи к монолитным вертикальным конструкциям	Привязка монтажной связи к закладной детали в наружной навесной панели		
				
	Привязка монтажной связи к ЗД в верхней грани монолитного перекрытия (в полу)	Привязка монтажной связи к закладной детали в наружной навесной панели (нижняя ЗД)	Привязка монтажной связи к нижней грани монолитного перекрытия (под потолком)	Привязка монтажной связи к закладной детали в наружной навесной панели (верхняя ЗД)
14/P1, 16/P1, 18/P1				

1. Применение данных Допускаемых отклонений положения монтажных связей от проектного положения возможно только при соблюдении Требований к монтажу сборных конструкций и Допускаемых отклонений при приемке установленных сборных конструкций в части положения панелей (см. п.п. 7-11), приведенных на листе 5.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Общие указания (продолжение 4)

МФС Генеральный Подрядчик

Согласовано



ВЗам. инв. N

Подпись и дата






Инв. N подл.

Формат А3

Допускаемые отклонения положения монтажных связей от проектного положения (окончание)

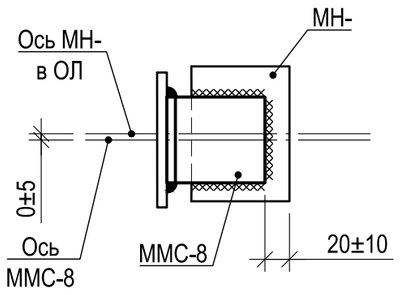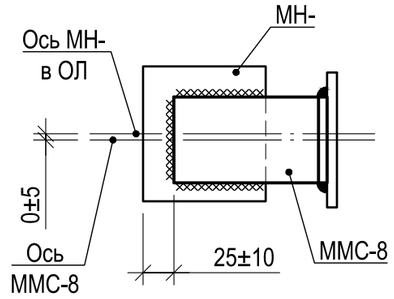Номер узла по альбому	Эскиз или допускаемые отклонения			
	Привязка монтажной связи к закладной детали в ОЛ	Привязка монтажной связи к закладной детали в ОЛ		
20/Р1				

Расчетная несущая способность монтажных узлов

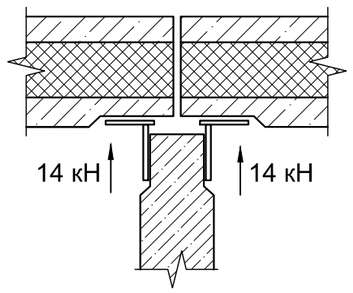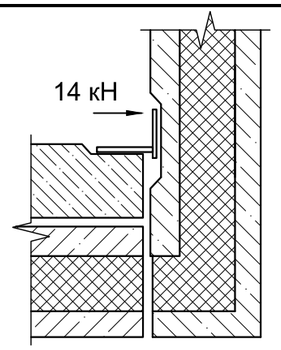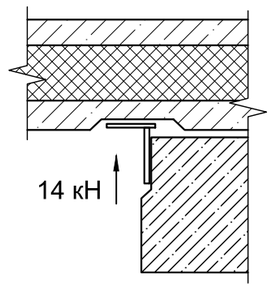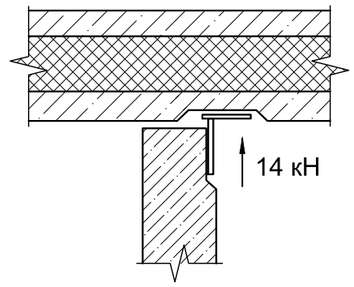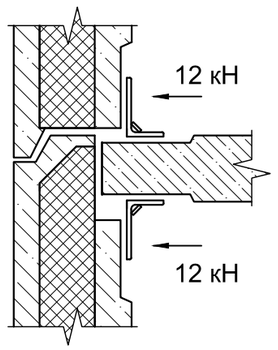1/Р1, 2/Р1, 27/Р1	3/Р1, 6/Р1, 7/Р1	4/Р1, 7/Р1, 10/Р1, 13/Р1, 26/Р1	5/Р1, 9/Р1, 11/Р1, 17/Р1	14/Р1, 16/Р1, 18/Р1
				

1. Схема расстановки и количество монтажных узлов для панелей различных типов и размеров должны быть уточнены при адресном проектировании с соответствующим расчетным обоснованием.
2. Наружные навесные стеновые панели не участвуют в формировании жесткости здания. Крепление панелей к несущим конструкциям производится посредством узлов, воспринимающие ветровые и температурные климатические воздействия. Монтажные узлы запроектированы таким образом, чтобы воспринимать усилия, действующие из плоскости панелей, при этом узлы имеют подвижность в вертикальном и горизонтальном (вдоль панели) направлениях.
3. Усилия, возникающие в монтажных узлах, не должны превышать значений расчетной несущей способности узлов, указанных в таблице.
4. Приведенные на листе 5 Требования к монтажу сборных конструкций и Допускаемые отклонения при приемке установленных сборных конструкций, а также приведенные на листах 6 и 7 Допускаемые отклонения положения монтажных связей от проектного положения являются неотъемлемыми параметрами, обеспечивающими Расчетную несущую способность монтажных узлов, соблюдение данных параметров является обязательным.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ		
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака		
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов:
Проверил		Мачехин			24.06.24			
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Общие указания (продолжение 5)	МФС Генеральный Подрядчик	


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.


Узел заделки в зоне установки монтажной связи (вариант 1)

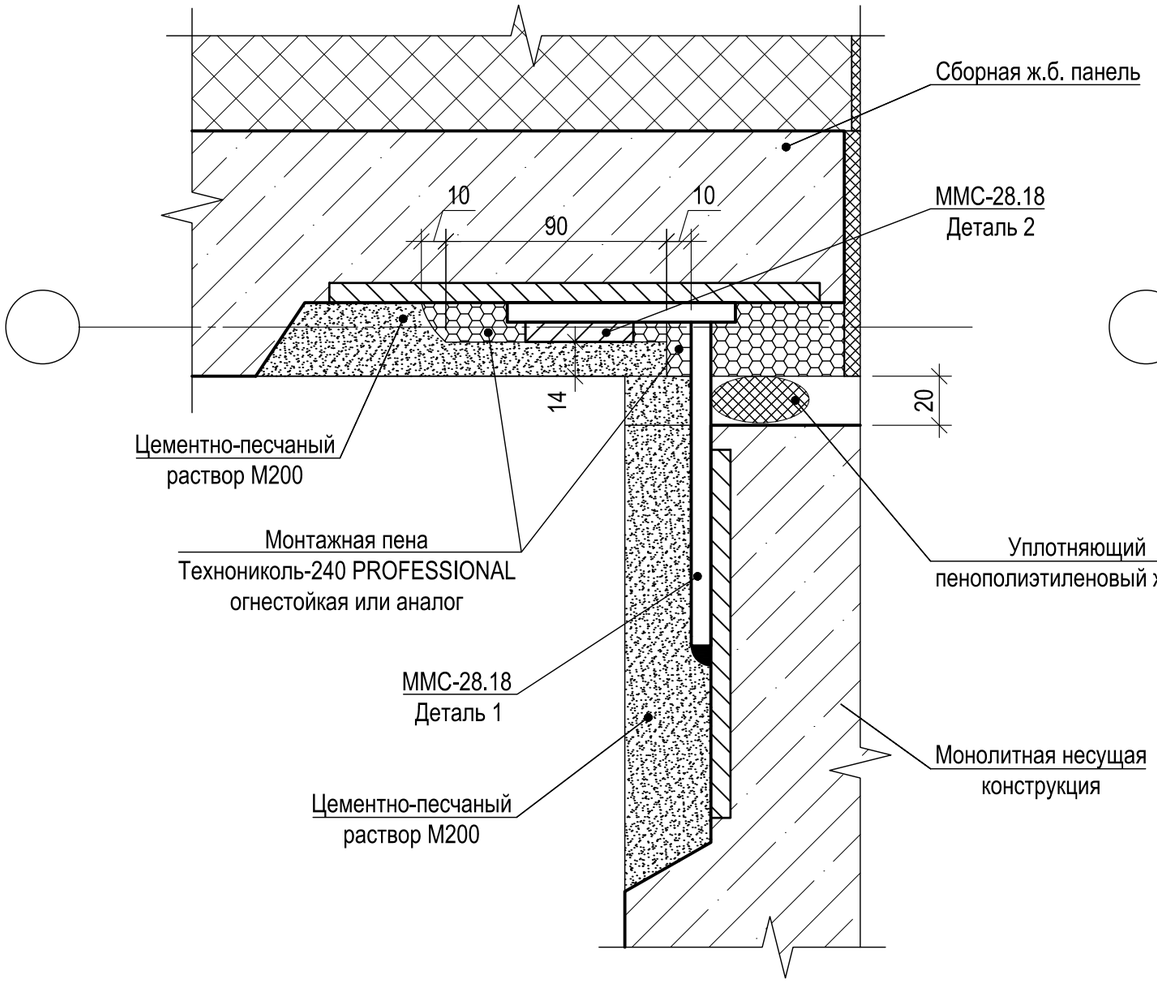

ПРИМЕЧАНИЯ для Варианта 1.

1. Производить заделку в зоне установки монтажной связи согласно следующей очередности:
   а. Нанести монтажную пену;
   б. Срезать монтажную пену согласно узла;
   в. Зачеканить цементно-песчаным раствором М200 с разделением слоев разного направления.
2. Заделку ниши в панели вести с опережением заделки ниши в монолитной несущей конструкции на 3 часа минимум
3. ** - Установку уплотняющего жгута выполнить до затвердения монтажной пены.

Узел заделки в зоне установки монтажной связи (вариант 2) для панелей расположенных над и под противопожарным перекрытием

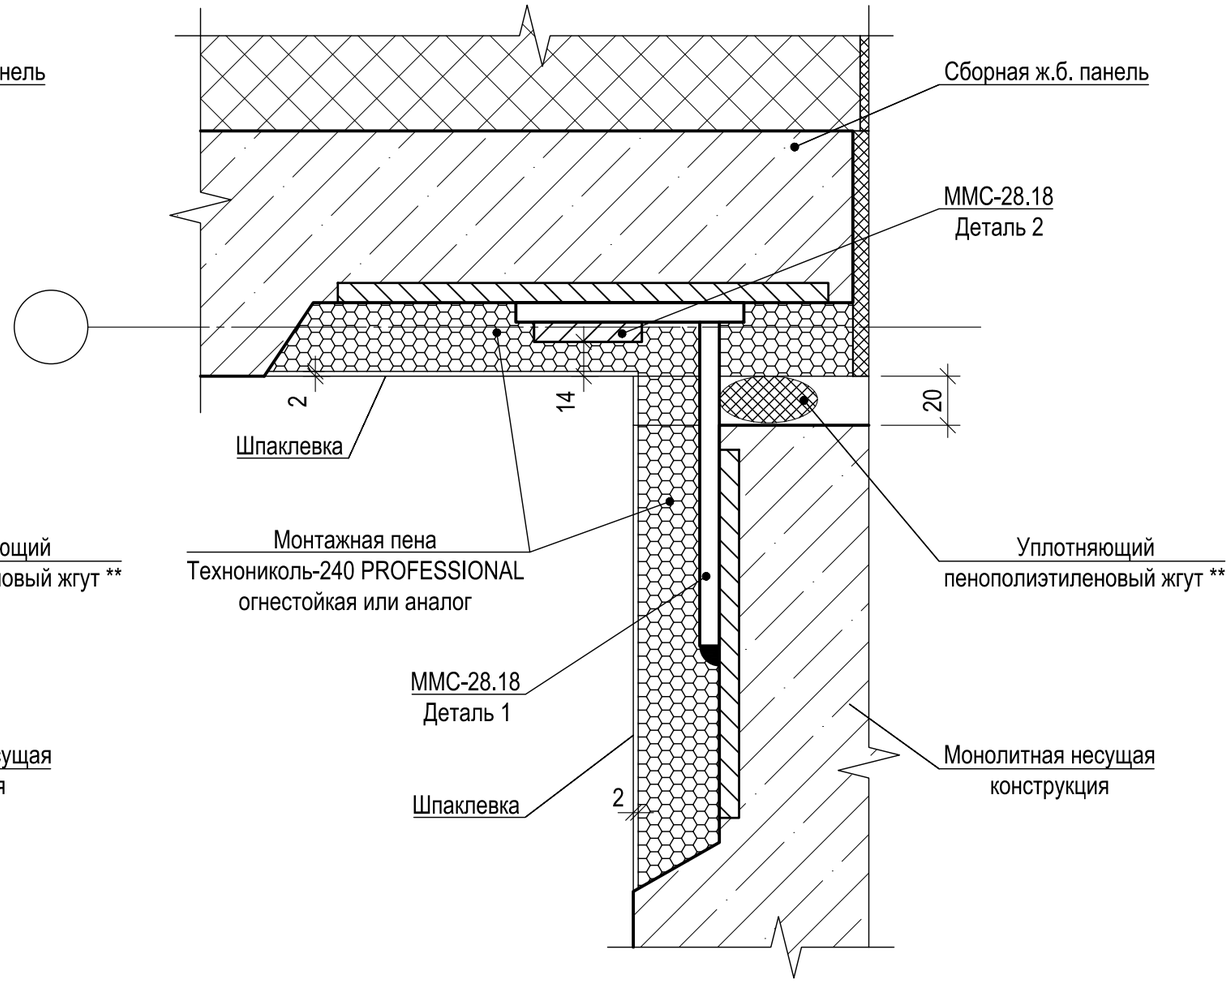

ПРИМЕЧАНИЯ для Варианта 2.

1. Производить заделку в зоне установки монтажной связи согласно следующей очередности:
   а. Нанести монтажную пену;
   б. Срезать монтажную пену согласно узла.
2. ** - Установку уплотняющего жгута выполнить до затвердения монтажной пены.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	8	

Общие указания (продолжение 6)

МФС Генеральный Подрядчик

Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Формат А3

Привязка угловой панели в зависимости от отделки наружного слоя:


- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 50 мм

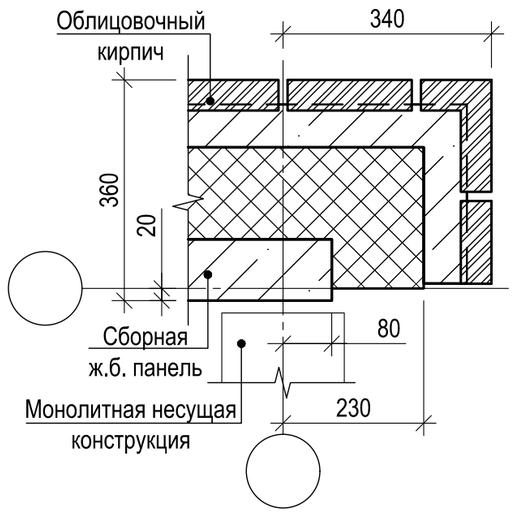

- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 50 мм (вариант привязки)

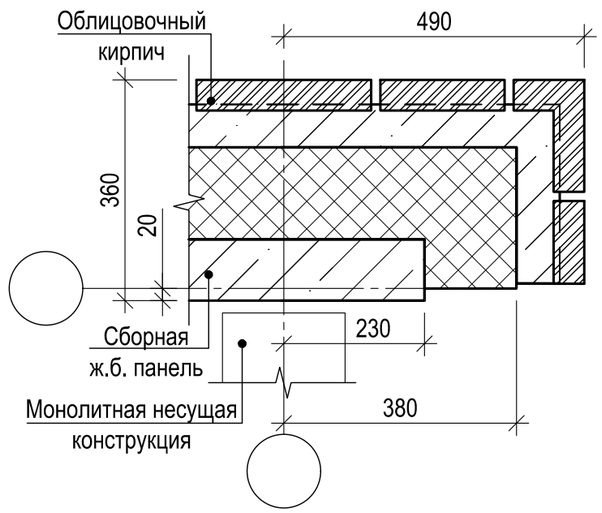

- с отделкой плиткой

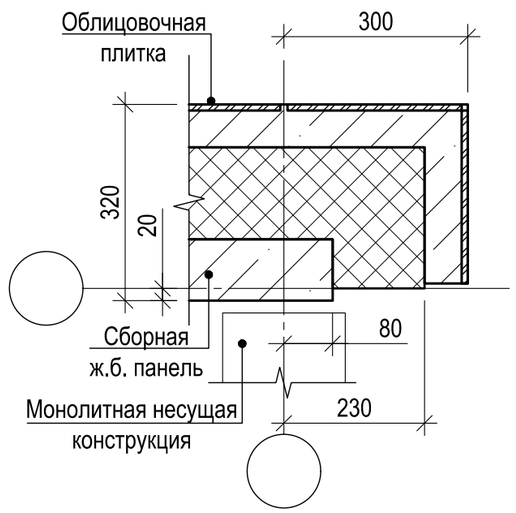

- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 20 мм

- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 20 мм (вариант привязки)


- с отделкой плиткой (вариант привязки)

- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 20 мм, кирпич на торце отсутствует


- с отделкой кирпичом при толщине кирпича 20 мм, кирпич на торце отсутствует (вариант привязки)

Толщины панели в зависимости от отделки наружного слоя с отделкой кирпичом:

- 360 мм - при наличии в отделке наружного слоя выступающих элементов (в зависимости от паттернов);
- 330 мм - при отделке наружного слоя без выступающих элементов.

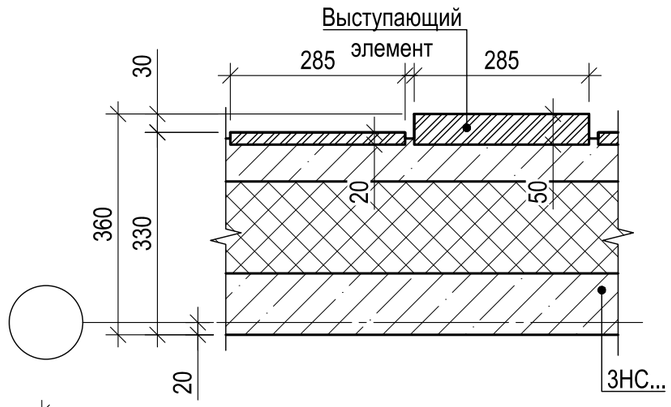

- 200 мм (230 мм)* - при наличии в отделке наружного слоя выступающих элементов (в зависимости от паттернов);
- 170 мм (200 мм)* - при отделке наружного слоя без выступающих элементов.

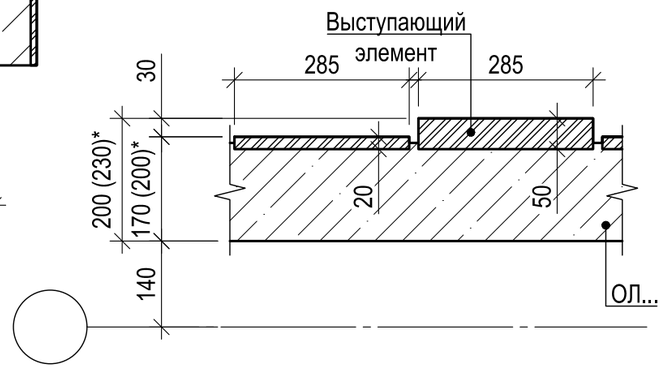


1. Раскладка кирпича показана условно, фактическая раскладка облицовочного кирпича/плитки конкретных панелей отображена в альбомах АКР.
2. * - значения вне скобок даны для однослойных панелей лоджий, значения в скобках даны для однослойных панелей парапетов переходных балконов.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ		
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака		
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия: Р	Лист: 9
Проверил		Мачехин			24.06.24			Листов:
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Общие указания (продолжение 7)	МФС Генеральный Подрядчик	


ВЗам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3


Деталь стыка стеновых панелей с отделкой кирпичом

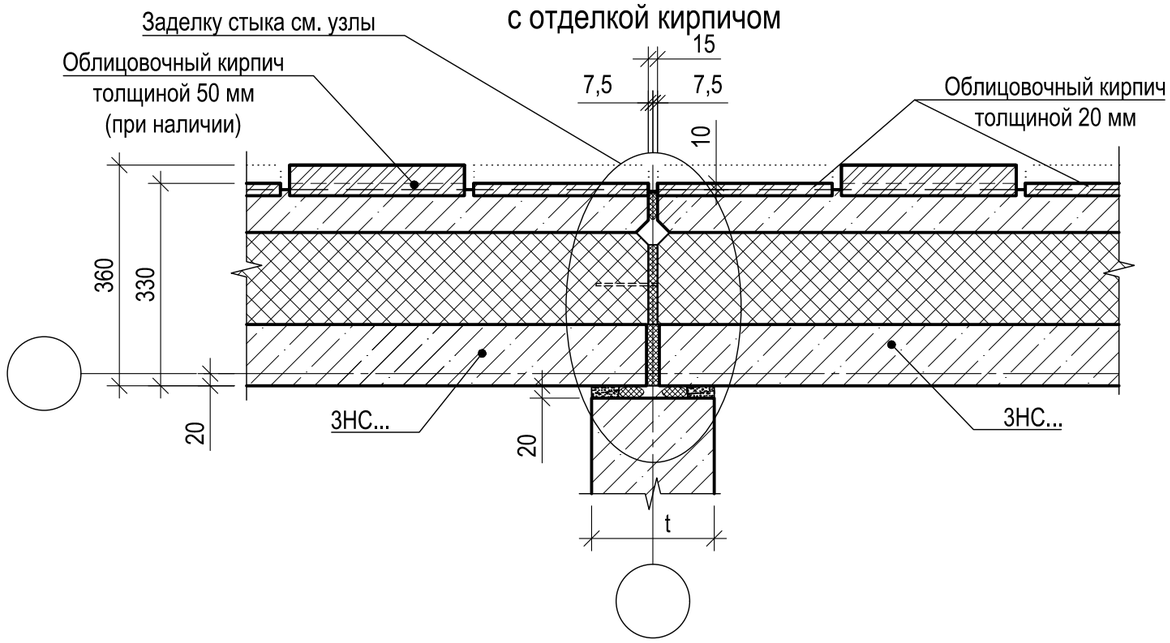

Деталь стыка стеновых панелей с отделкой плиткой

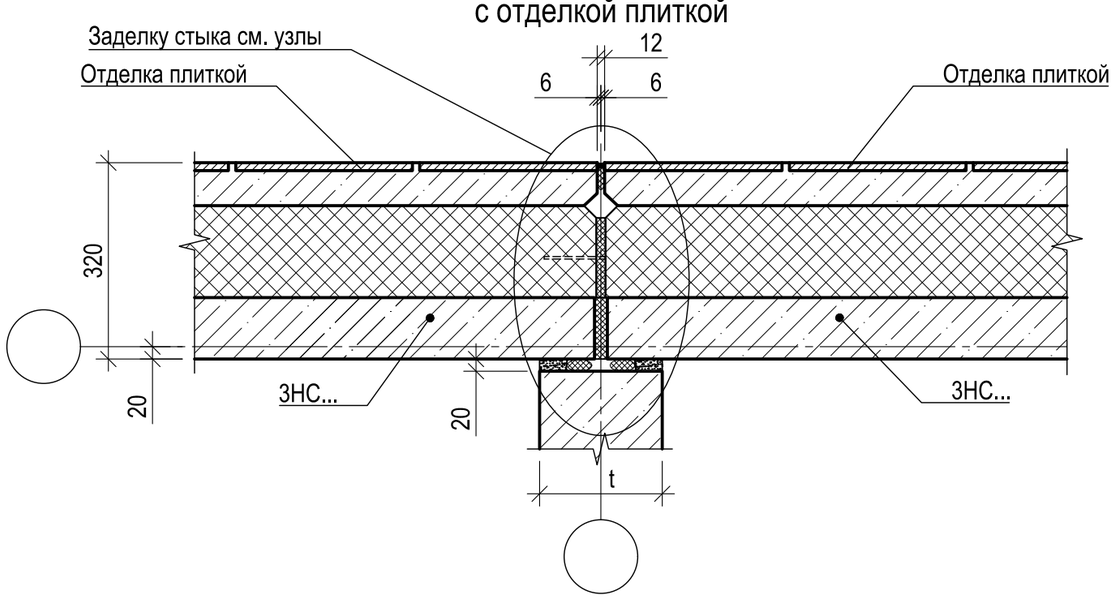

Фрагмент стеновой панели с отделкой кирпичом

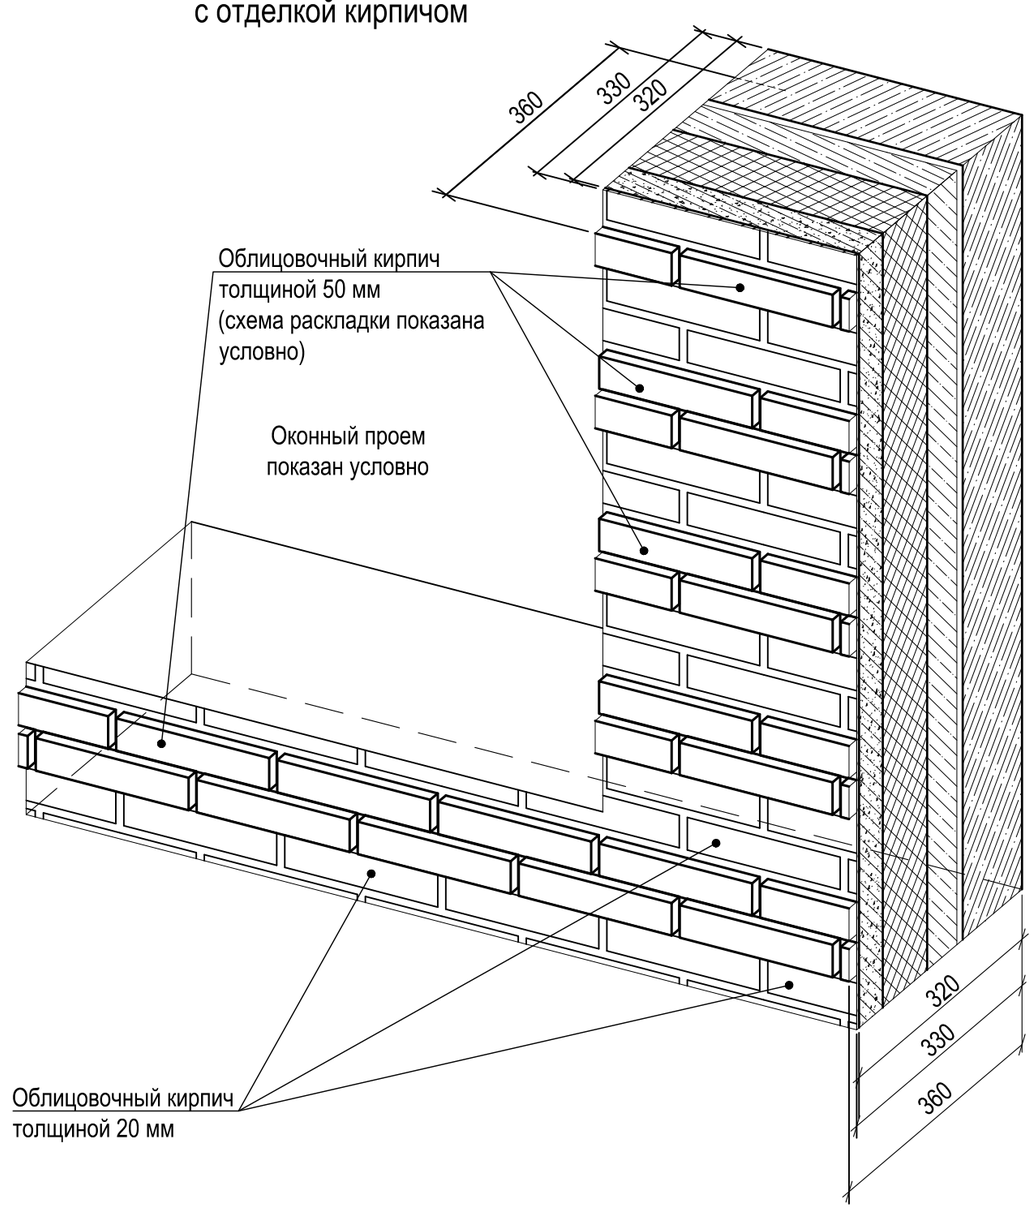

Раскладка кирпича показана условно, фактическая раскладка облицовочного кирпича/плитки конкретных панелей отображена в альбомах АКР.

Величины толщин вертикального (b) и горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями.

п/п	Тип отделки панели		b	b/2	c	c/2
1	Отделка кирпичом	мм	15	7,5	15	7,5
2	Отделка плиткой	мм	12	6,0	12	6,0




При величине толщины межпанельного шва менее 7 мм необходимо расширить шов.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	10	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Общие указания (окончание)	МФС	Генеральный Подрядчик	

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3

Ведомость элементов монтажных связей

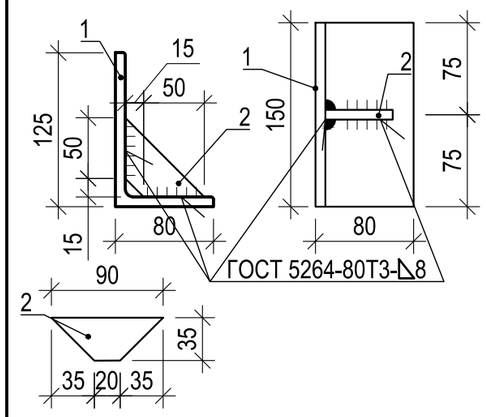Марка связи	Эскиз	Обозначение	Сечение, мм	Длина L, мм	Масса, кг	
					поз.	детали
СК-4.28		ГОСТ 6727-80	Ø4 Вр1	280	0,026	0,026
ММС-8		ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2021	L125х80х8	70	0,88	0,88
ММС-22		поз.1 ГОСТ 8510-86 С245 ГОСТ 27772-2021	Уголок 125х80х8	150	1,89	2,09
		поз.2 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2021	- 8х35	90	0,20	

Монтажную деталь ММС-22 выполнять в заводских условиях, включая антикоррозийное покрытие. После монтажа конструкций восстановить поврежденное покрытие

1. * - Размер для справки.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	11	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Ведомость элементов монтажных связей (начало)	МФС Генеральный Подрядчик		





Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

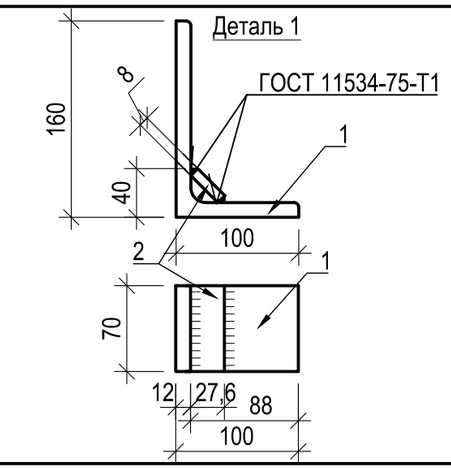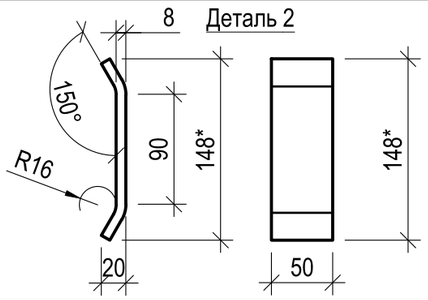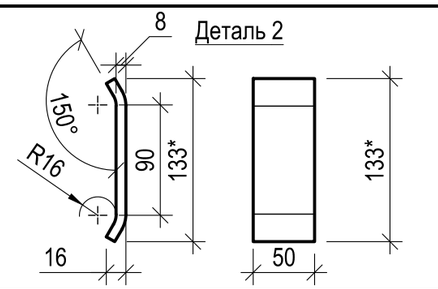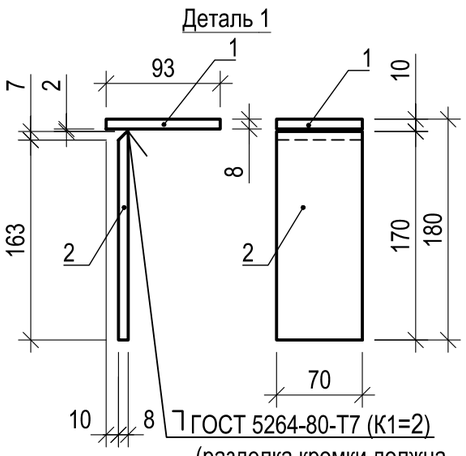Марка связи	Эскиз	Обозначение	Сечение, мм	Длина L, мм	Масса, кг	
					поз.	детали
ММС-27		поз.1 ГОСТ 8510-86 С355 ГОСТ 27772-2021	L160x100x12	70	1,65	2,25
		поз.2 ГОСТ 103-2006 С355 ГОСТ 27772-2021	- 8х30	70	0,13	
		ГОСТ 103-2006 С355 ГОСТ 27772-2021	- 8х50	150	0,47	
ММС-28.18		ГОСТ 103-2006 С355 ГОСТ 27772-2021	- 8х50	135	0,42	1,58
		поз.1 ГОСТ 103-2006 С355 ГОСТ 27772-2021	- 8х70	93	0,41	
		поз.2 ГОСТ 103-2006 С355 ГОСТ 27772-2021	- 8х70	170	0,75	

Монтажные детали ММС-27, ММС-28.18 выполнять в заводских условиях, включая антикоррозийное покрытие. После монтажа конструкций восстановить поврежденное покрытие

1. При изготовлении детали 1 связи ММС-28.18 применять электроды Э50А.
2. * - Размер для справки.
3. Габариты Деталей 1 для ММС-27 и ММС-28.18 даны с учетом допускаемых отклонений по установке сборных конструкций.

Согласовано

ВЗам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом


Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Ведомость элементов монтажных связей (окончание)

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3


Деталь 1
(Заделка горизонтального стыка)

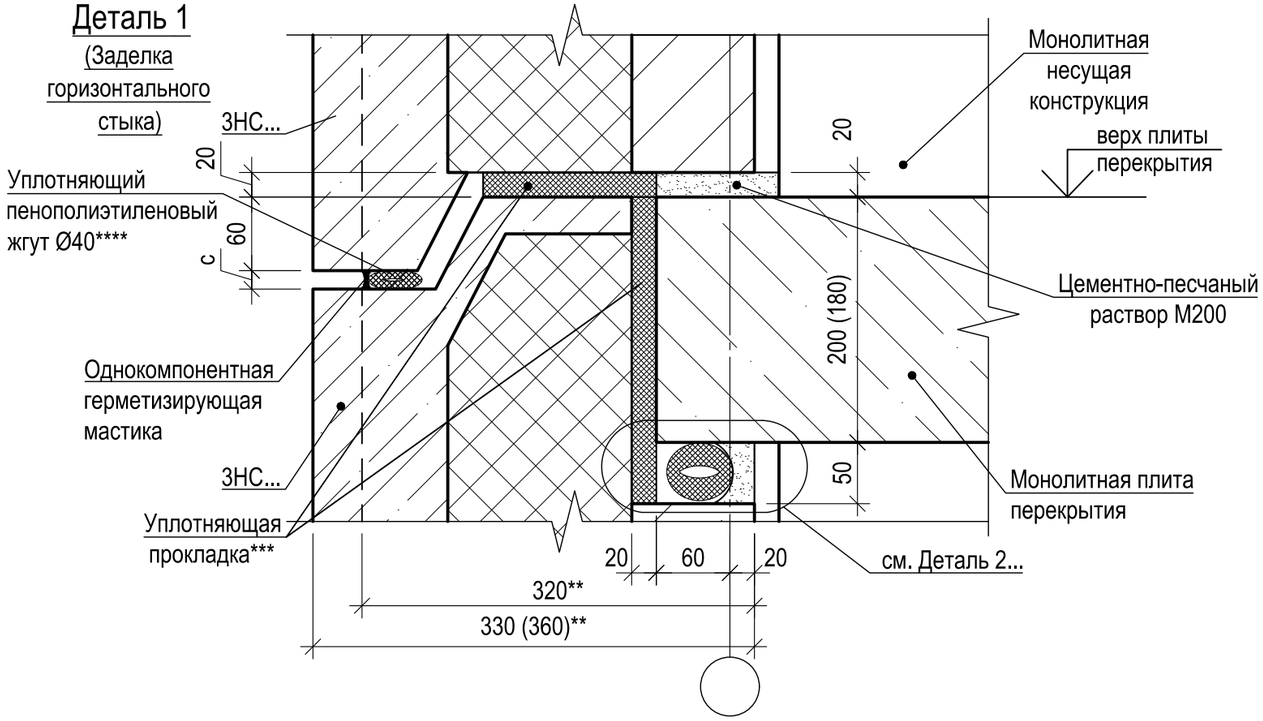


Спецификация к Деталям 1 и 2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.		Приме-чание
		Деталь 1 (на 1 п.м шва)			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	1,0		пог. м
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка ***	0,008		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00006		м³
		Деталь 2.1			
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø70	1,0		пог. м
	ГОСТ Р 58279-2018	Гипсовая штукатурка	-	1,1	кг
		Деталь 2.2			
	ТУ производителя	Уплотняющий термостойкий жгут Ø70 (НГ)	1,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	-	0,002	м³ (приведенный объем (к емкости баллона))

Деталь 2.1
(Заделка горизонтального стыка под монолитной плитой)

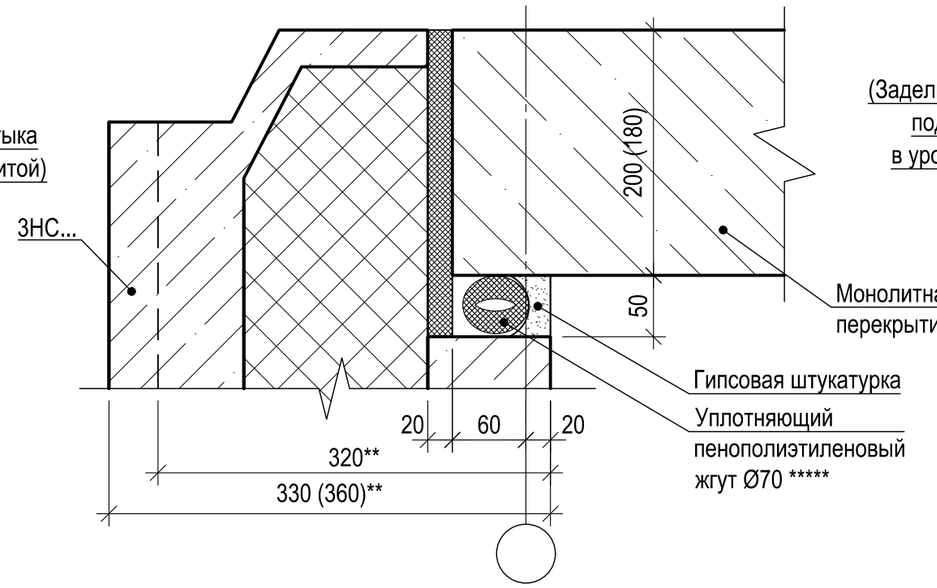

Деталь 2.2
(Заделка горизонтального стыка под монолитной плитой в уровне противопожарного перекрытия)

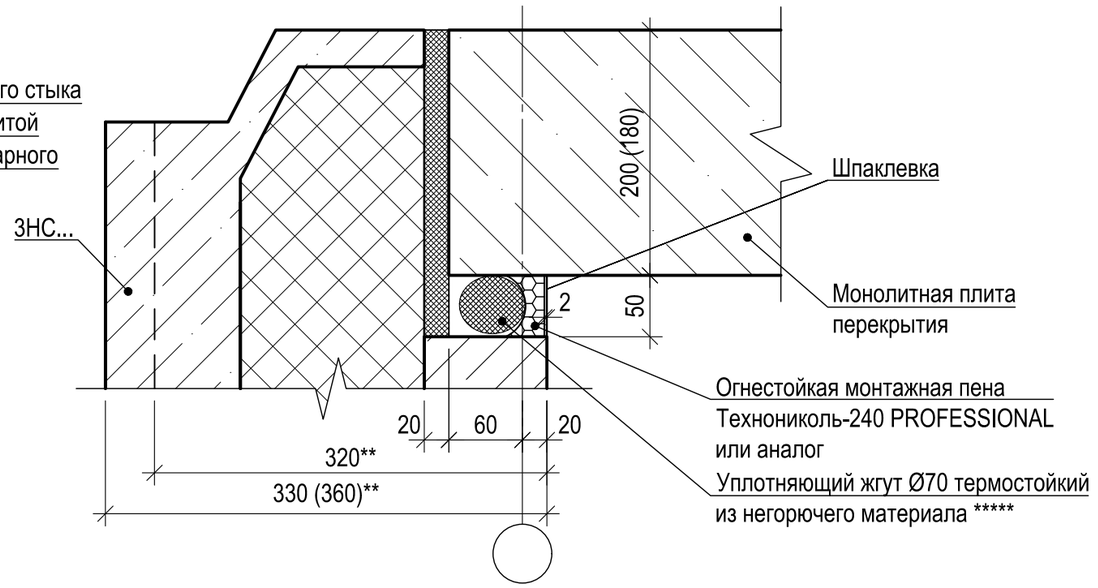

1. Величину толщины горизонтального (с) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
2. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
3. *** - Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. п.18 Общих указаний на л. 2. Упругие прокладки должны быть применены по всей длине сопряжения смежных наружных панелей, включая угловые области для панелей с угловыми поворотами. Крепление прокладок осуществляется в соответствии с п. 17 Общих указаний на л. 2.
4. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
5. ***** - Монтаж уплотнящего жгута Ø70 мм производить после полного демонтажа на текущем этаже стоек переопирания опалубки монолитной плиты перекрытия. В случае заделки горизонтального стыка под монолитной плитой, являющейся противопожарной преградой, в качестве уплотняющего жгута необходимо применить термостойкий жгут из негорючего материала (НГ) класса пожарной опасности КМ0, с обеспечением предела огнестойкости противопожарного перекрытия в зоне горизонтального стыка не менее EI 150. Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	13	

Деталь 1 (заделка горизонтального стыка). Деталь 2 (заделка горизонтального стыка под монолитной плитой)

МФС — Генеральный Подрядчик

Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Формат А3

Деталь 3.1

(горизонтальный стык в зоне установки стальной петли)

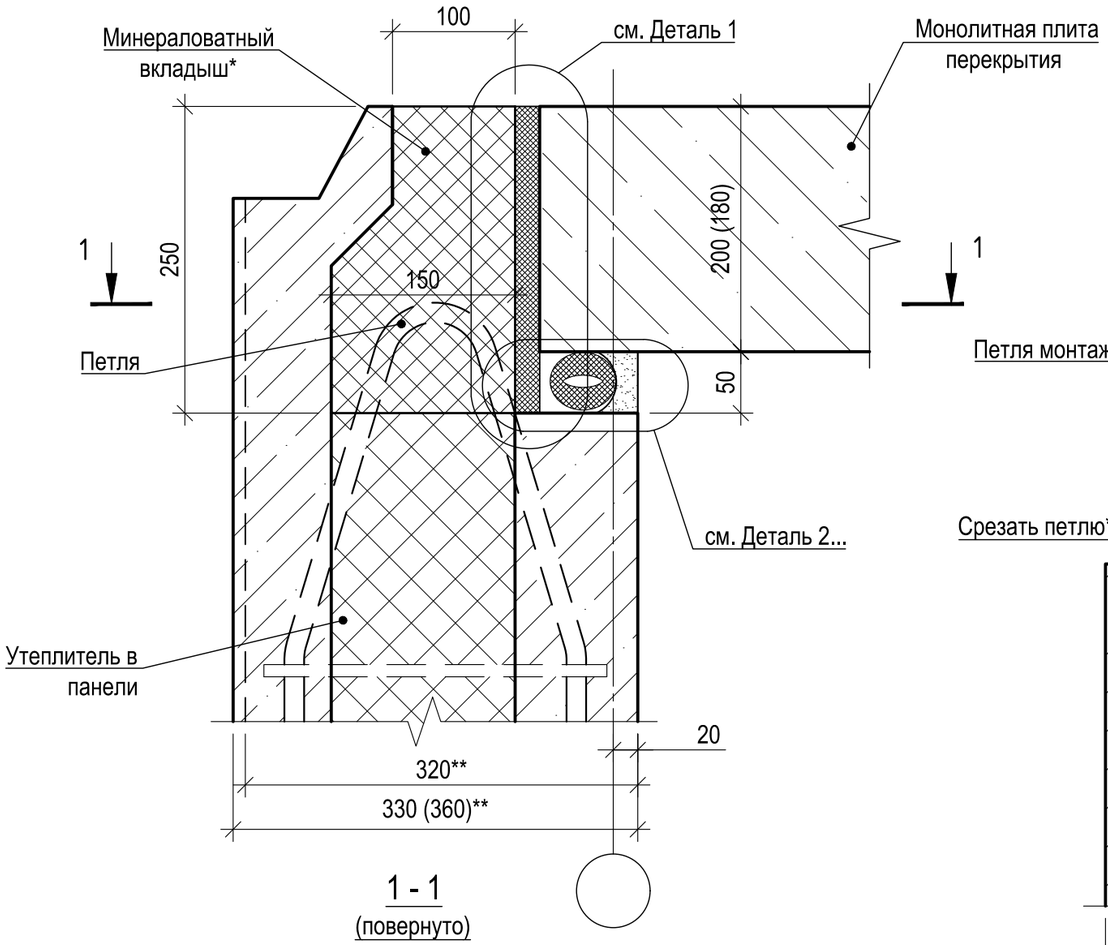

1 - 1
(повернуто)

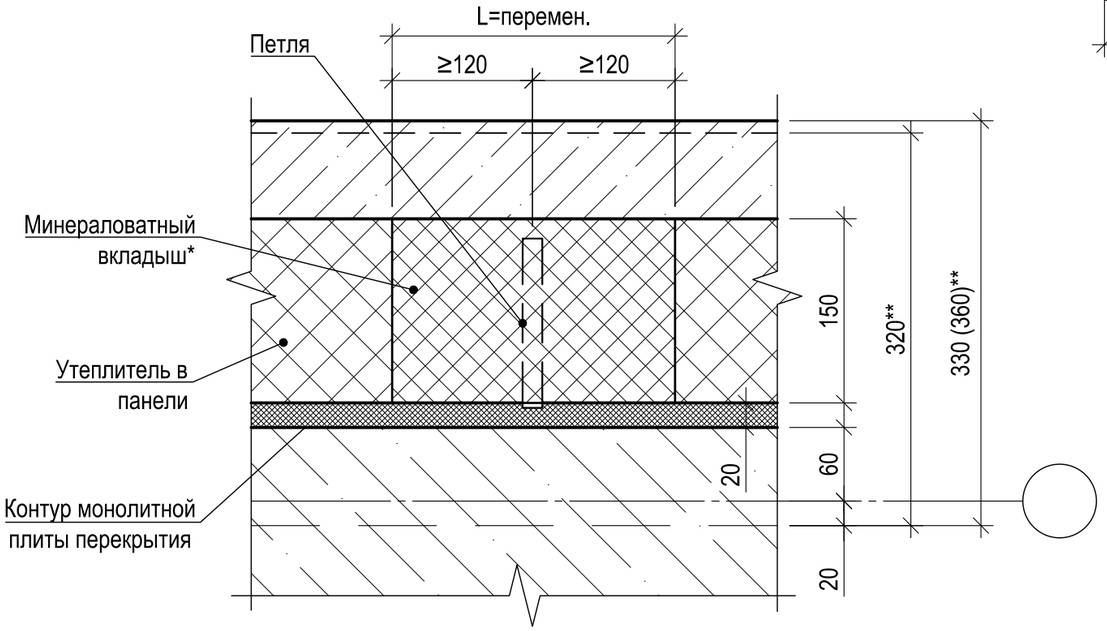


Спецификация к Детали 3


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Деталь 3.1 (на 1 п.м шва)			
	ТУ производителя	Жесткая плита с плотностью 30 -120 кг/куб.м	0,008		м³

Деталь 3.2

(горизонтальный стык в зоне установки текстильной петли)

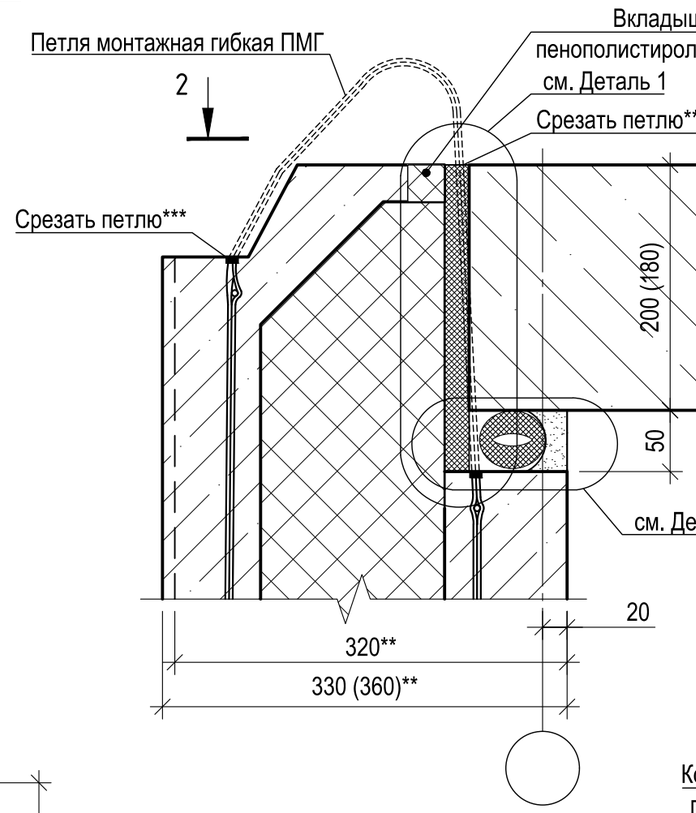

2-2
(повернуто)

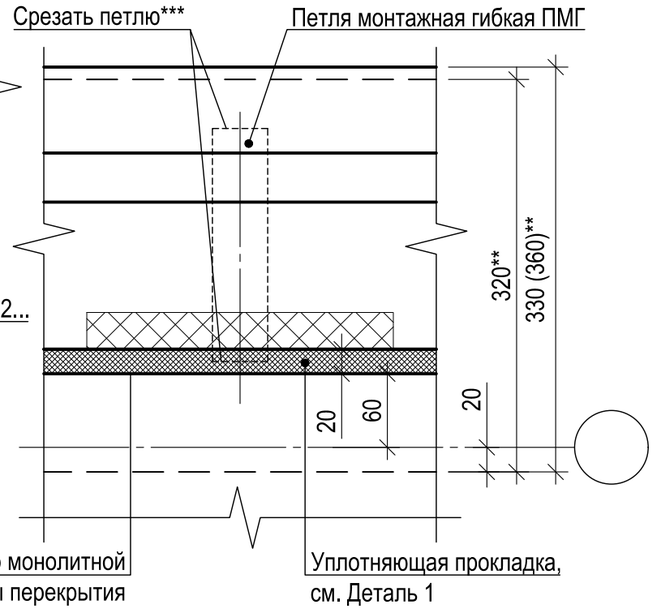

1. * - Минераловатный вкладыш, см. Общие указания п. 18 на л. 2.
2. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
3. *** - Перед установкой наружной панели вышележащего этажа текстильную петлю срезать в указанных местах.
4. Детали 1, 2... см. л. 13.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Деталь 3 (горизонтальный стык в зоне установки петли)

МФС Генеральный Подрядчик

Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3


Деталь 4

(установка навесной панели переходного балкона)

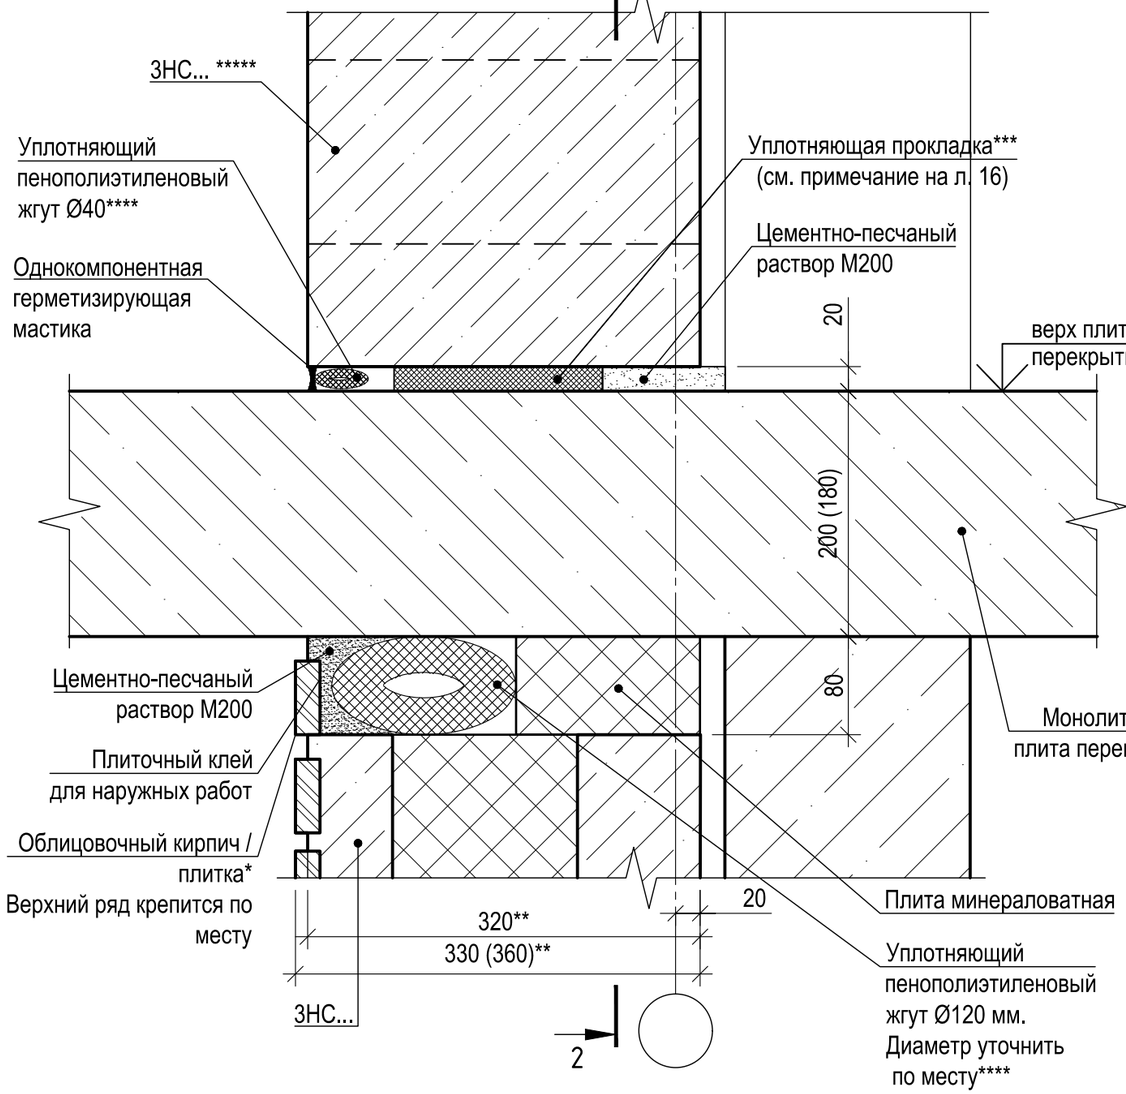

4 - 4

(сечение по нижней перемычке навесной панели)

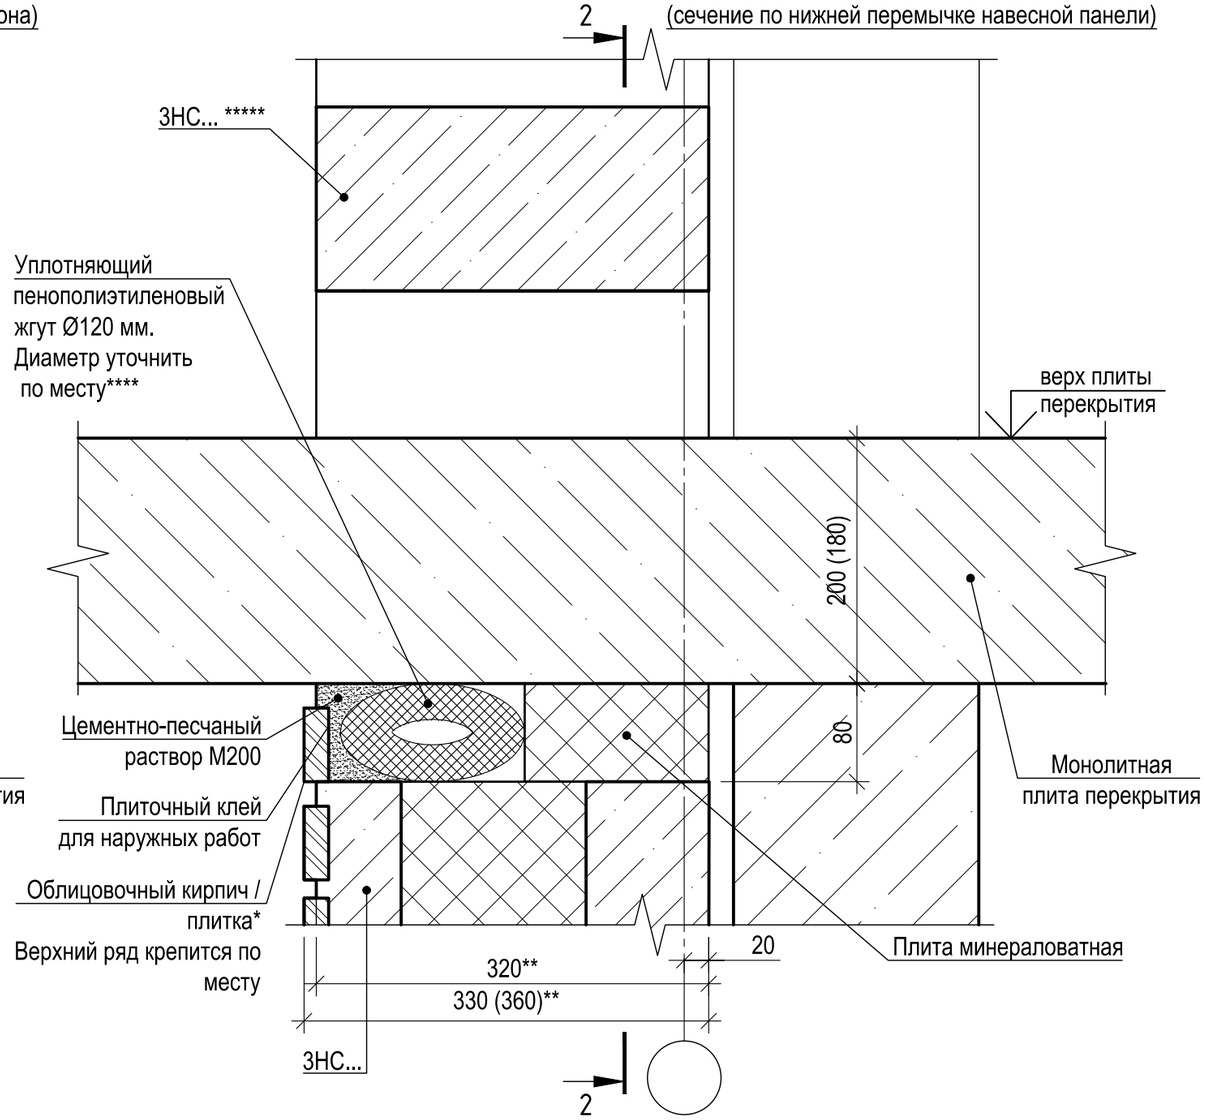

1. * - Цвет и раскладка облицовочного кирпича/плитки в соответствии с альбомом альбомом АКР.
2. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
3. Сечение 2-2 см. л. 16.
4. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
5. ***** - Нижняя перемычка в составе навесной панели переходного балкона срезается после монтажа данной панели, работы производить инструментом исключающим ударные воздействия, не допускается появление в месте среза перемычек трещин, сколов, оголения арматуры простенков панели.

Спецификация к Детали 4

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Деталь 4 (на 1 п.м шва)			
	ТУ производителя	Плита минераловатная	0,0142		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий полиэтиленовый жгут Ø40****	1,0		п.м.
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,009		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий полиэтиленовый жгут Ø70****	0,44		п.м.
	ТУ производителя	Уплотняющий полиэтиленовый жгут Ø120****	1,0		п.м.
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,0005		м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Деталь 4 (установка навесной панели переходного балкона) (начало)

МФС | Генеральный Подрядчик

Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


Формат А3

2 - 2


(узел заделки стыка на торце плиты переходного балкона)

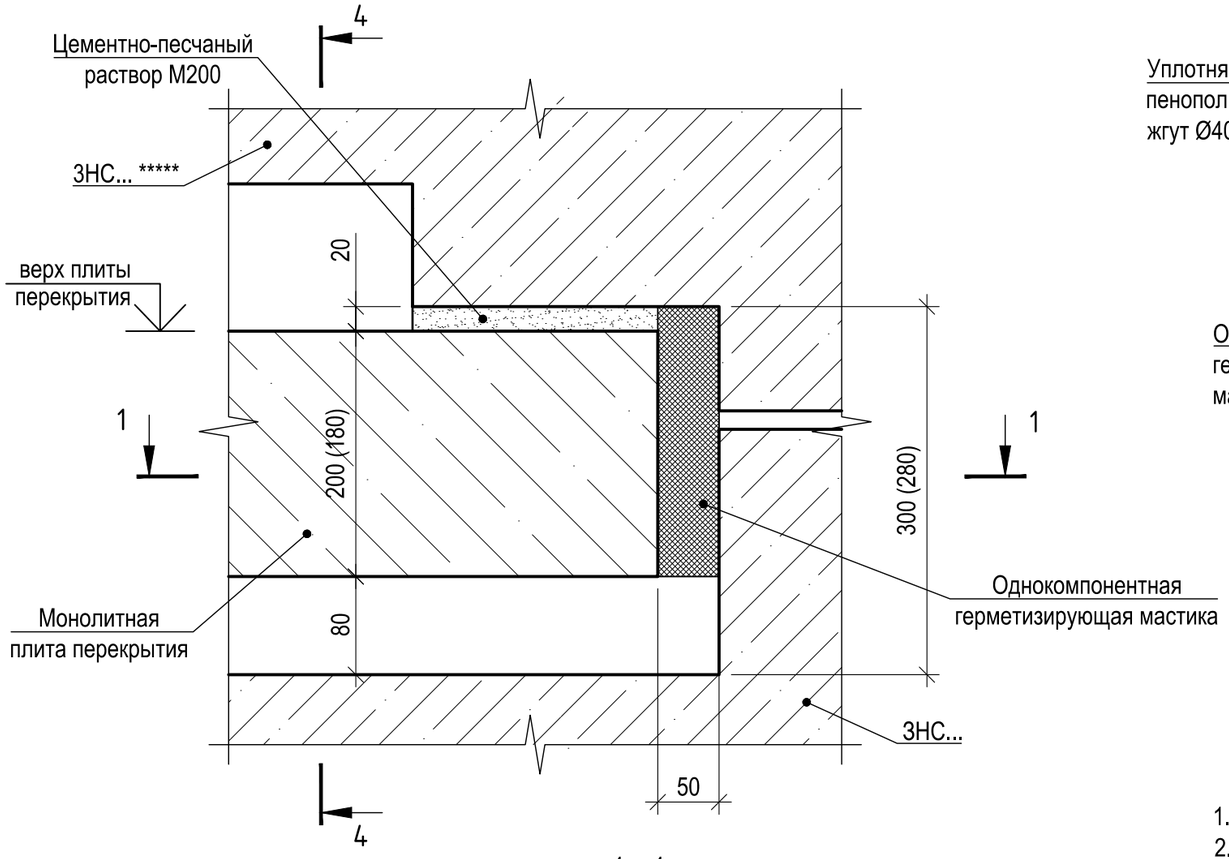

1 - 1

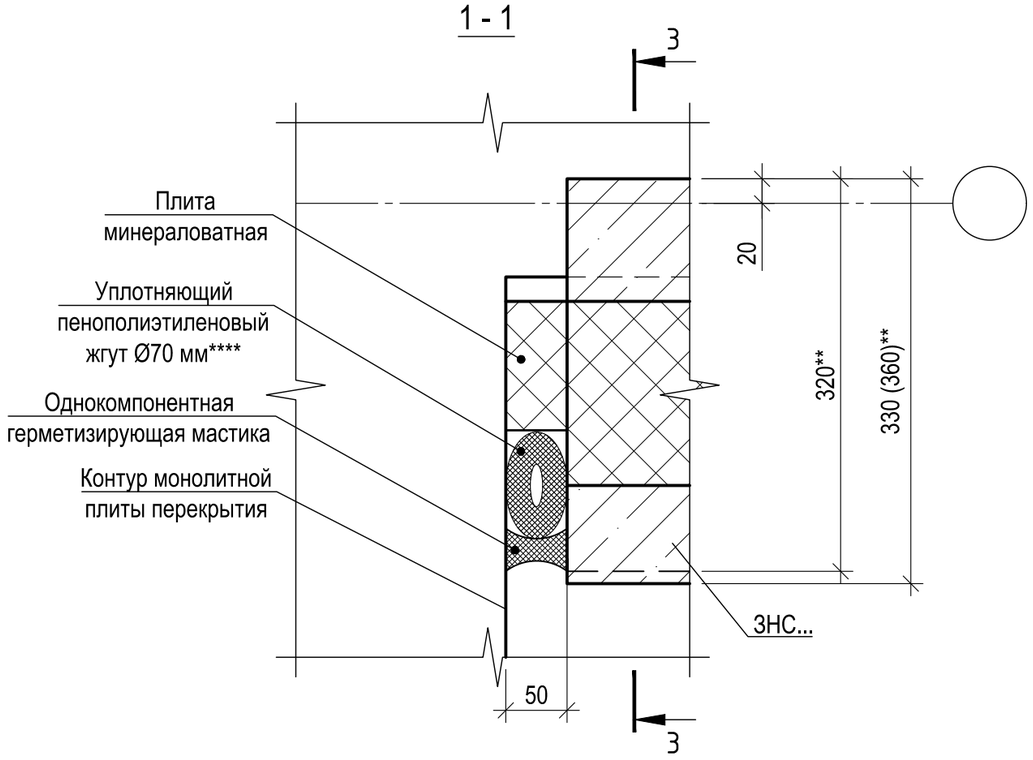

3 - 3

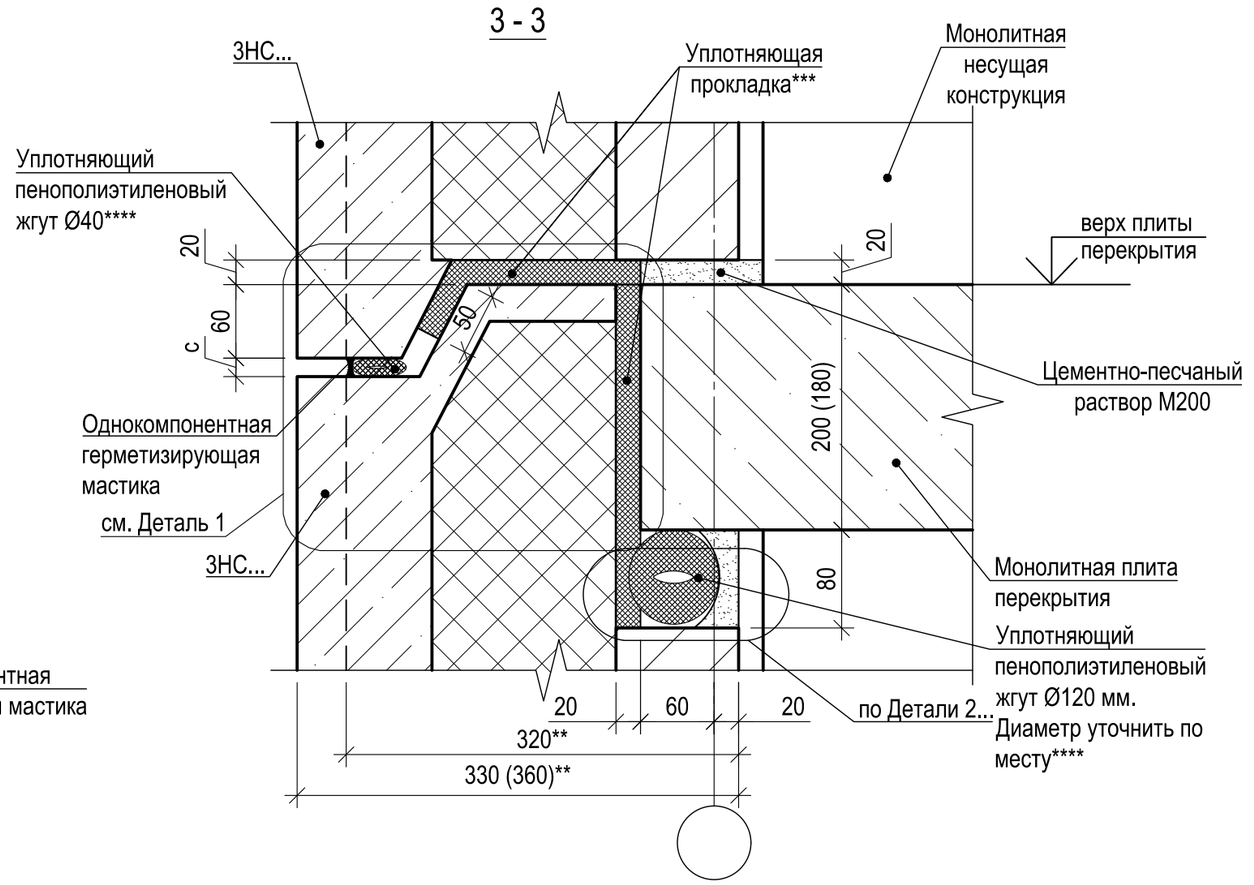

1. Величину толщины горизонтального (с) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
2. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
3. *** - Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2. Упругие прокладки должны быть применены по всей длине сопряжения смежных наружных панелей, включая угловые области для панелей с угловыми поворотами. Для обеспечения заполнения горизонтального стыка панелей уплотняющей прокладкой ввиду особенностей монтажа навесной панели переходного балкона выполняется дополнительное заведение прокладки на 50 мм на наклонную поверхность верхнего зуба панели с креплением к бетонной поверхности по п. 17 Общих указаний на л. 2.
4. Крепление прокладок осуществляется в соответствии с п. 17 Общих указаний на л. 2.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
6. Сечение 2-2 замаркировано на л. 15, сечение 4-4 см. л. 15.
7. Детали 1, 2... см. л. 13.
8. ***** - Нижняя перемычка в составе навесной панели переходного балкона срезается после монтажа данной панели, работы производить инструментом исключающим ударные воздействия, не допускается появление в месте среза перемычек трещин, сколов, оголения арматуры простенков панели.

						ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом
Проверил		Мачехин			24.06.24	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Деталь 4 (установка навесной панели переходного балкона) (окончание)

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

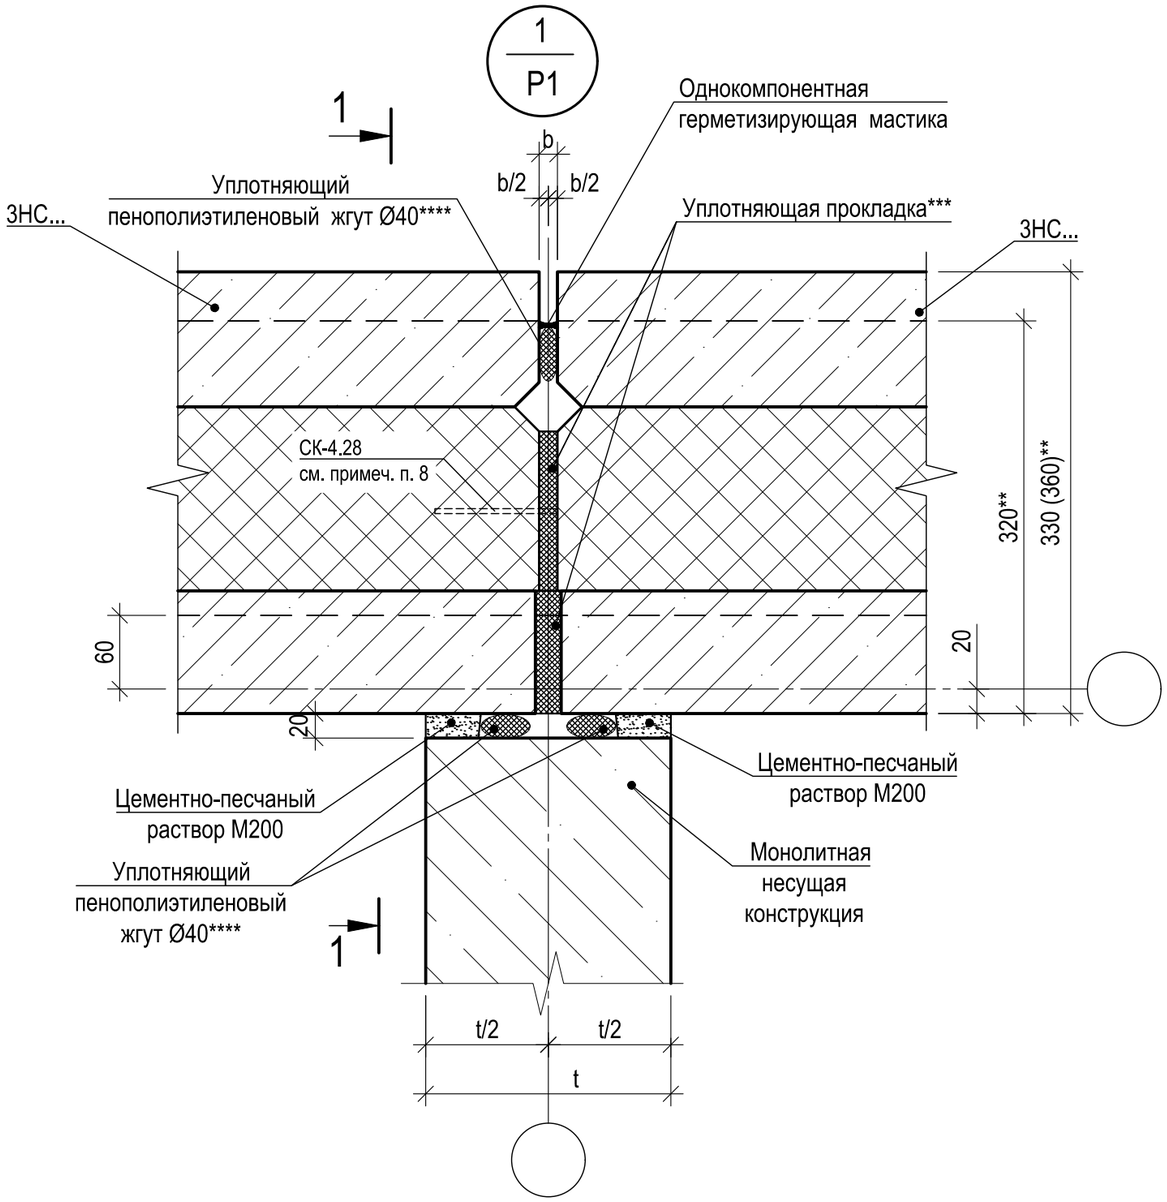

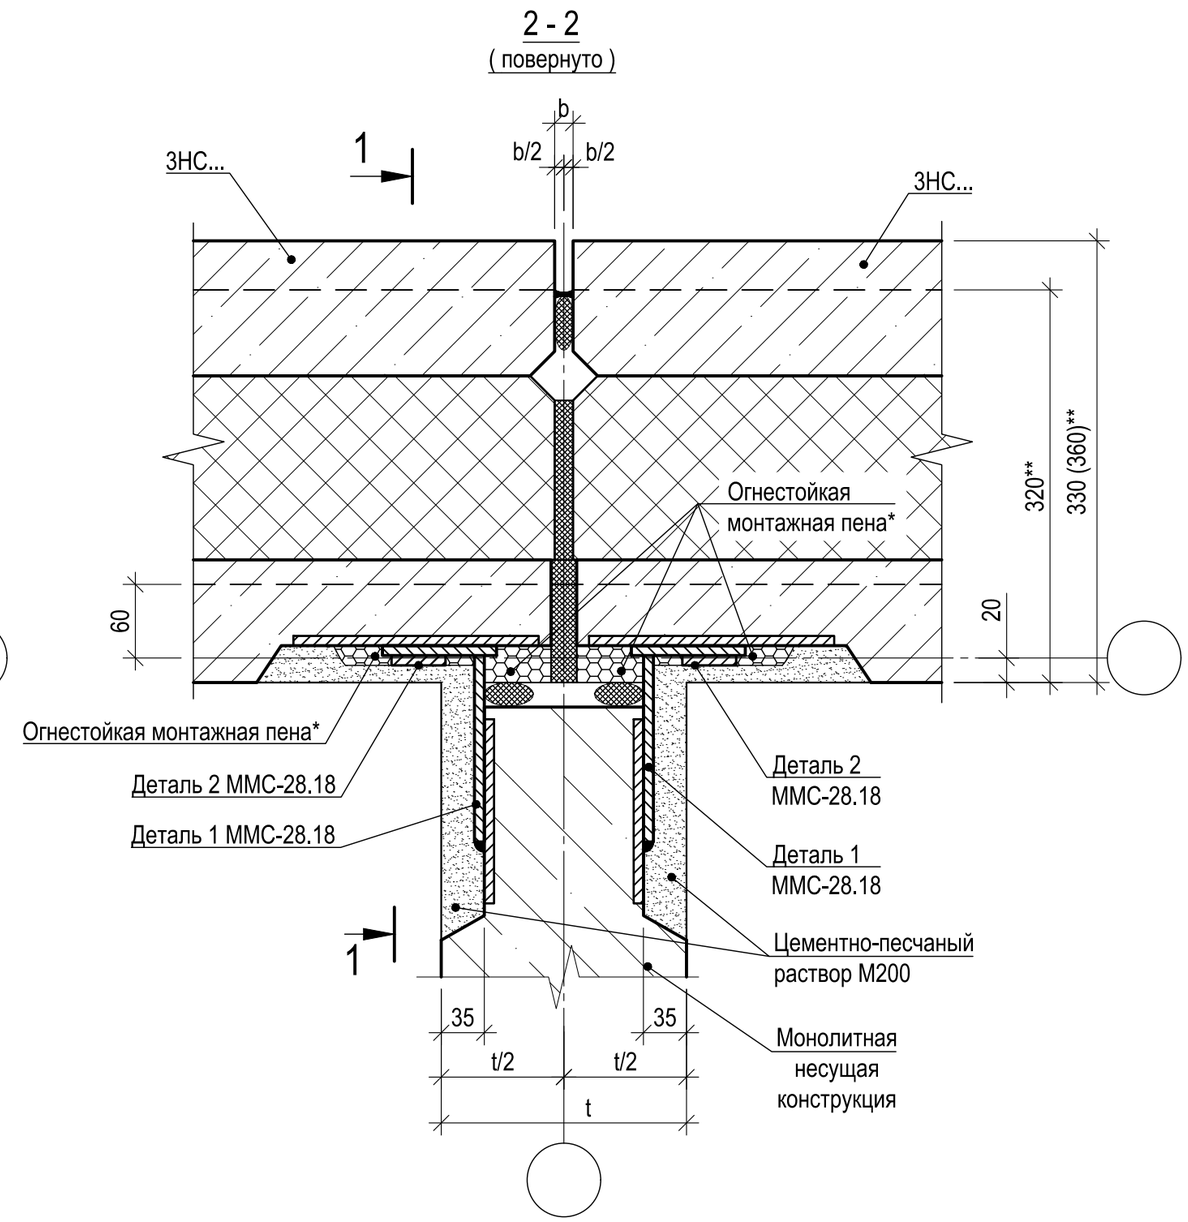

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2. Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
7. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
8. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
9. Спецификацию к узлу 1/Р1 см. л. 18.
10. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Узел 1/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3


1 - 1

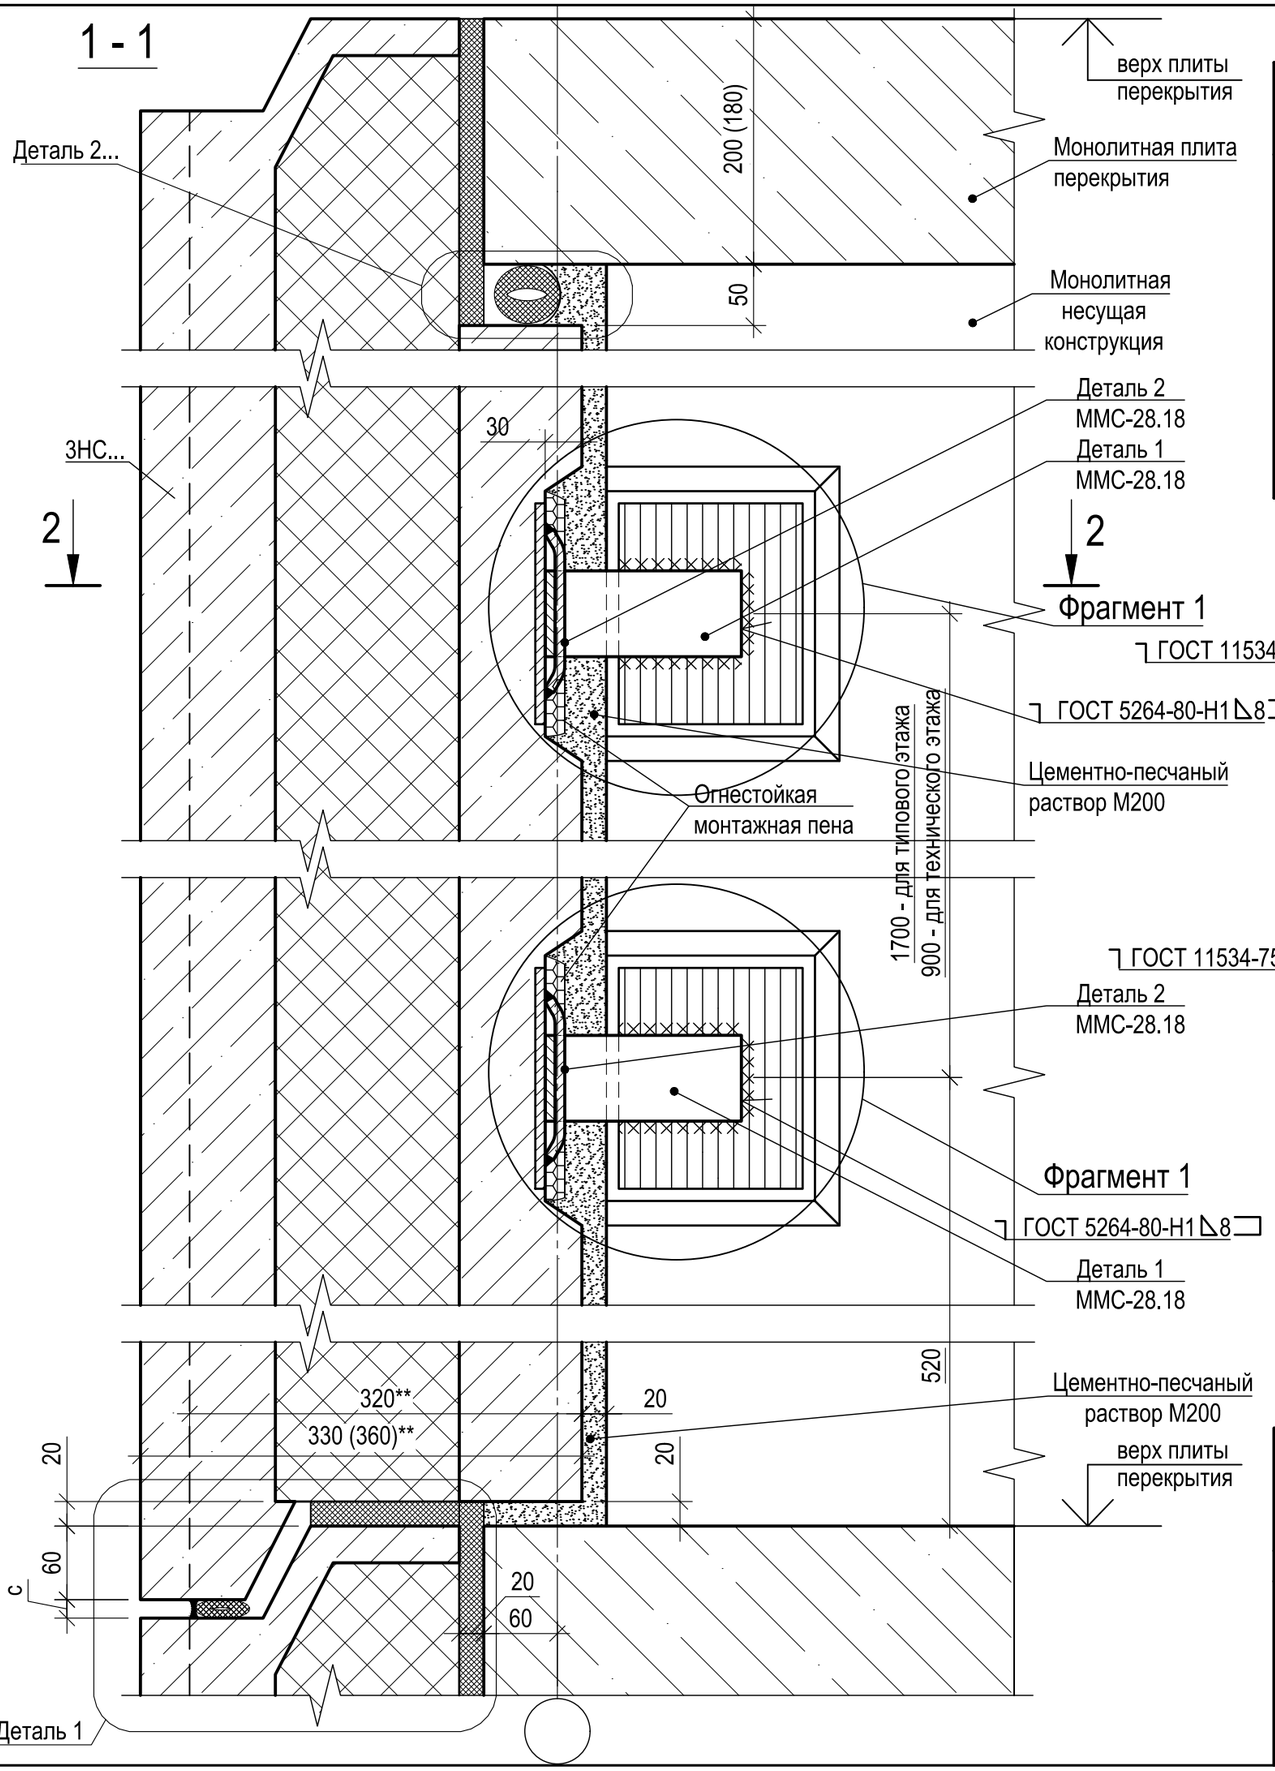


Спецификация к узлу 1/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	4	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,013		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	9,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0115		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

Фрагмент 1

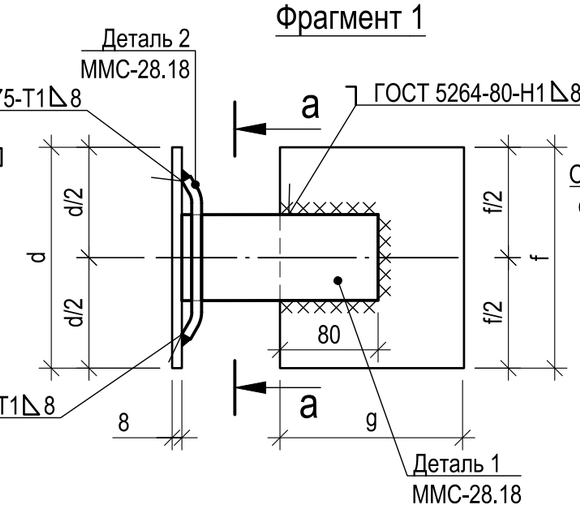

a - a

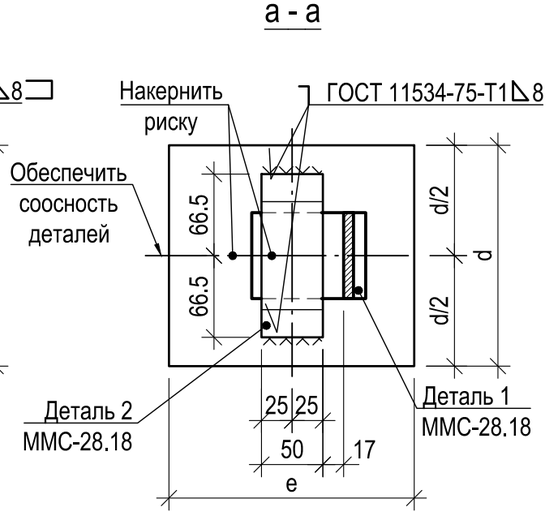

1. Сечение 2-2 к узлу 1/Р1 см. л. 17, к узлу 2/Р1 см. л. 19, к узлу 3/Р1 см. л. 20-21, к узлу 5/Р1 см. л. 24, к узлу 6/Р1 см. л. 25, к узлу 7/Р1 см. л. 28, к узлу 9/Р1 см. л. 30, к узлу 11/Р1 см. л. 34, к узлу 27/Р1 см. л. 54.
2. Сечение 1-1 замаркировано на л. 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 54.
3. Детали 1, 2... см. л. 13.
4. Примечание к узлу 1/Р1 см. л. 17, к узлу 2/Р1 см. л. 19, к узлу 3/Р1 см. л. 20, к узлу 5/Р1 см. л. 24, к узлу 6/Р1 см. л. 25, к узлу 7/Р1 см. л. 28, к узлу 9/Р1 см. л. 30, к узлу 11/Р1 см. л. 34, к узлу 27/Р1 см. л. 54.
5. Высота пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 180 мм, ширина пластины закладной детали в наружной панели (e) не менее 200 мм.
6. Высота пластины закладной детали в монолитной конструкции (f) не менее 190 мм, ширина пластины закладной детали в монолитной конструкции (g) не менее 180 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Сечение 1-1 к узлам 1/Р1, 2/Р1, 3/Р1, 5/Р1, 6/Р1, 7/Р1, 9/Р1, 11/Р1, 27/Р.

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

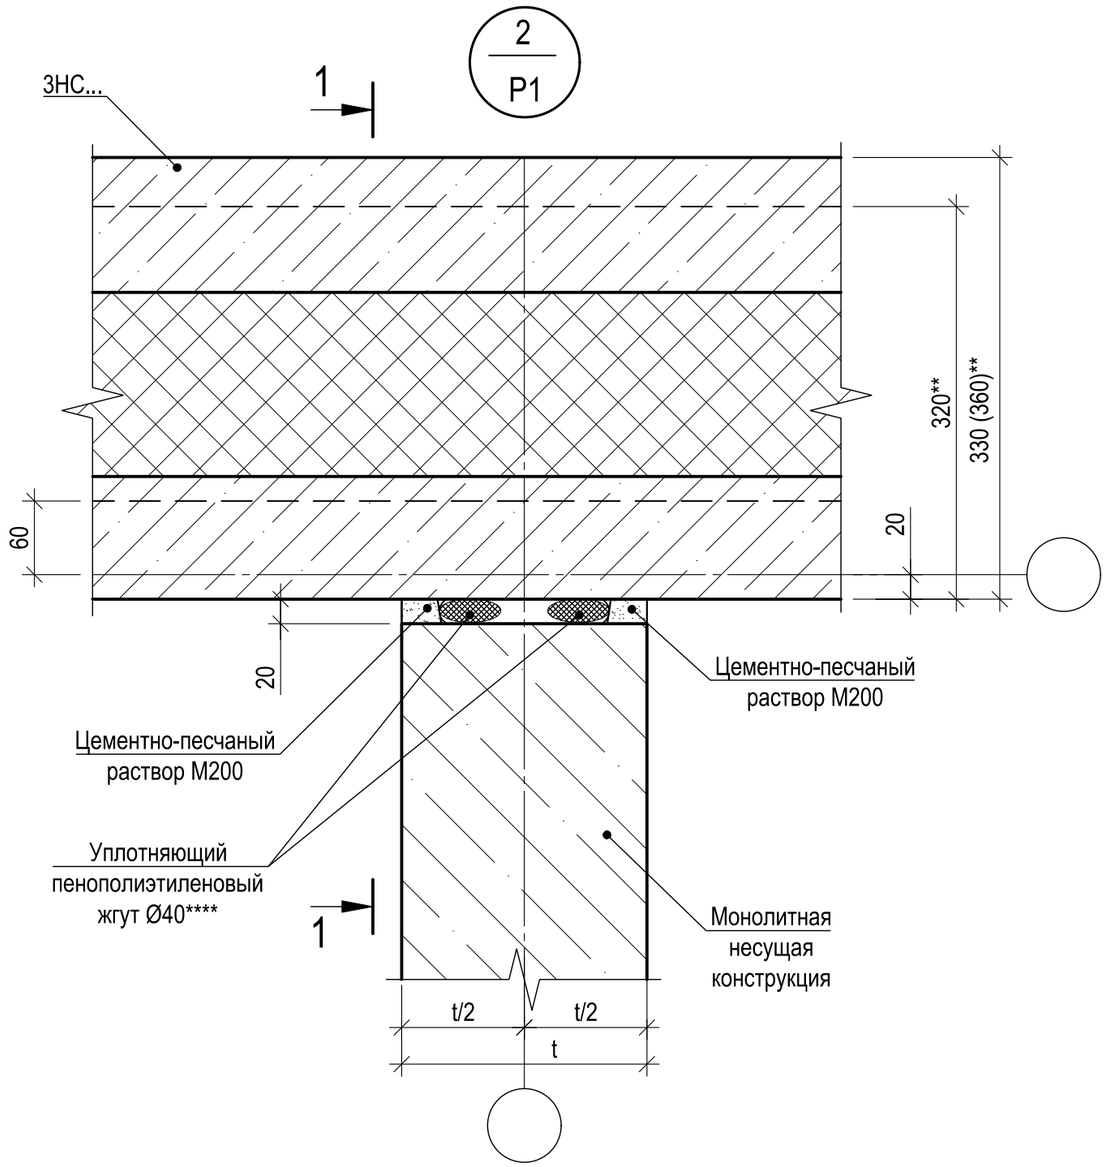

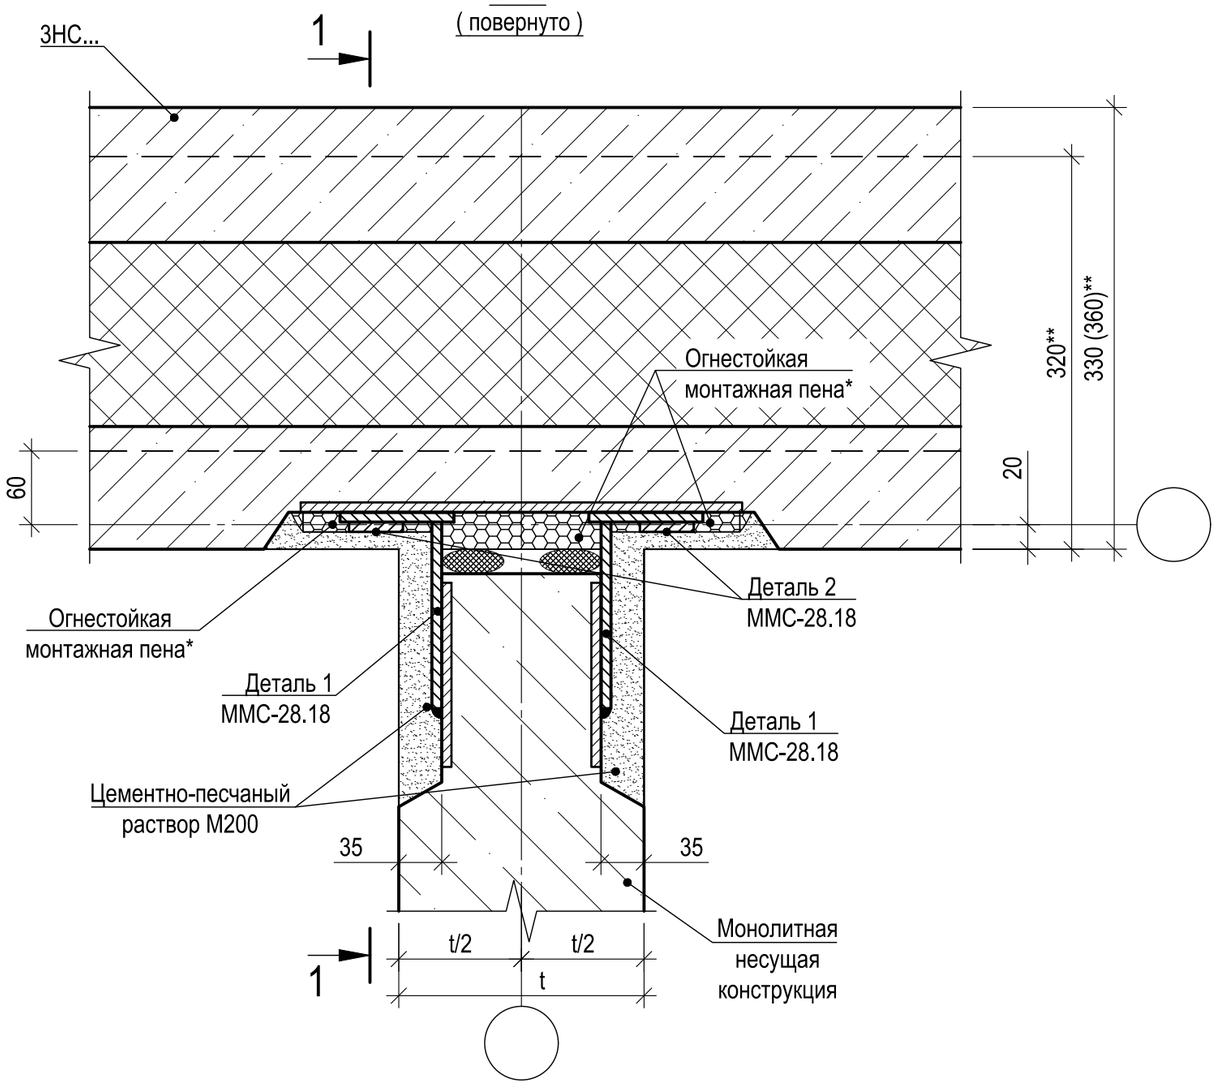

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
3. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
4. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
6. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.

Спецификация к узлу 2/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	4	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,013		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	6,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	19	
Узел 2/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

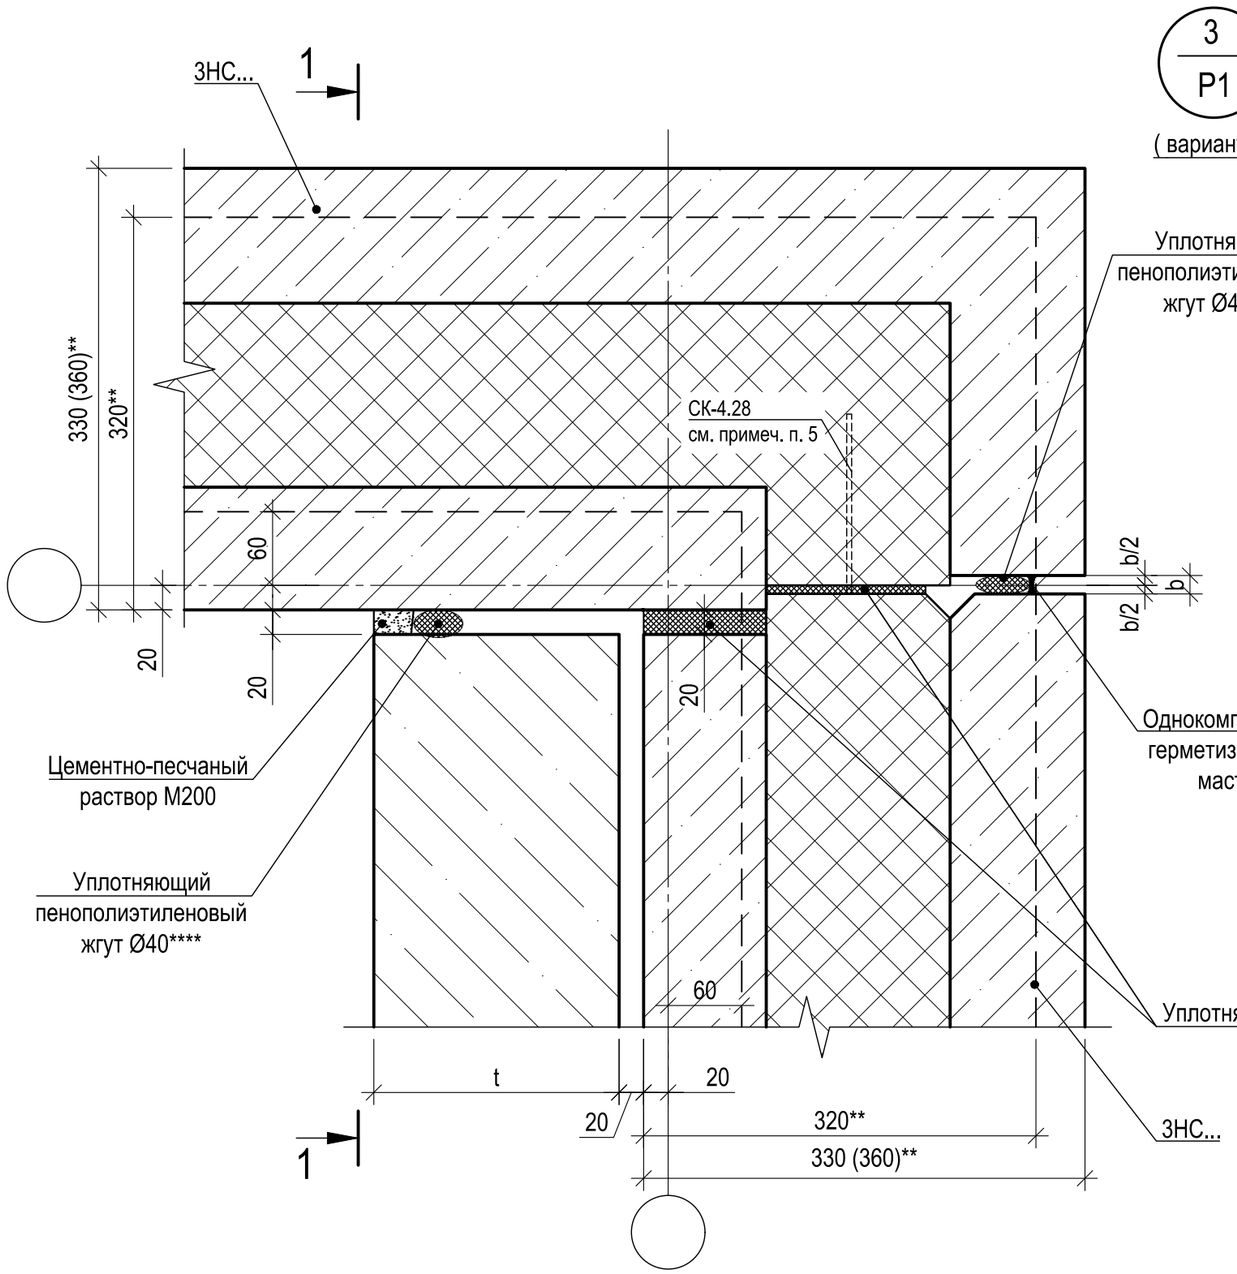

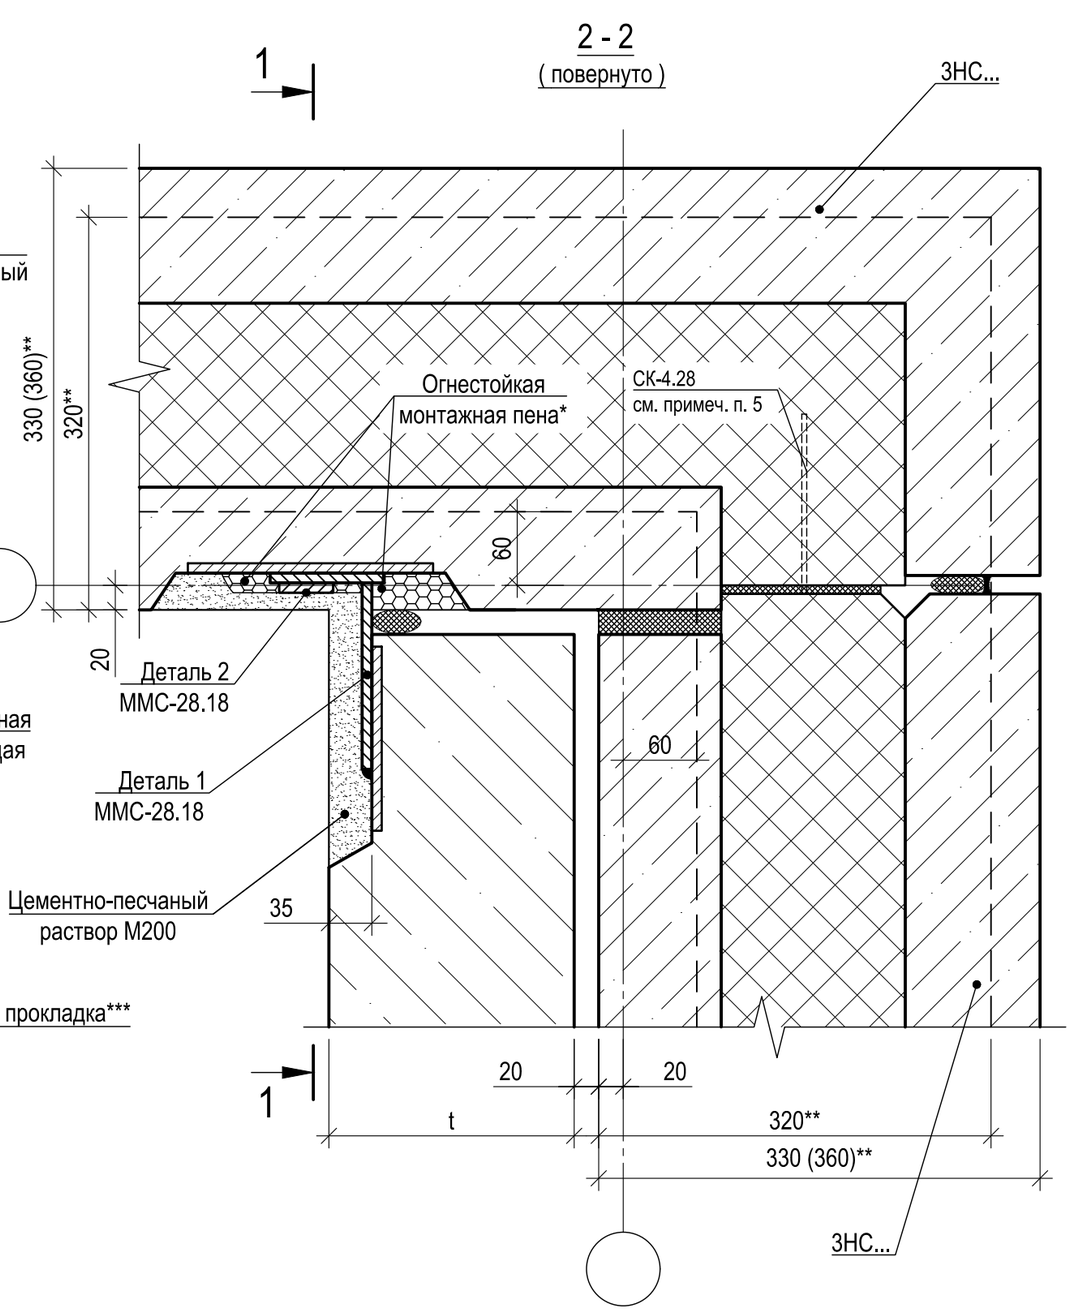

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
5. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
6. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
7. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
8. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2. Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
9. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
10. Спецификацию к узлу 3/Р1 см. л. 21.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	20	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 3/Р1 (вариант 1)	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Формат А3

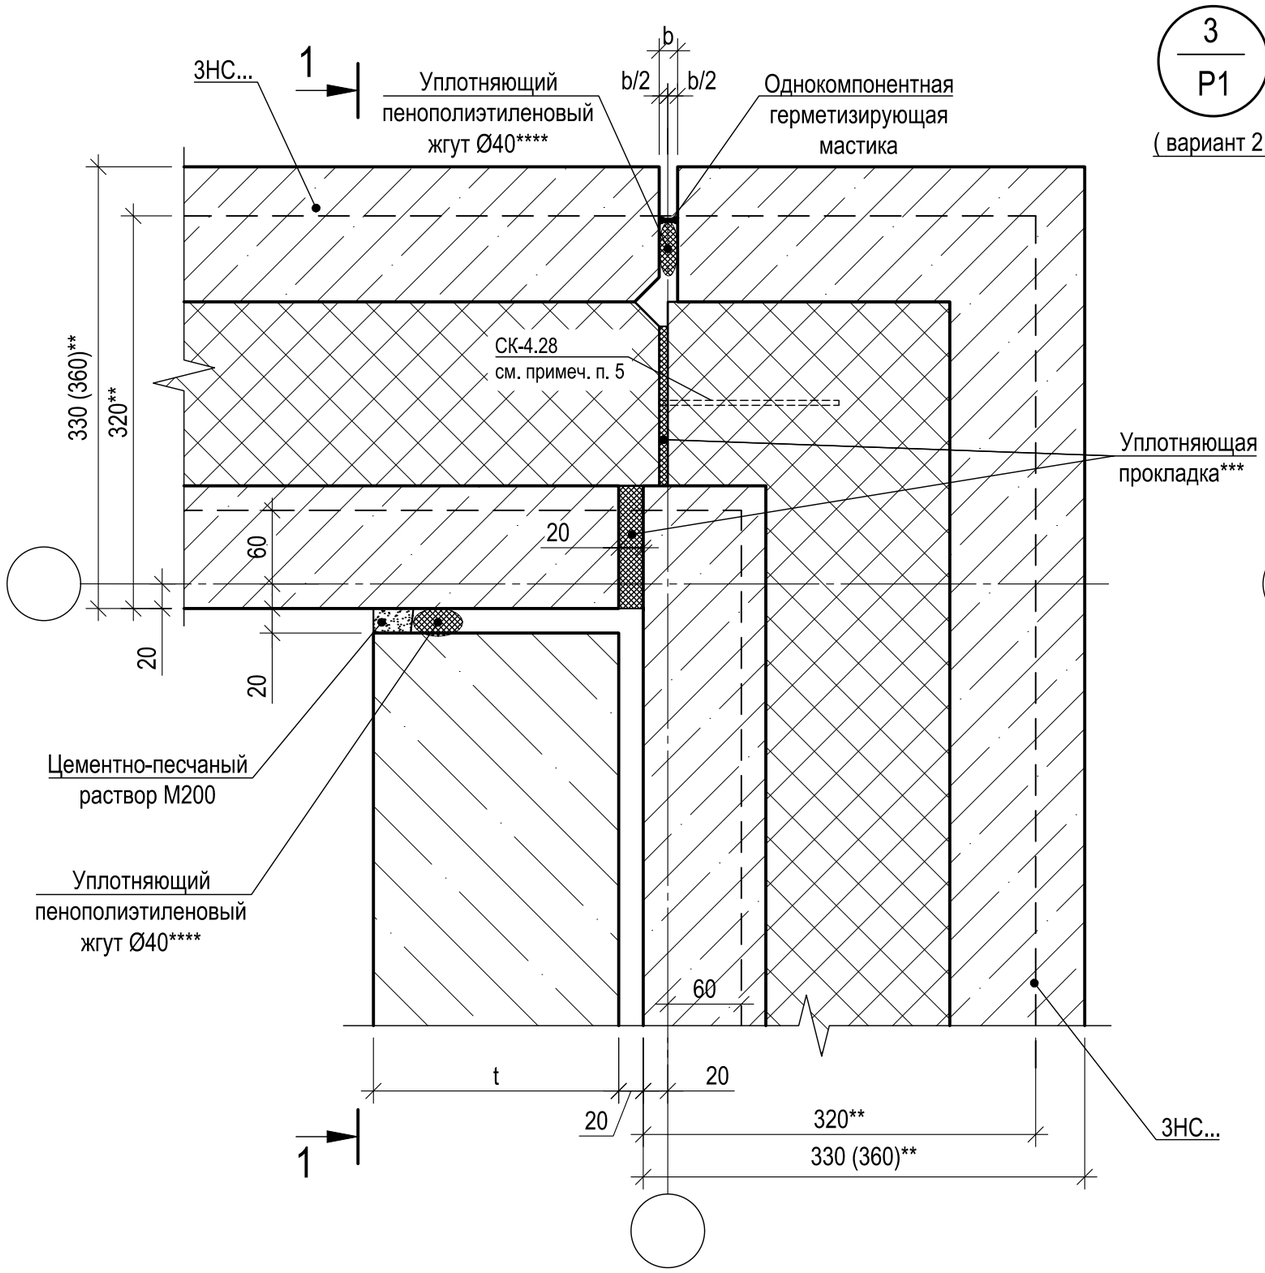

3 / Р1

(вариант 2)

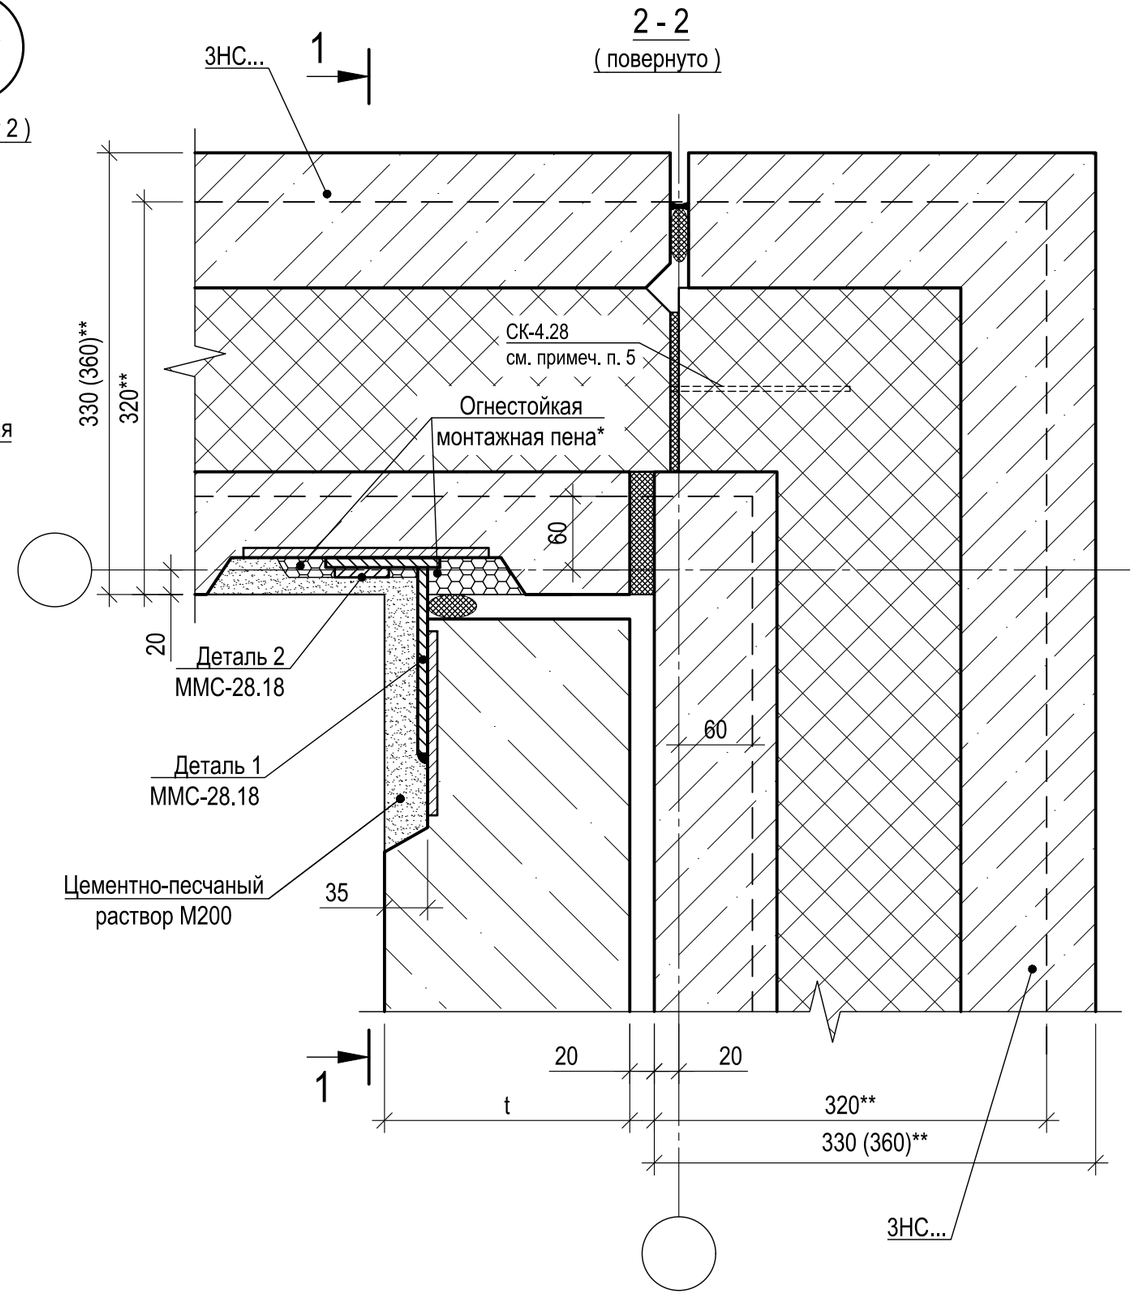

Спецификация к узлу 3/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	6,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0112		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

1. Примечание к узлу 3/Р1 см. лист 20.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	21	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 3/Р1 (вариант 2)	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

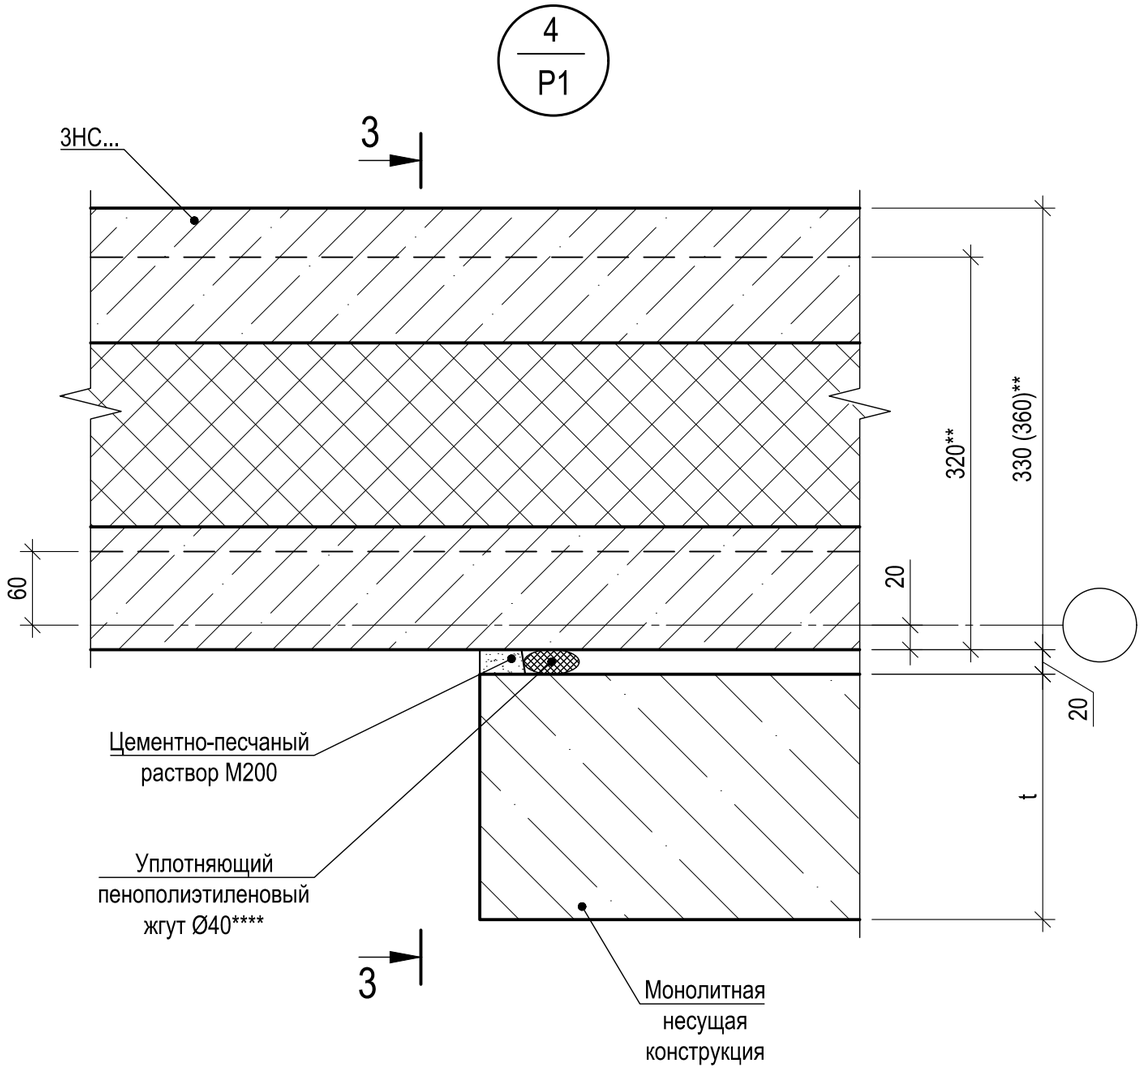

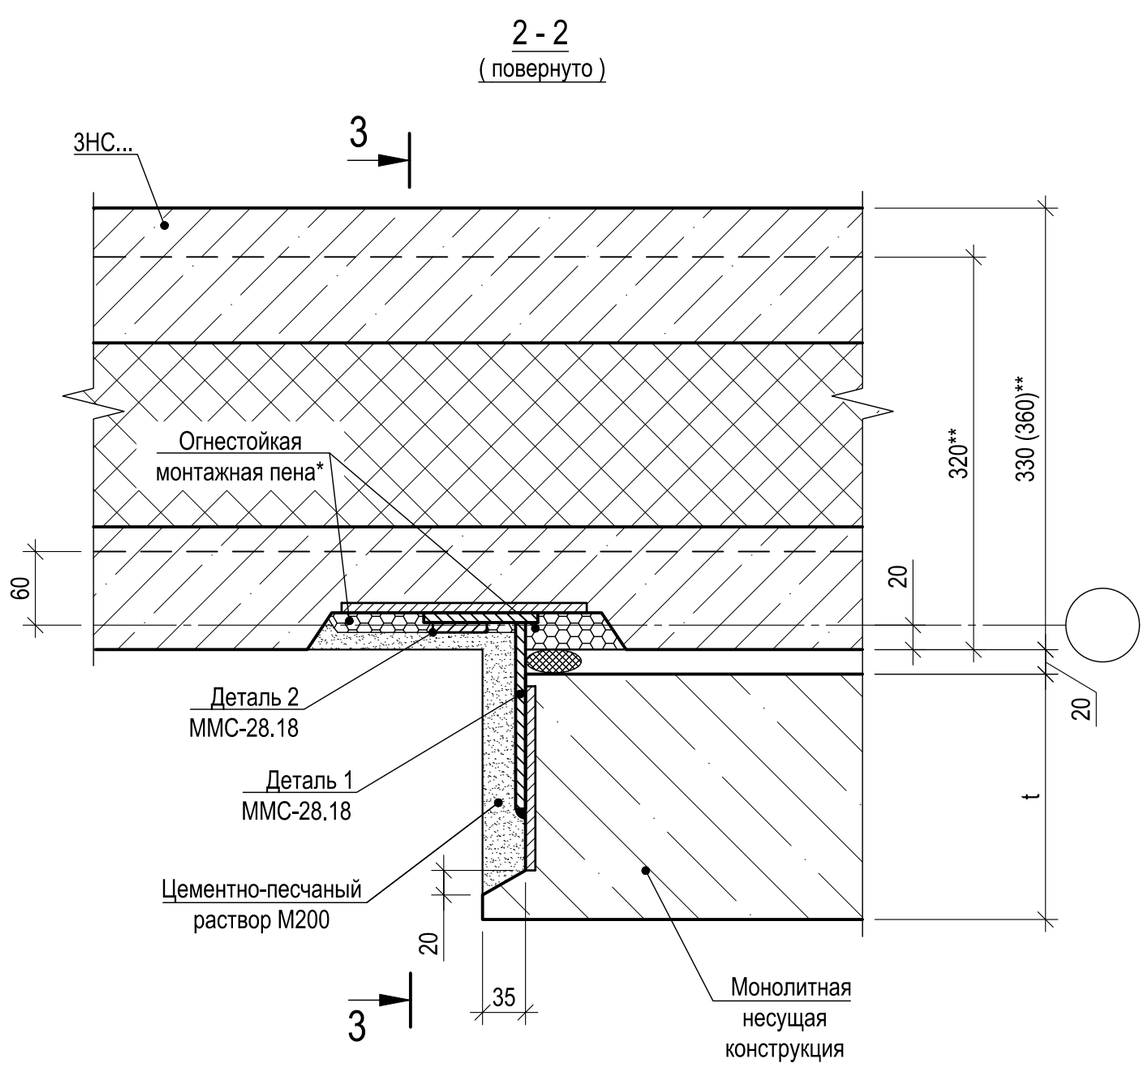

1. Сечение 3-3 см. л. 23, сечение 2-2 замаркировано на л. 23.
2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
3. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8. В случае примыкания панели к наружной стене холодной лоджии, вместо цементно-печаного раствора необходимо применять герметик.
4. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
6. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
7. Спецификацию к узлу 4/P1 см. л. 23.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	22	
Узел 4/P1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

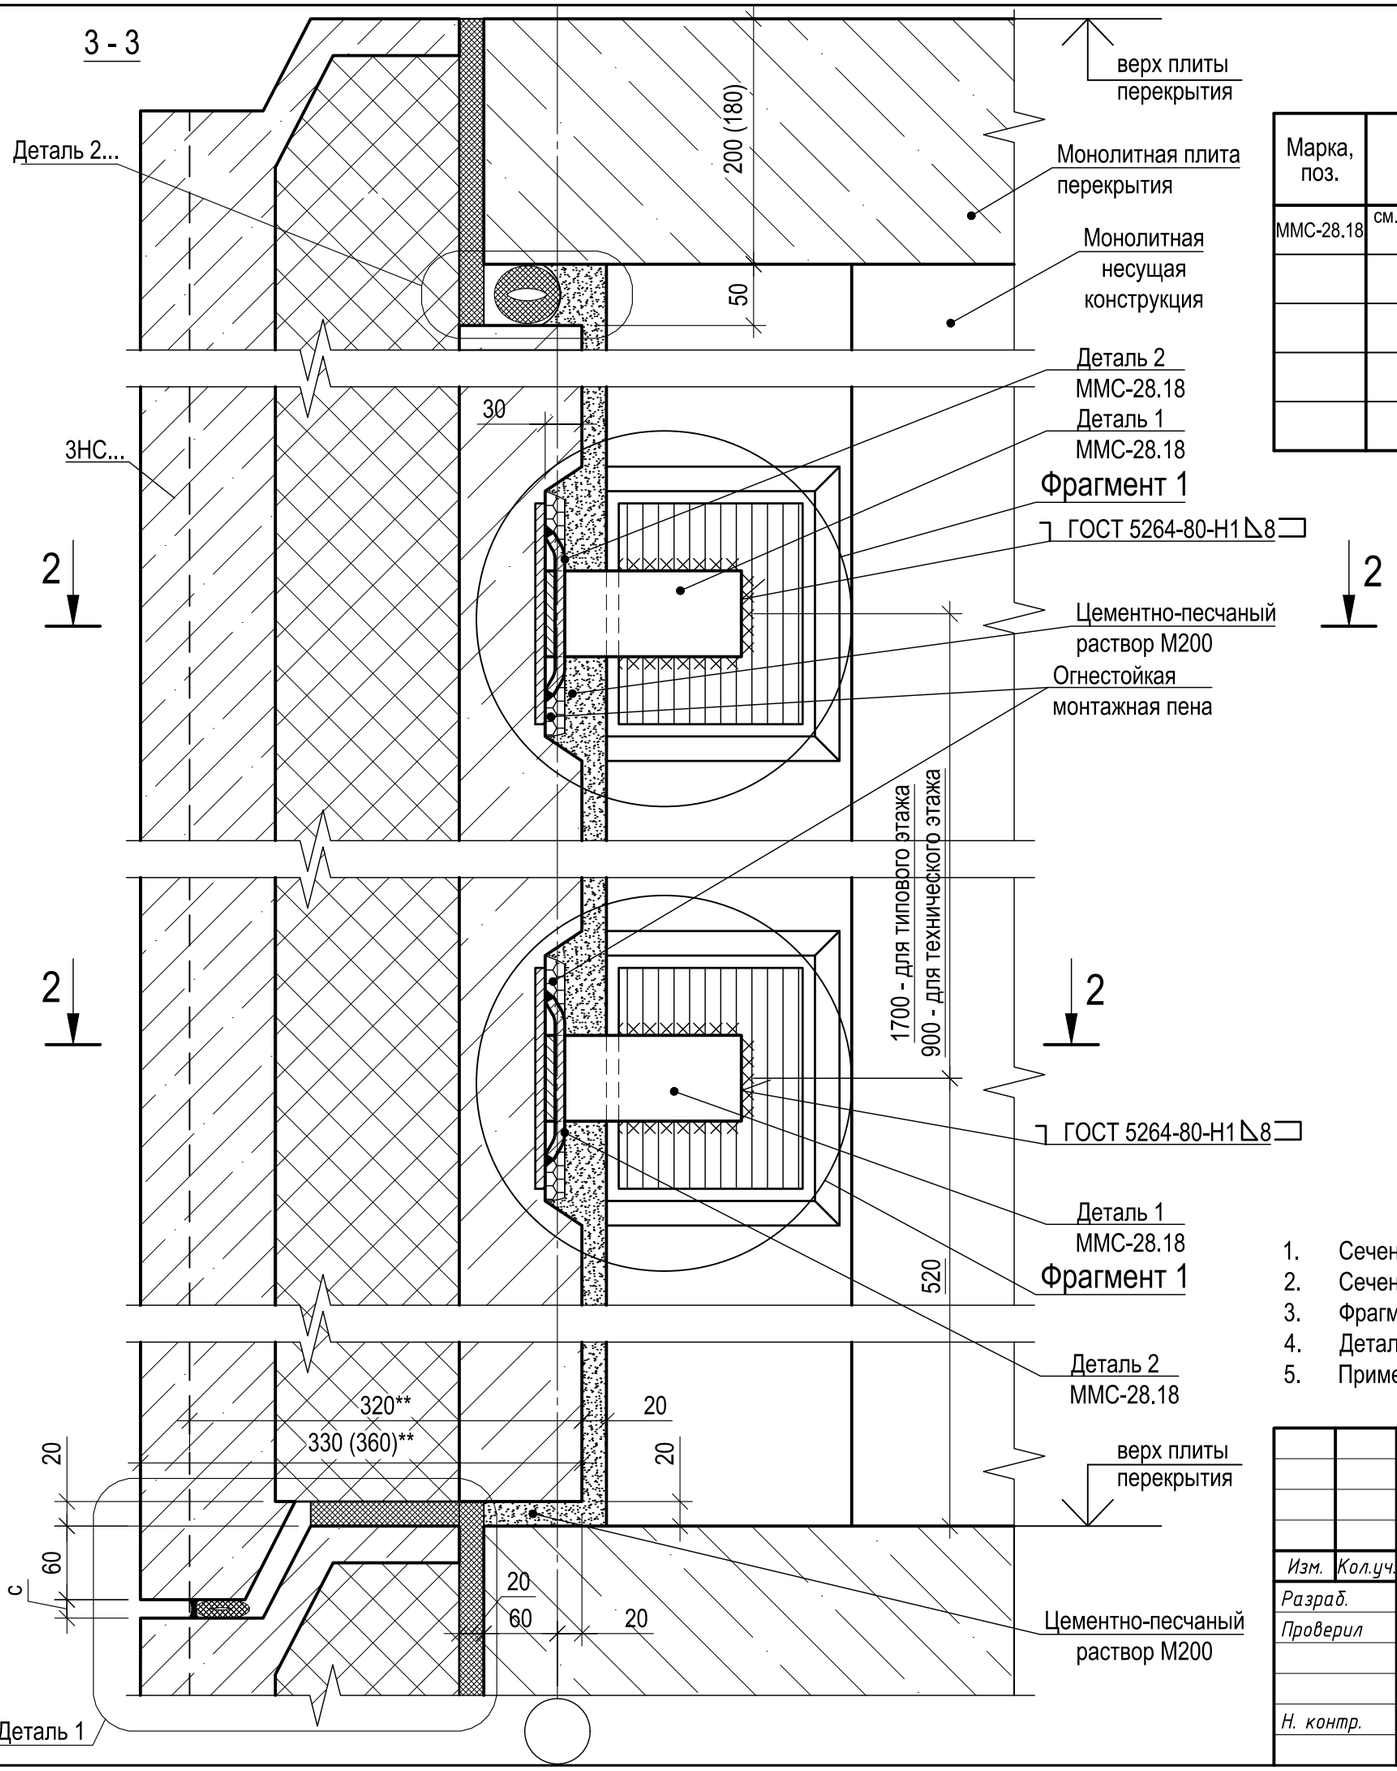

Спецификация к узлу 4/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	3,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))

1. Сечение 2-2 к узлу 4/Р1 см. л. 22.
2. Сечение 3-3 замаркировано на л. 22, 52.
3. Фрагмент 1 см. л. 18.
4. Детали 1, 2... см. л. 13.
5. Примечание к узлу 4/Р1 см. л. 22, к узлу 26/Р1 см. л. 52.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Сечение 3-3 к узлам 4/Р1, 26/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

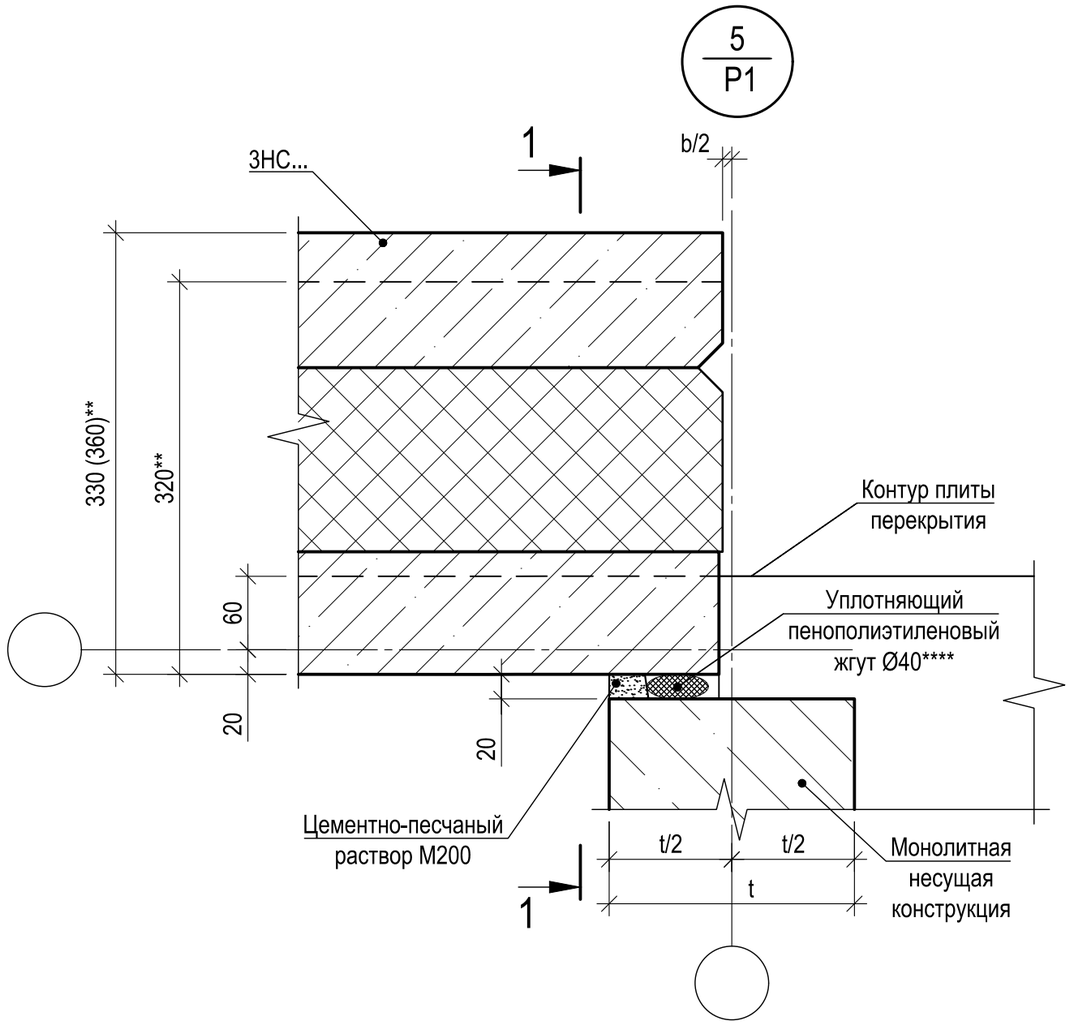

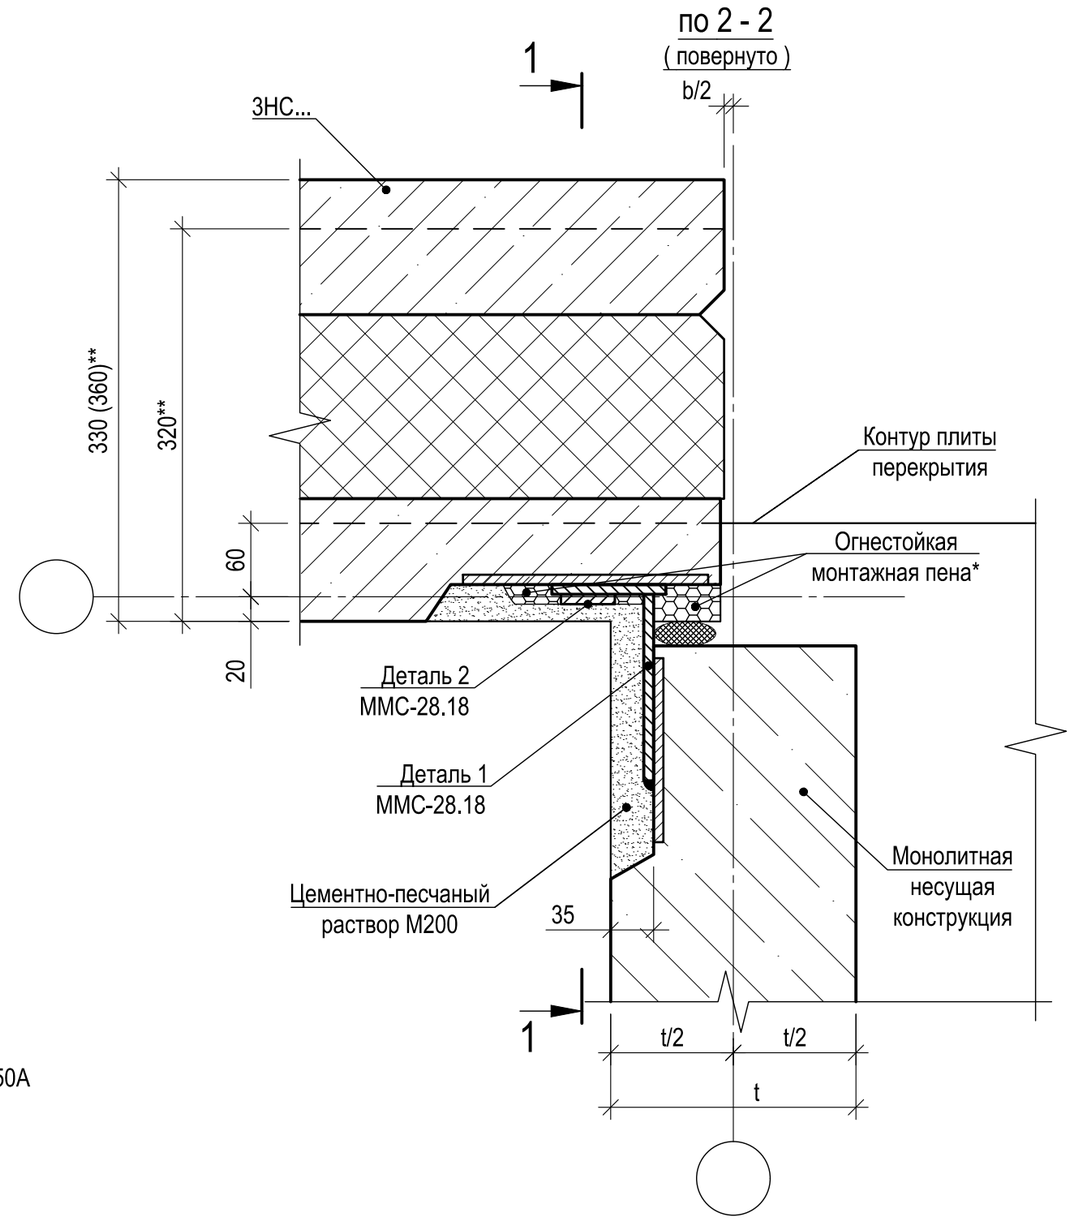

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
7. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.

Спецификация к узлу 5/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	3,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

Узел 5/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


ВЗам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

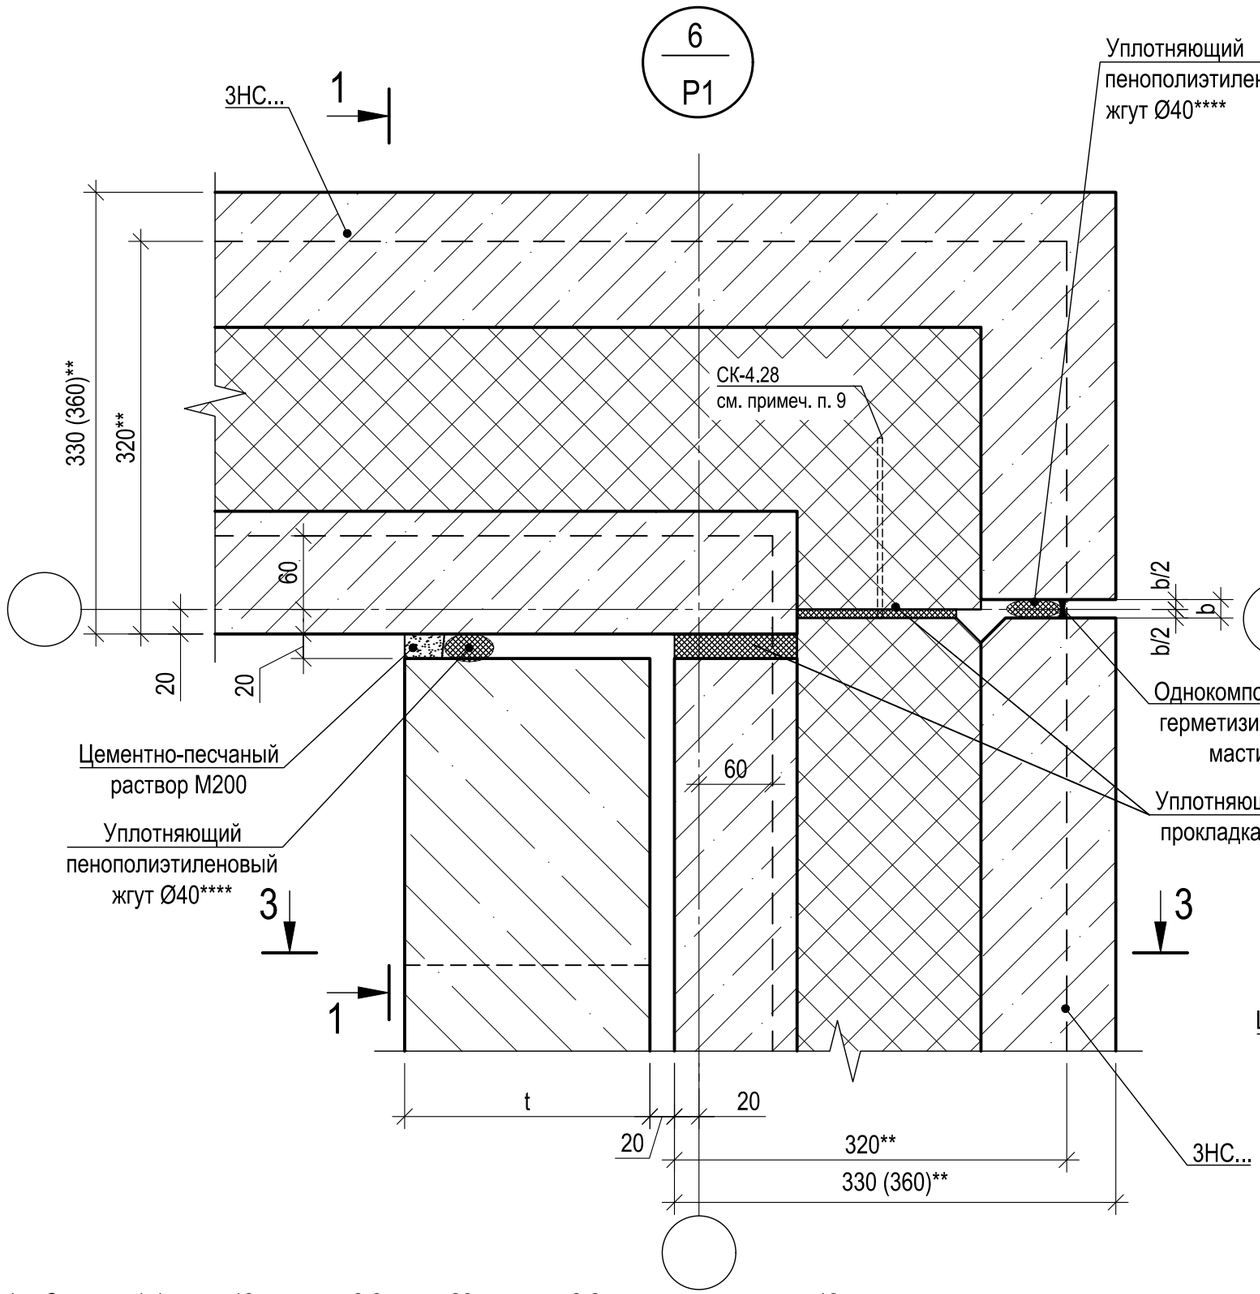

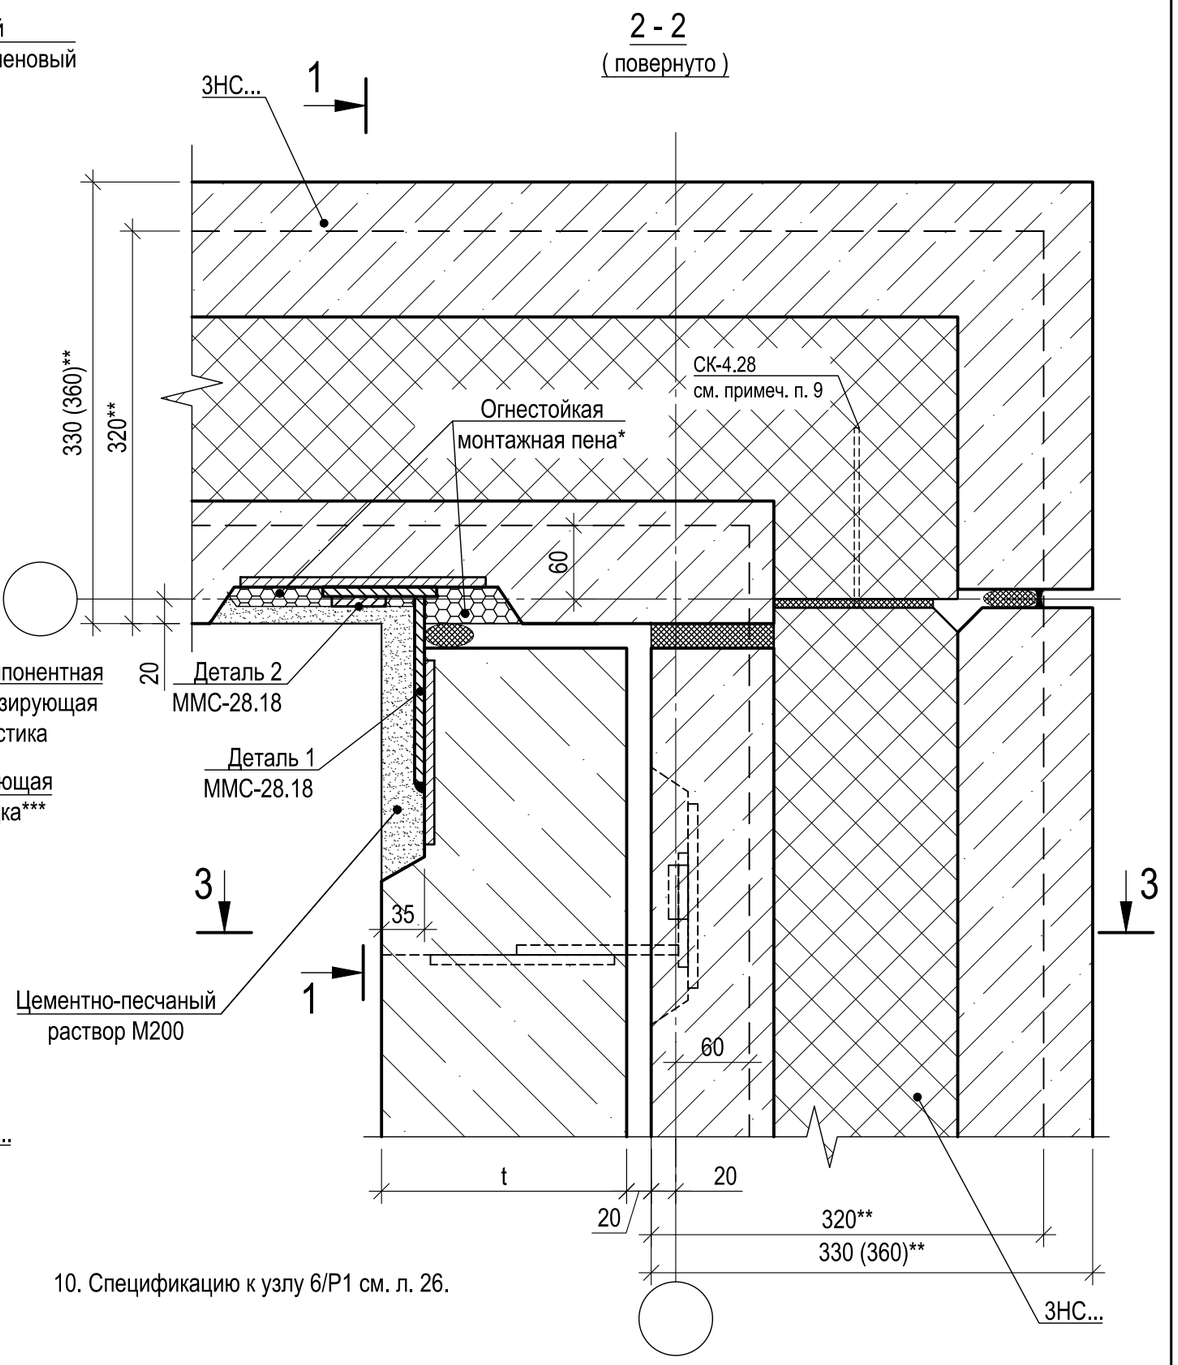

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 3-3 см. л. 26, сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2. Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
7. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
10. Спецификацию к узлу 6/Р1 см. л. 26.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

Узел 6/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

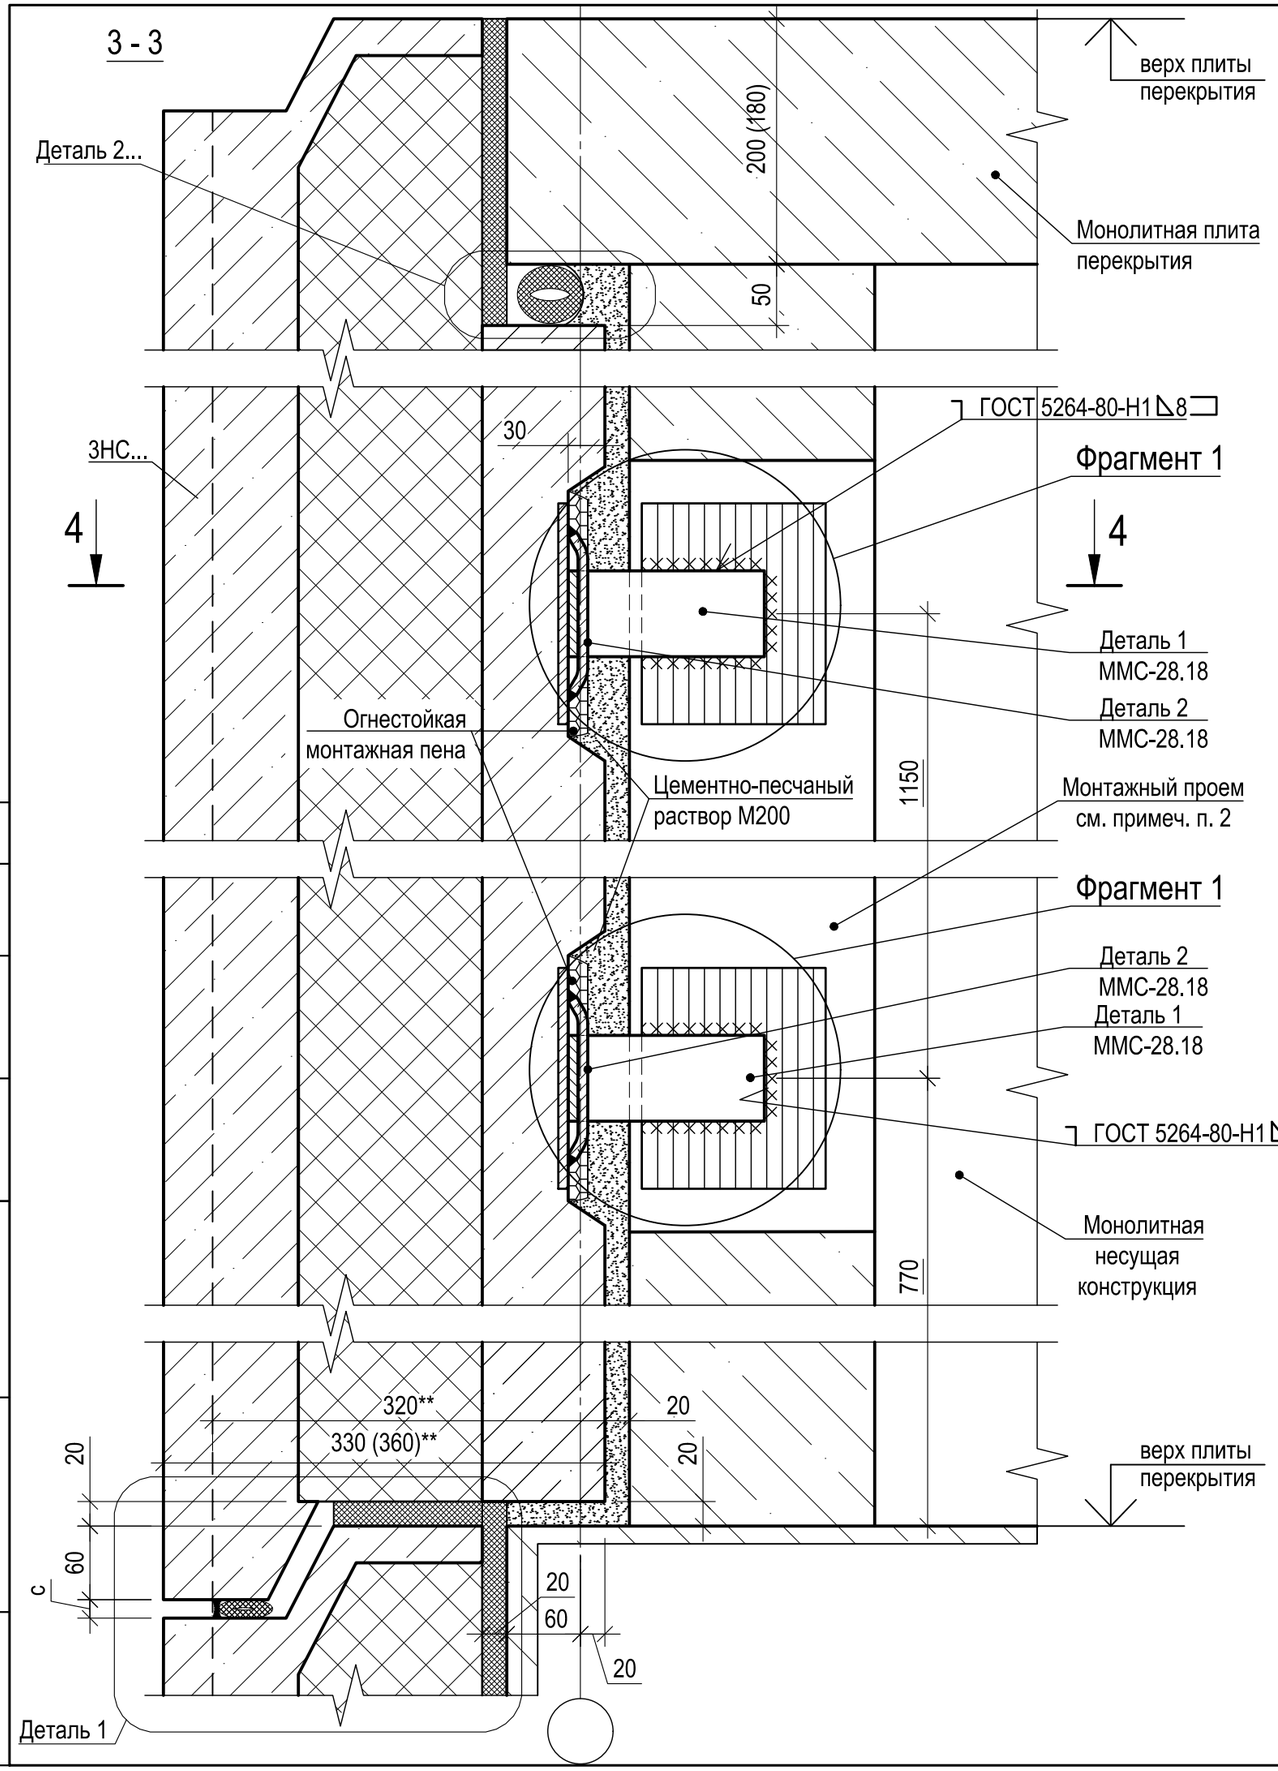

Спецификация к узлам 6/Р1, 7/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	4	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,007		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	6,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0112		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

1. Фрагмент 1 см. л. 18, сечение 3-3 замаркировано на л. 25, сечение 4-4 см. л. 27.
2. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0.09 м³.
3. Примечание к узлу 6/Р1 см. л. 25.
4. Детали 1, 2... см. л. 13.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Сечение 3-3 к узлу 6/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

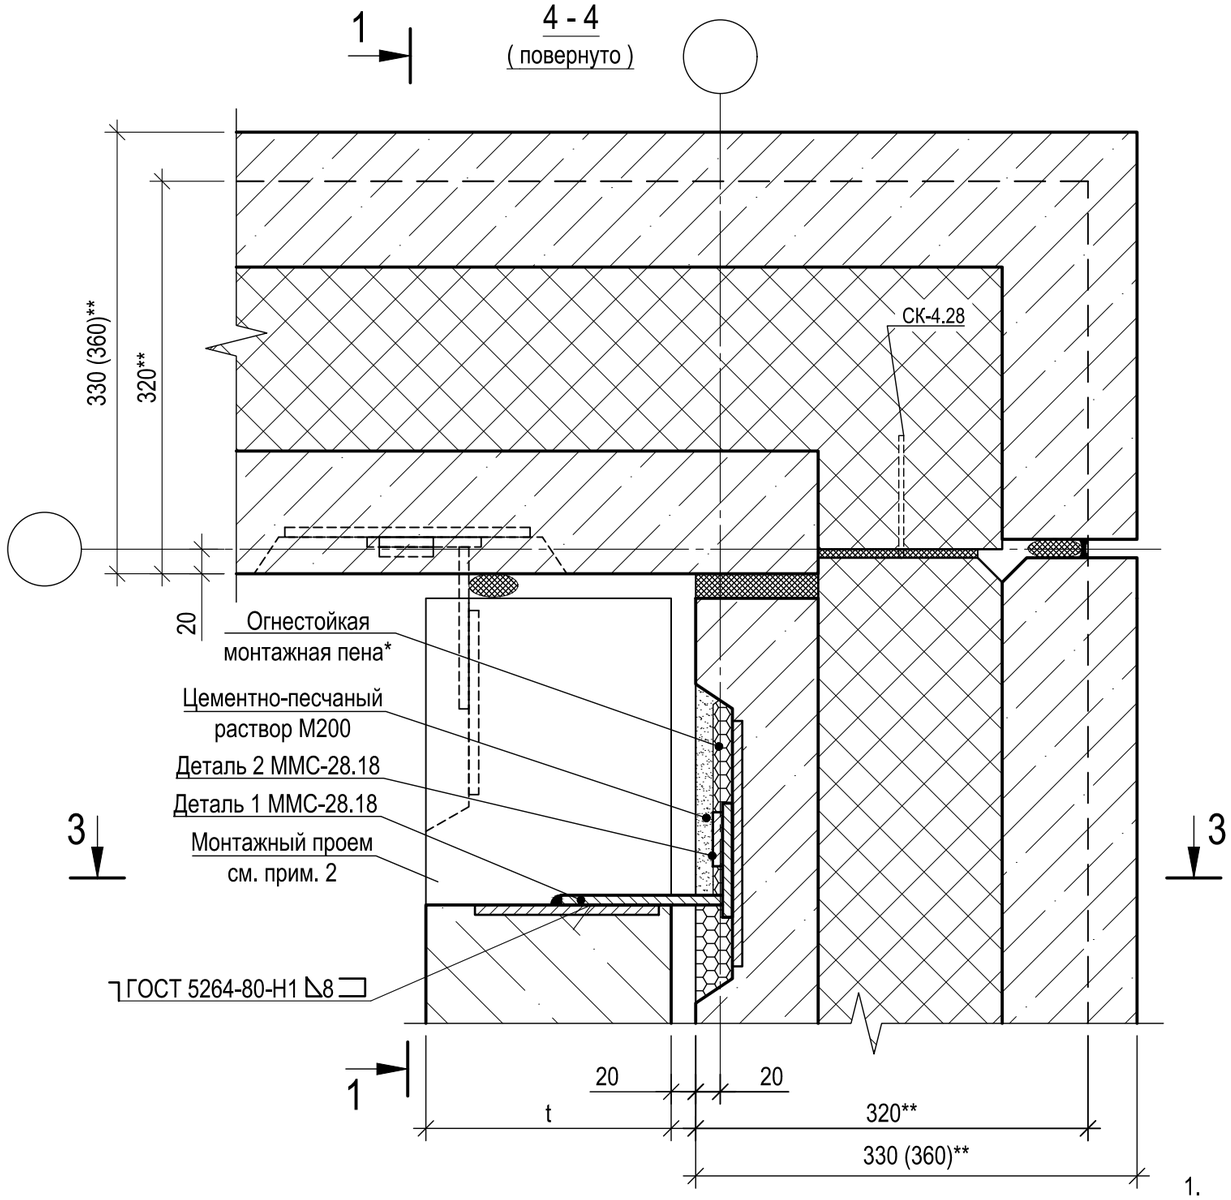



1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 3-3 см. л. 26, сечение 4-4 замаркировано на л. 26.
2. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0.09 м^3.
3. Примечания к узлу 6/Р1 см. л. 25.
4. Спецификацию к узлу 6/Р1 см. л. 26.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	27	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Сечение 4-4 к узлу 6/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3

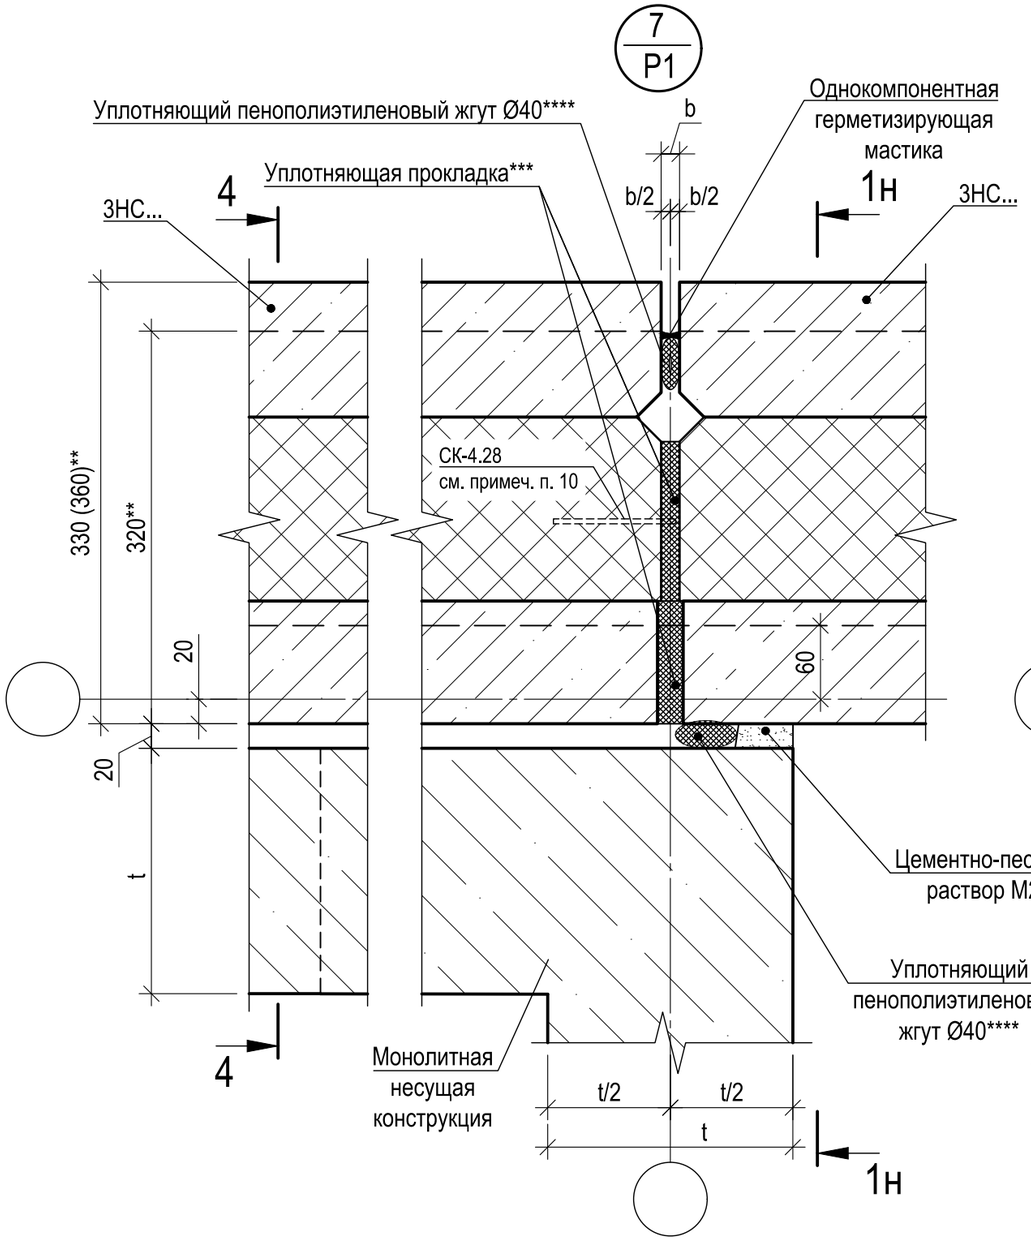

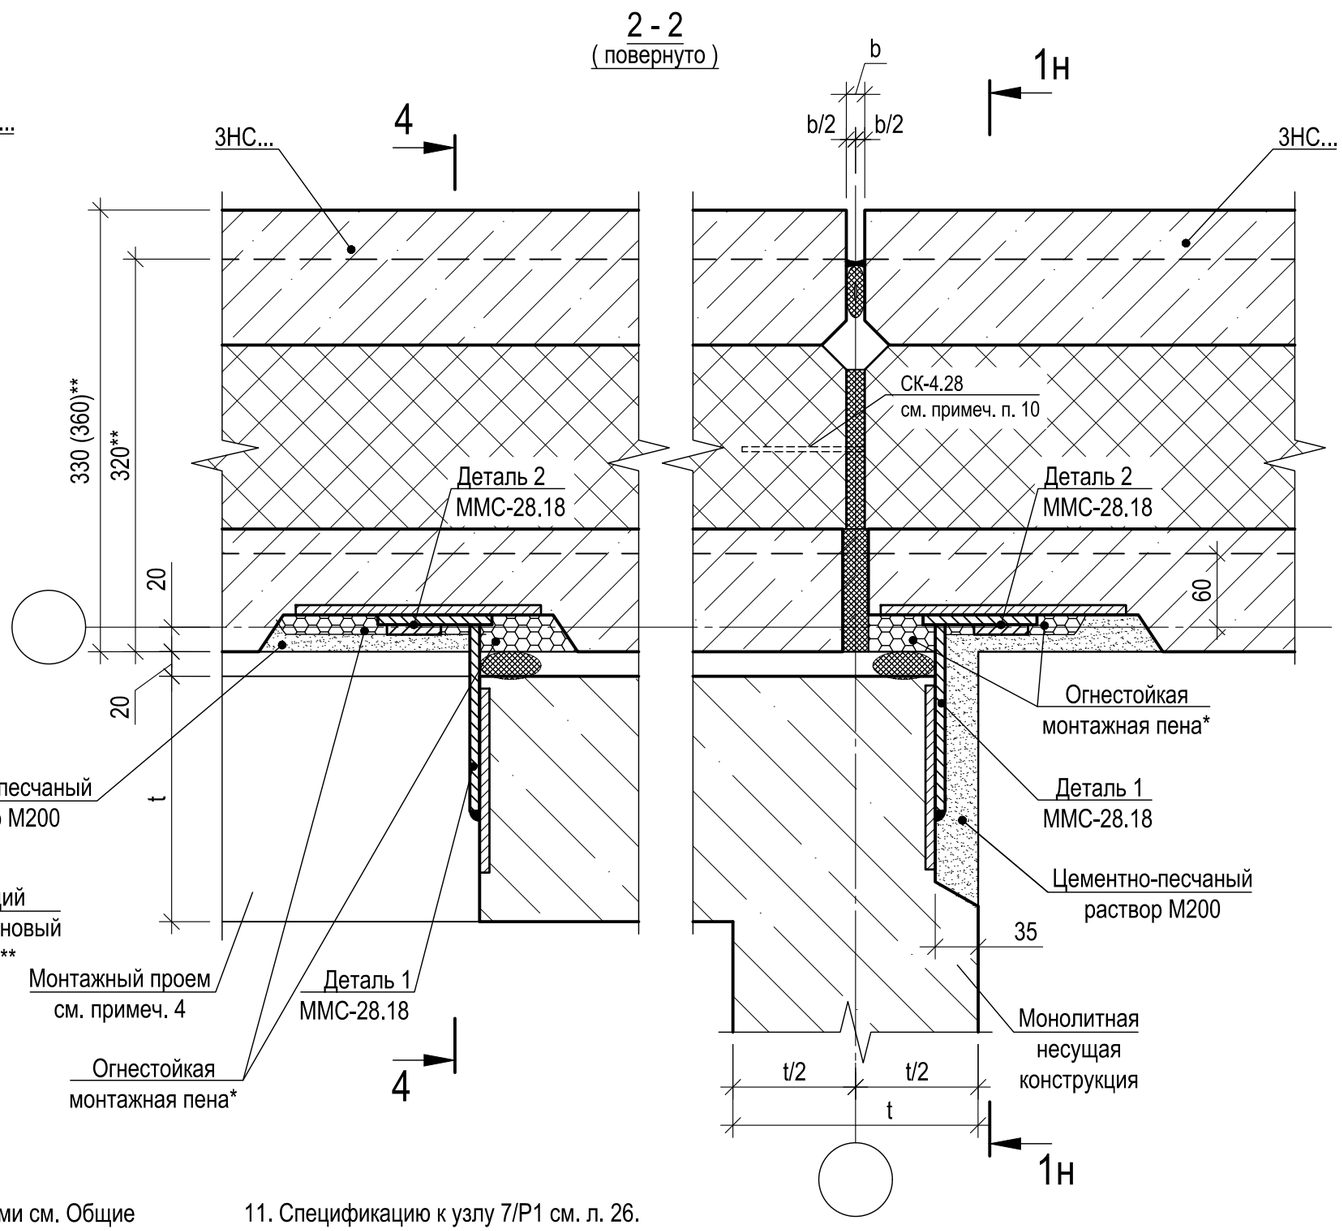

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 4-4 см. л. 33, сечение 2-2 замаркировано на л. 18, 33.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0,3 м^3.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2. Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
8. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
9. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
10. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
11. Спецификацию к узлу 7/Р1 см. л. 26.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	28	
Узел 7/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.


Формат А3

8
Р1

(вариант со стыковкой рядовых панелей,
или со стыковой панелей на внешнем углу здания)

(Заделка вертикального стыка)

(вариант со стыковкой панелей
на внутреннем углу здания)

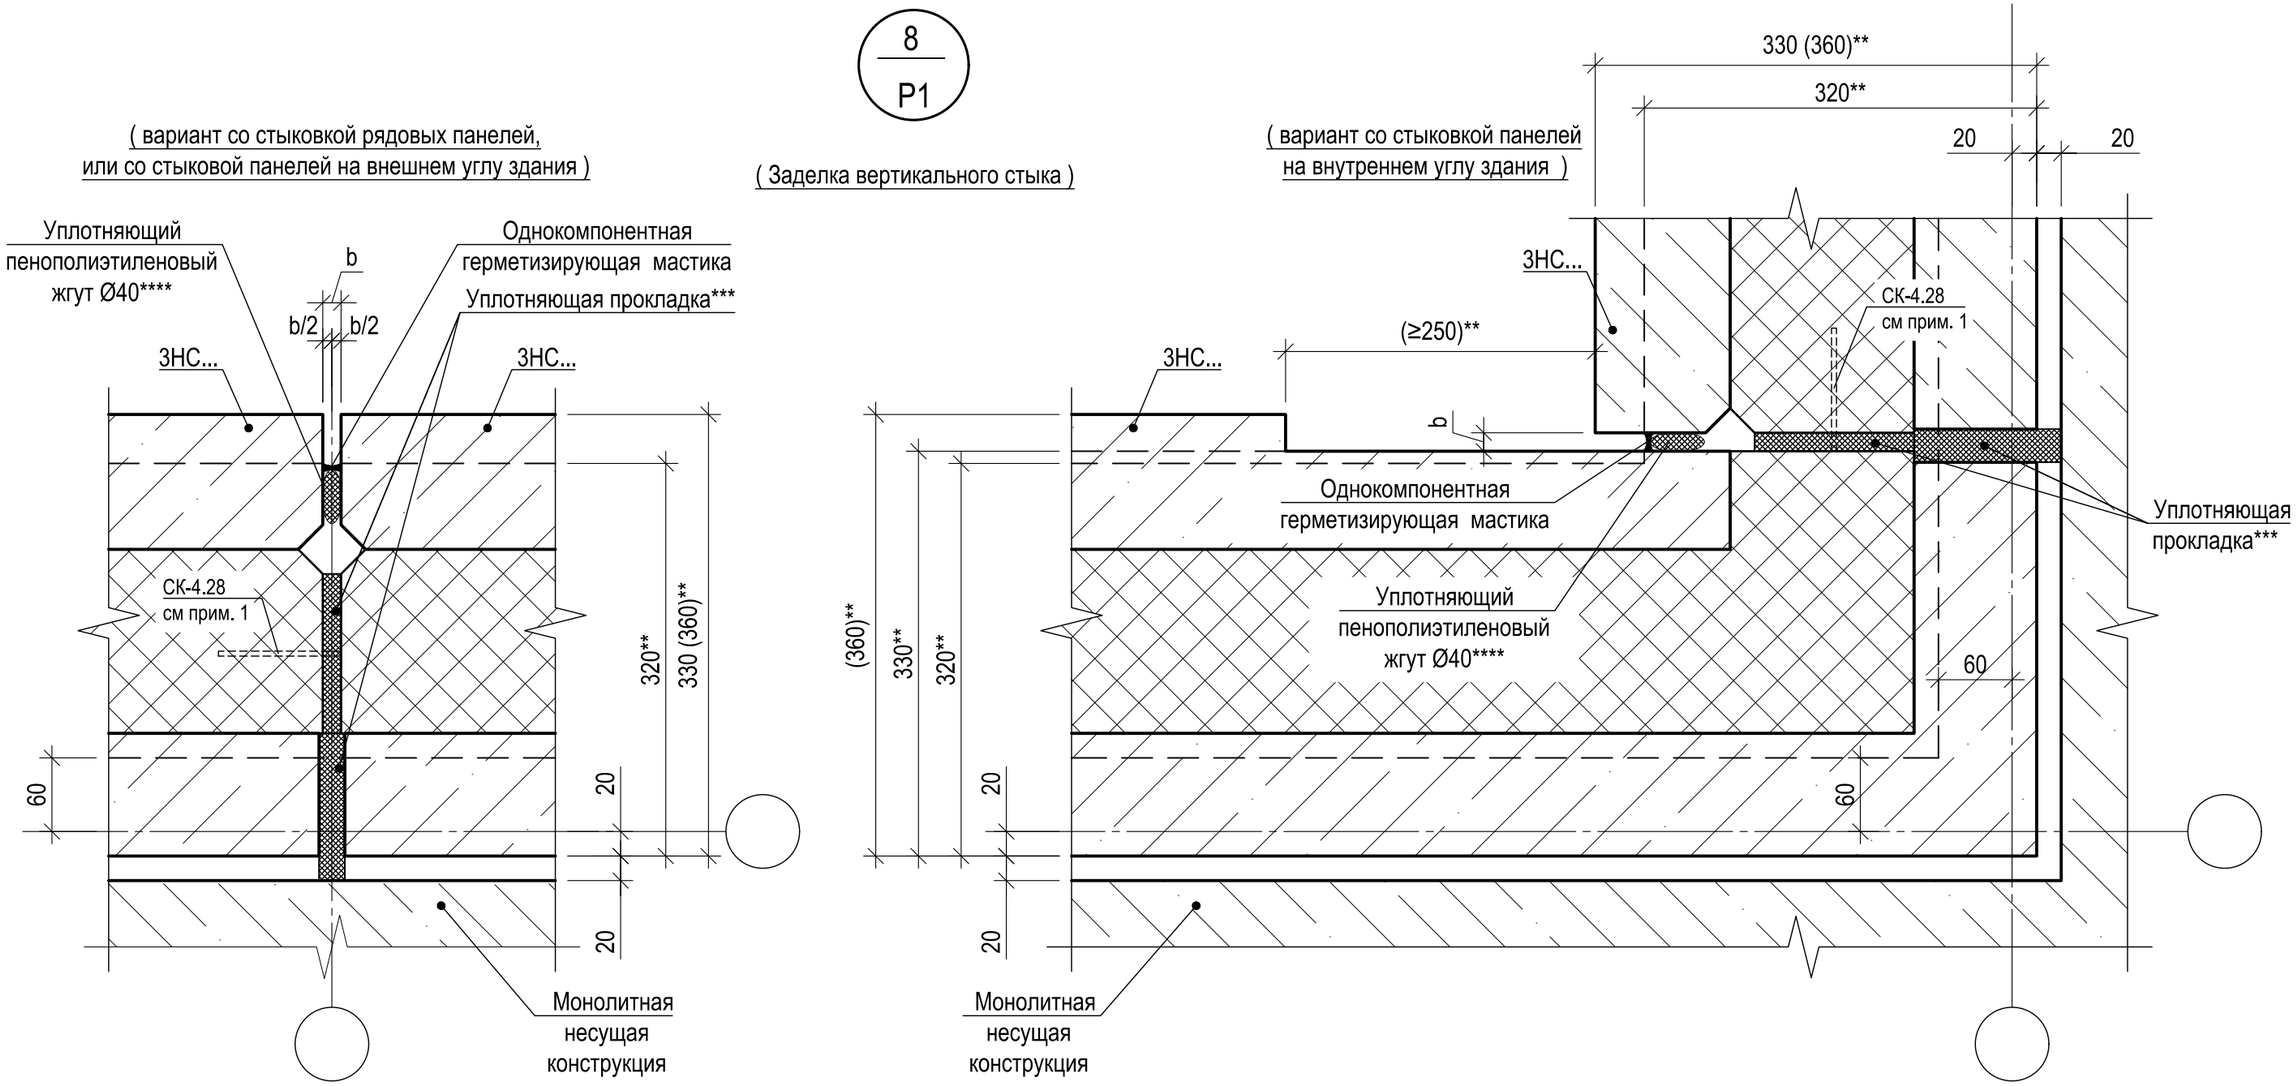

1. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
2. Величину толщины вертикального (b) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
   Для угловой панели общей толщиной 360 мм обеспечить отсутствие выступающего кирпича на ширину не менее 250 мм от вертикального стыка.
4. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.

Спецификация к узлу 8/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	3,0		пог. м
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0112		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	29	
Узел 8/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

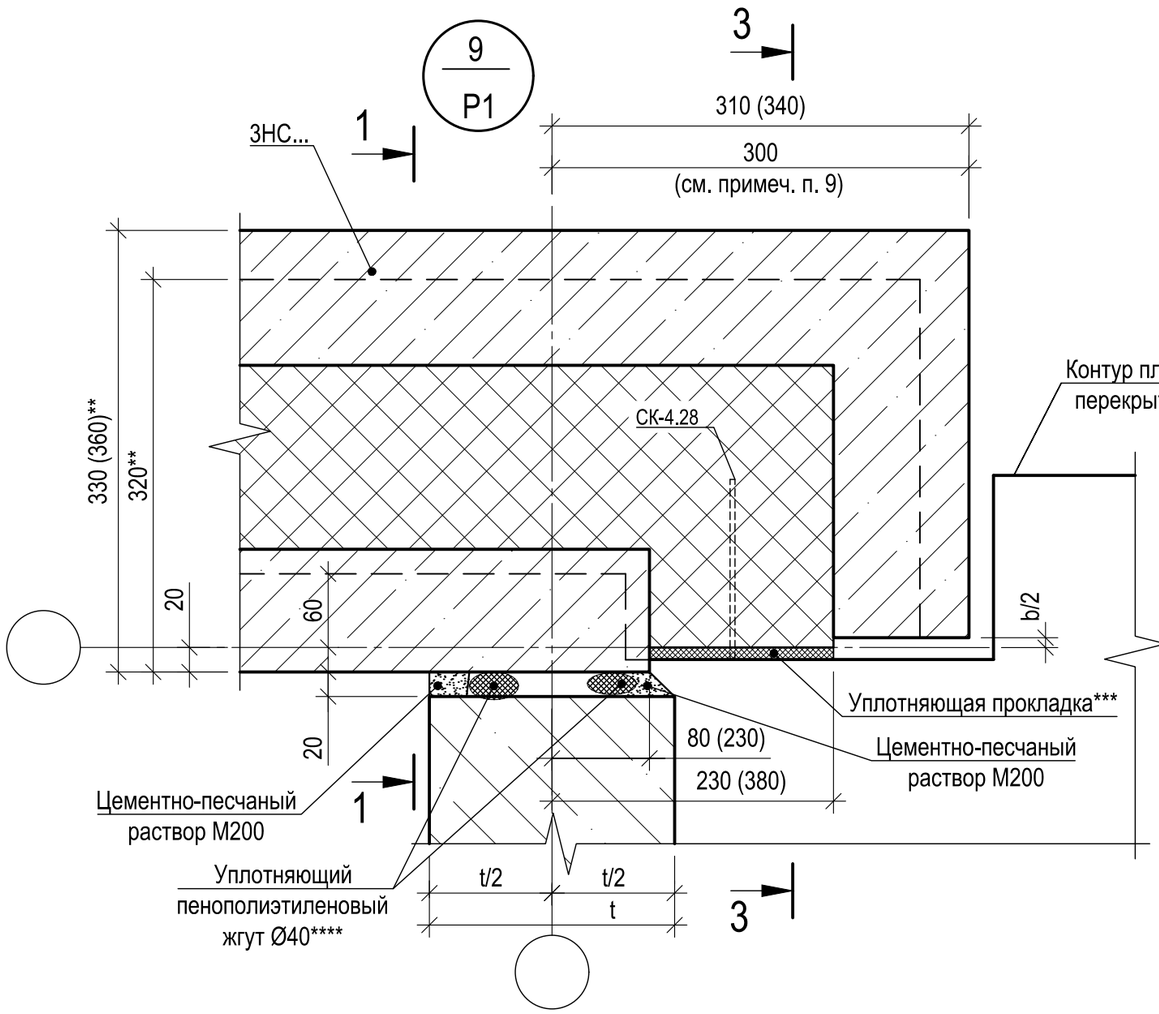

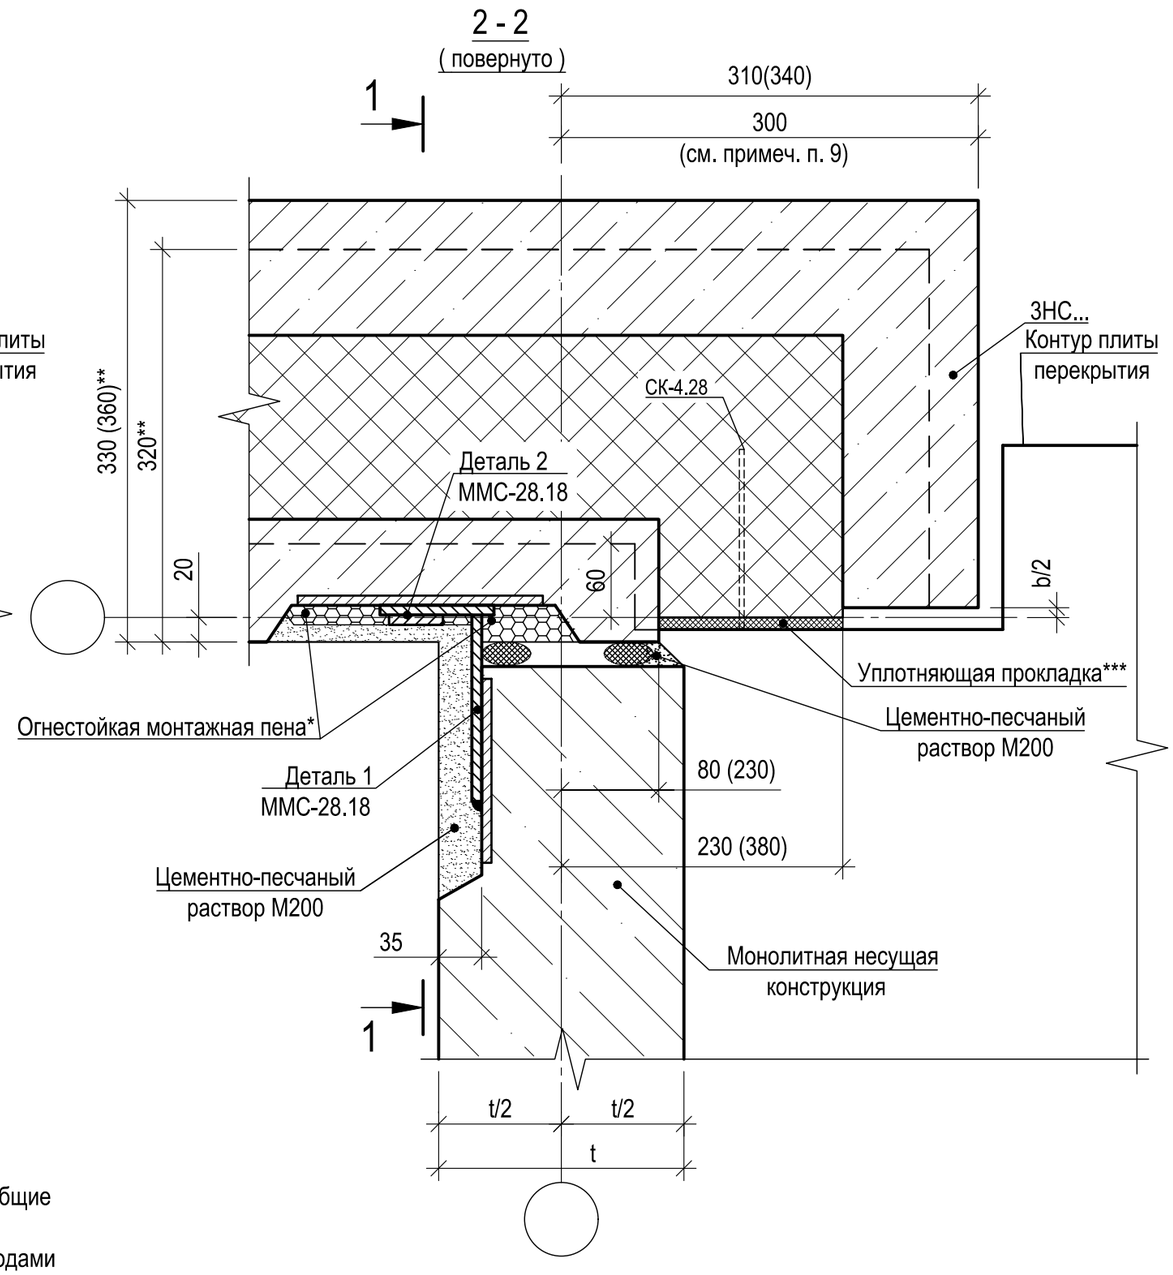

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18, сечение 3-3 см. л. 31.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
7. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. Указания по привязке угловой панели к оси монолитной несущей конструкции см. Общие указания л. 9.
   Допустима привязка торца панели 460 мм в местах примыкания к квартирной лоджии в целях соблюдения требования кратности длины панели.
10. Спецификацию к узлу 9/Р1 см. л. 31.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	30	
Узел 9/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

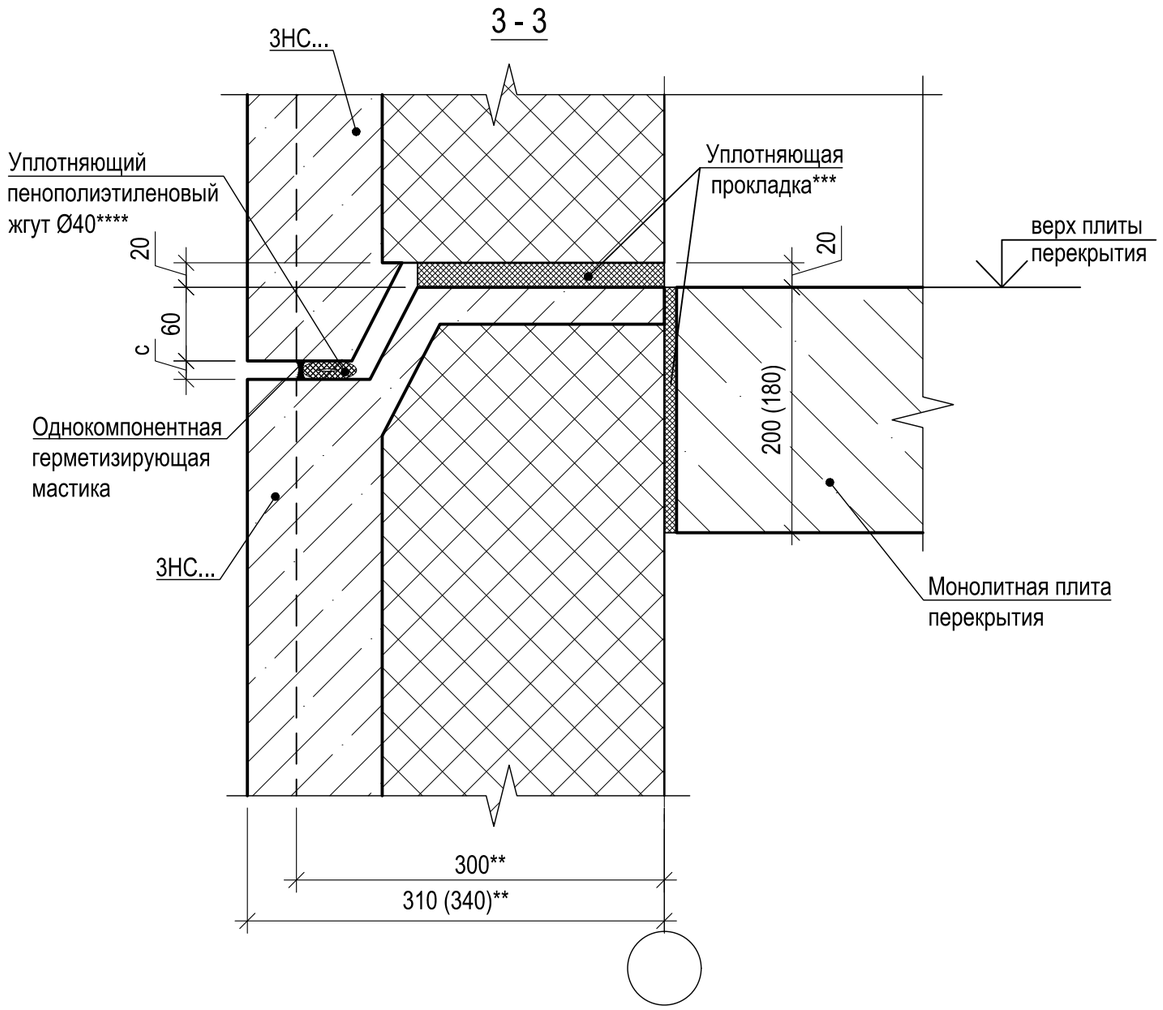

Спецификация к узлу 9/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	1	0,026	
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0006		$м^3$
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		$м^3$
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	6,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		$м^3$ (приведенный объем (к емкости баллона))

1. Сечение 3-3 замаркировано на л. 30.
2. Примечание к узлу 9/Р1 см. л. 30.
3. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
4. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака


Реновация.
Жилой дом


Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Сечение 3-3 к узлу 9/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

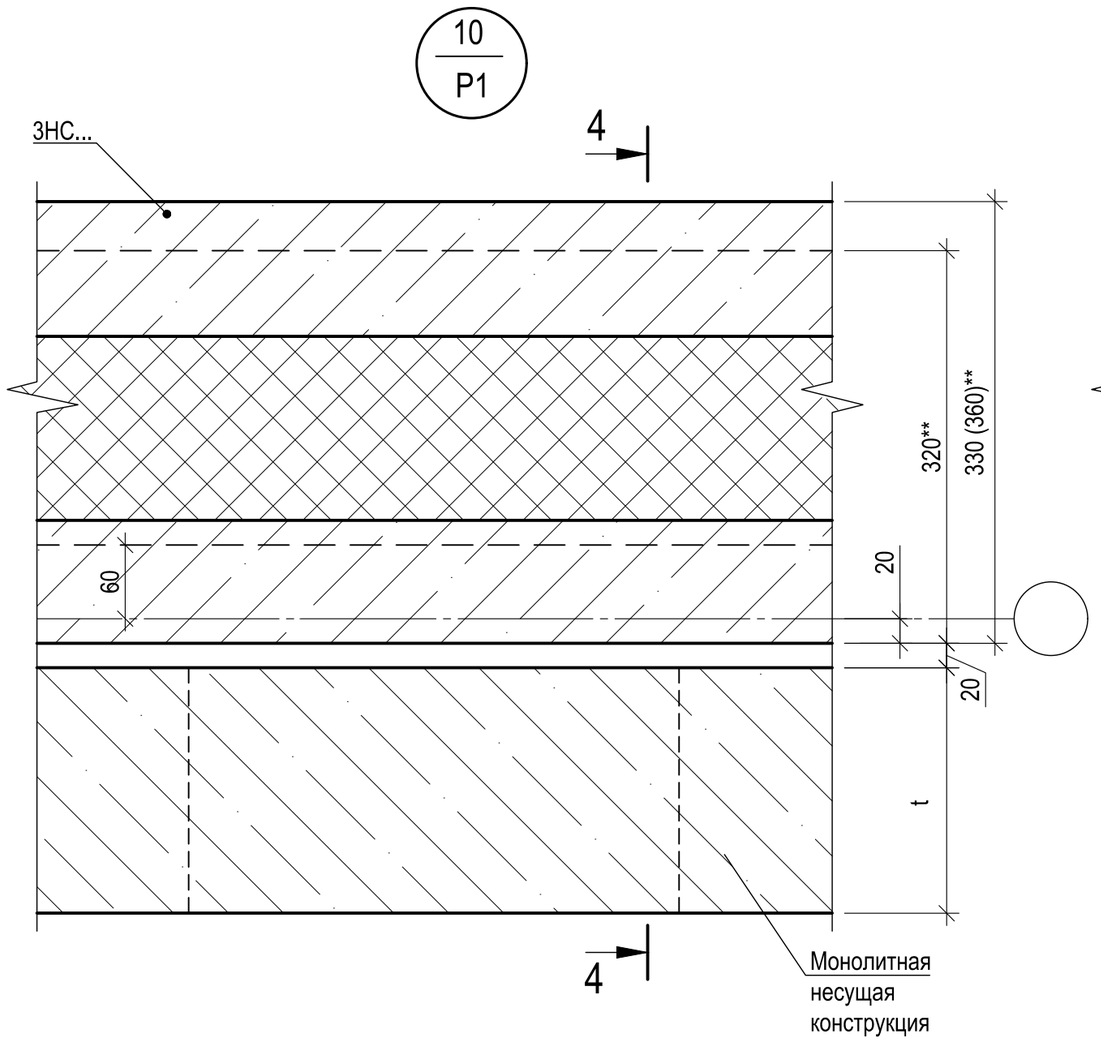

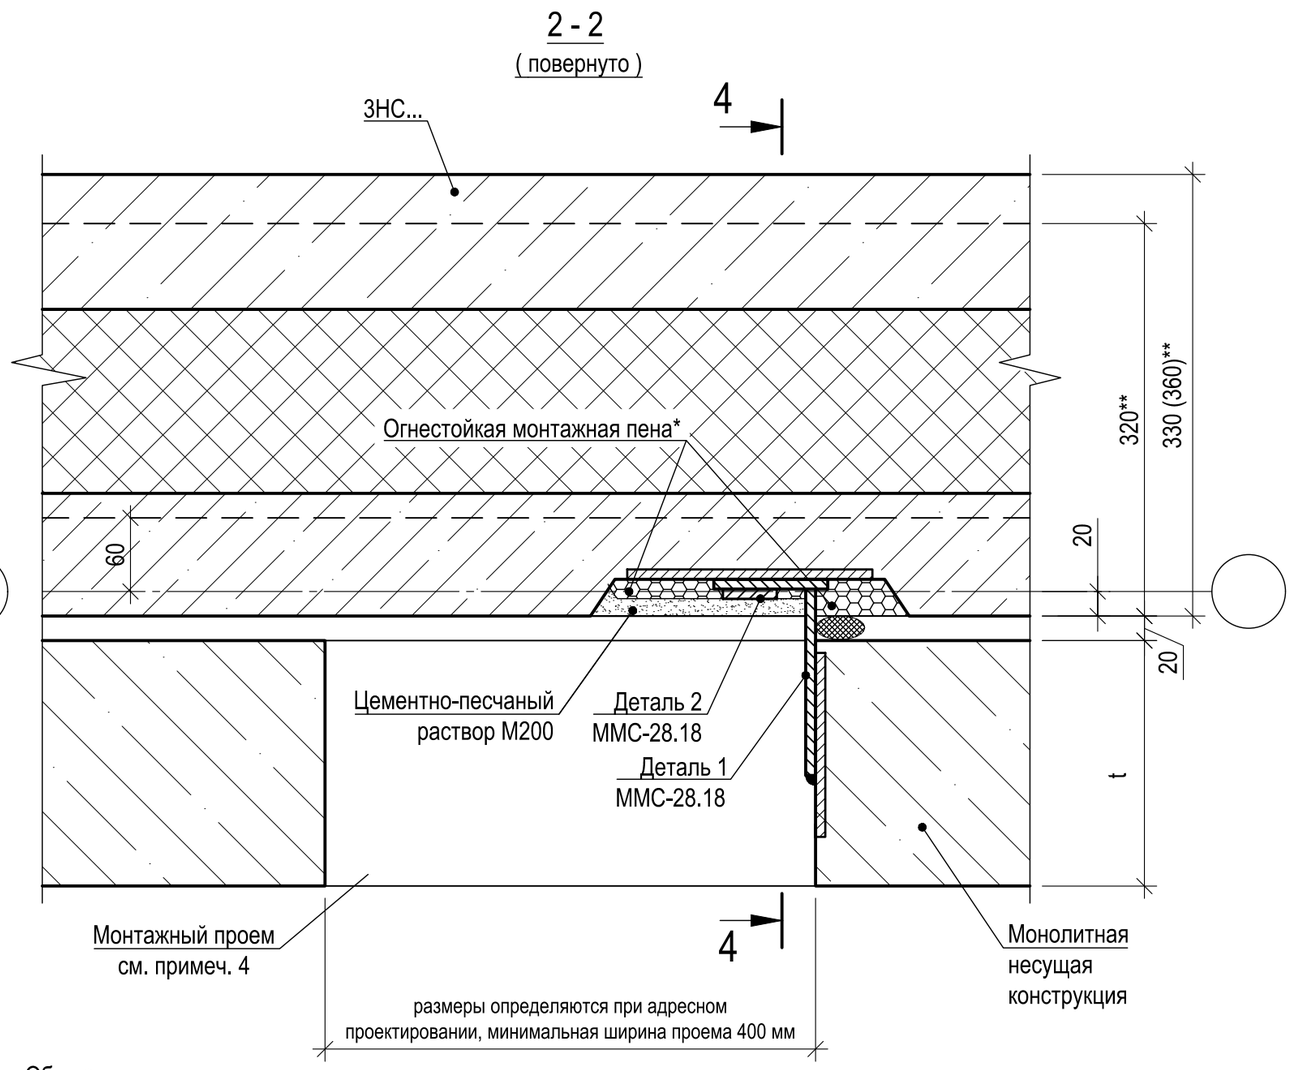

1. Сечение 4-4 см. л. 33, сечение 2-2 замаркировано на л. 33.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0.315 м^3.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.

Спецификация к узлу 10/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,001		м^3
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м^3 (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	3,0		пог. м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	32	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 10/Р1	МФС	Генеральный Подрядчик	


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

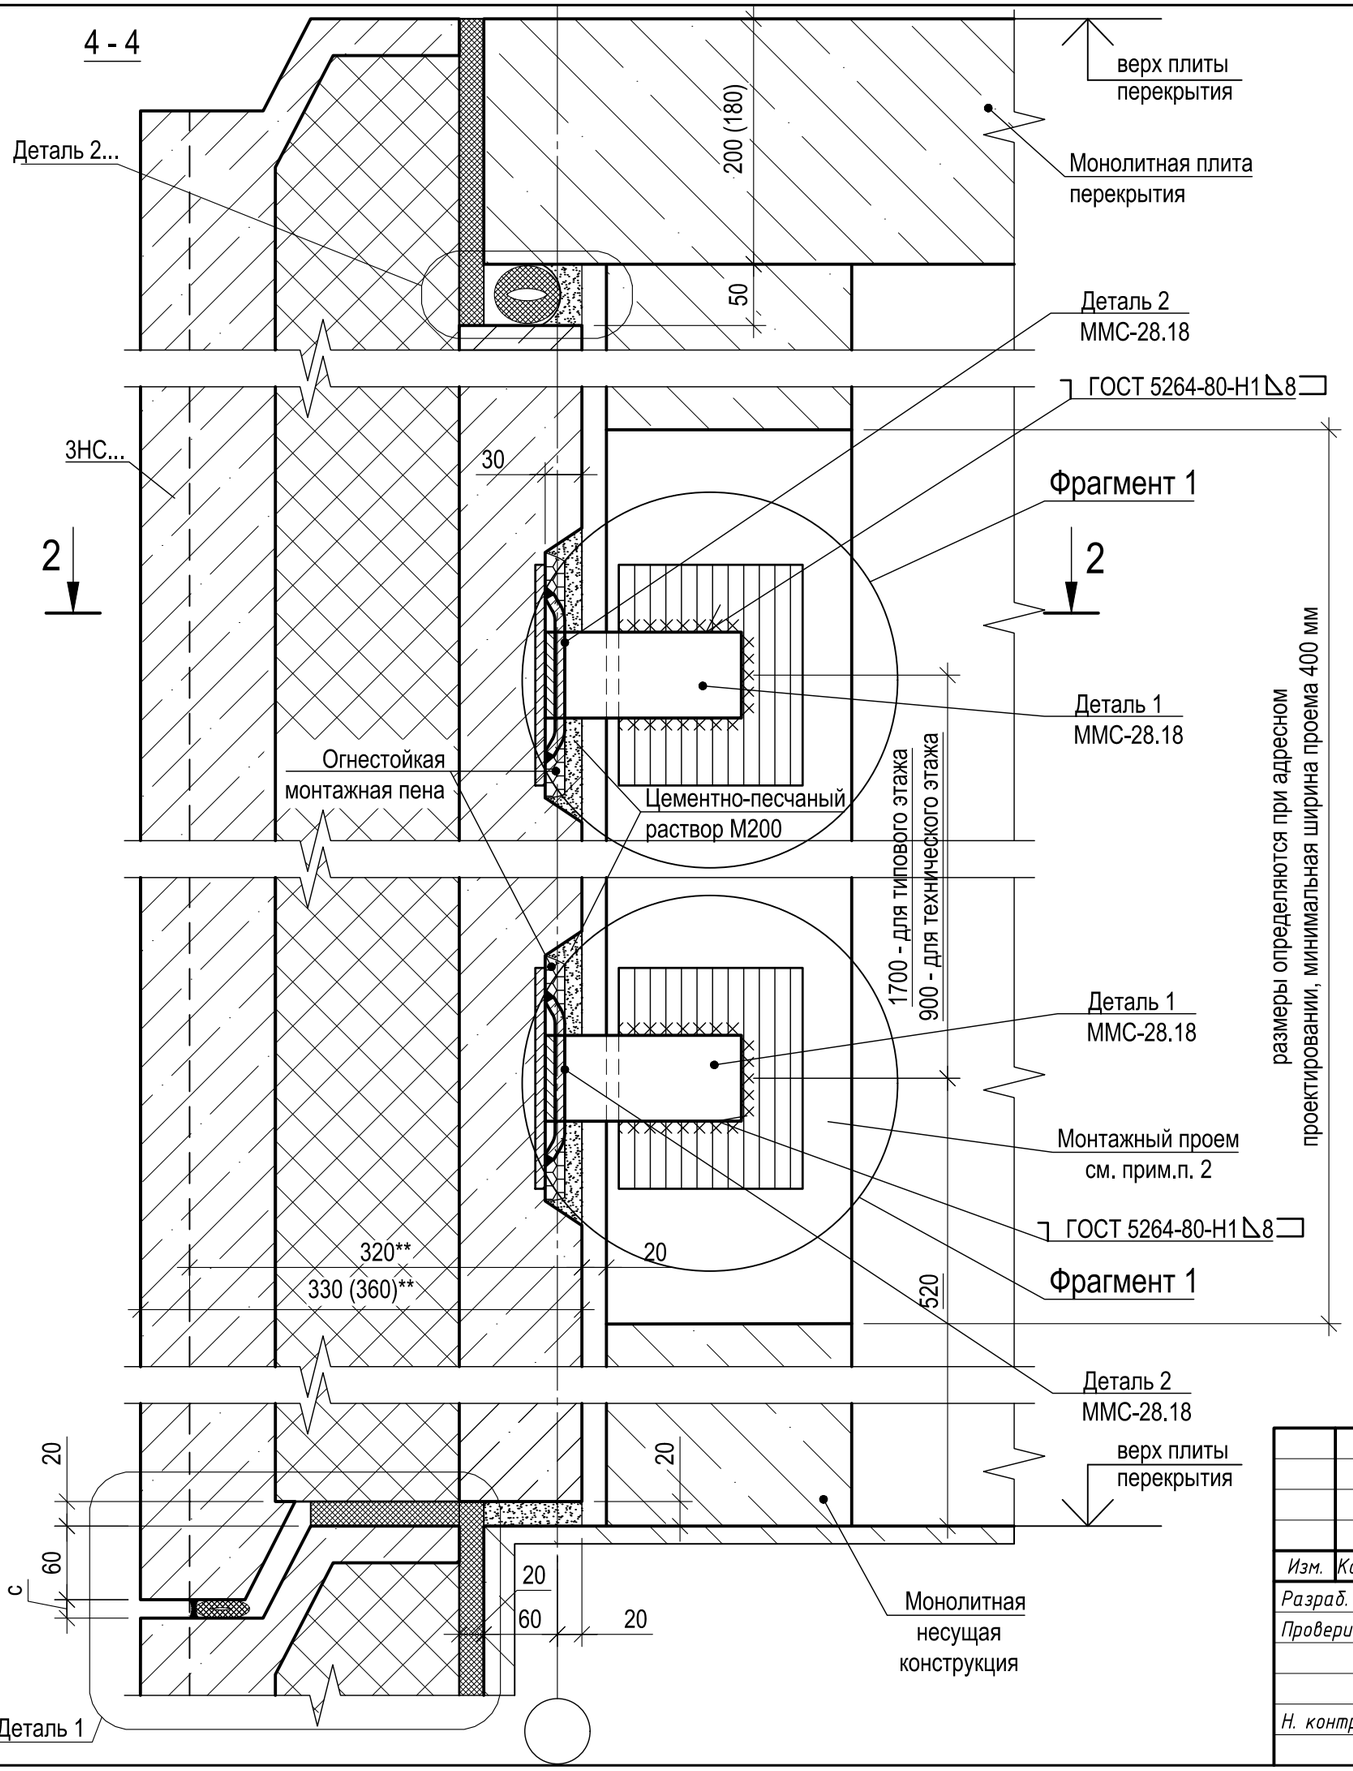

1. Сечение 2-2 к узлу 7/Р1 см. л. 28, к узлу 10/Р1 см. л. 32, Фрагмент 1 см. л. 18, сечение 4-4 замаркировано на л. 28, 32.
2. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0,315 м^3.
3. Примечания к узлу 7/Р1 см. л. 28, к узлу 10/Р1 см. л. 32.
4. Детали 1, 2... см. л. 13.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	33	

Сечение 4-4 к узлам 7/Р1, 10/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

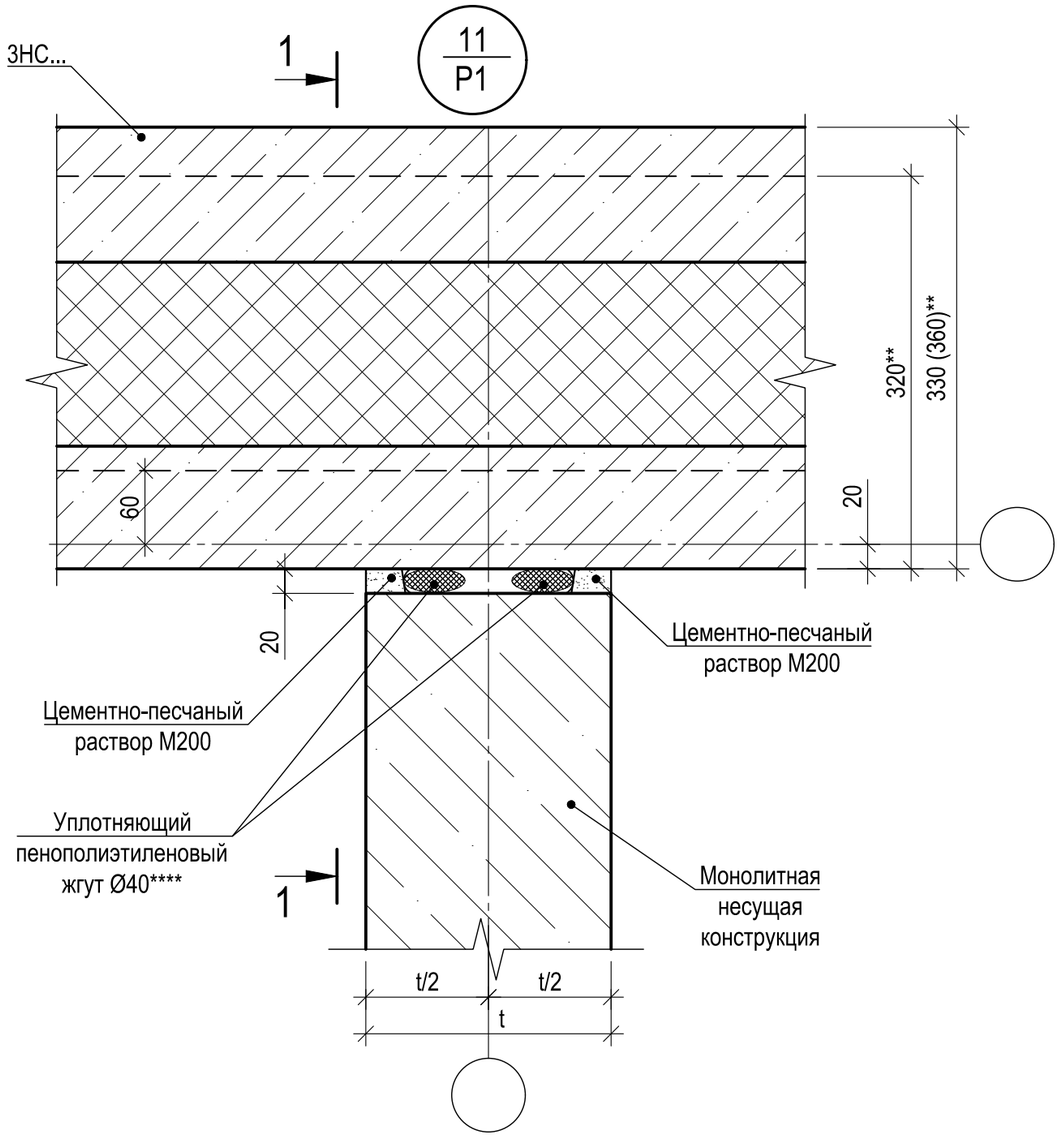

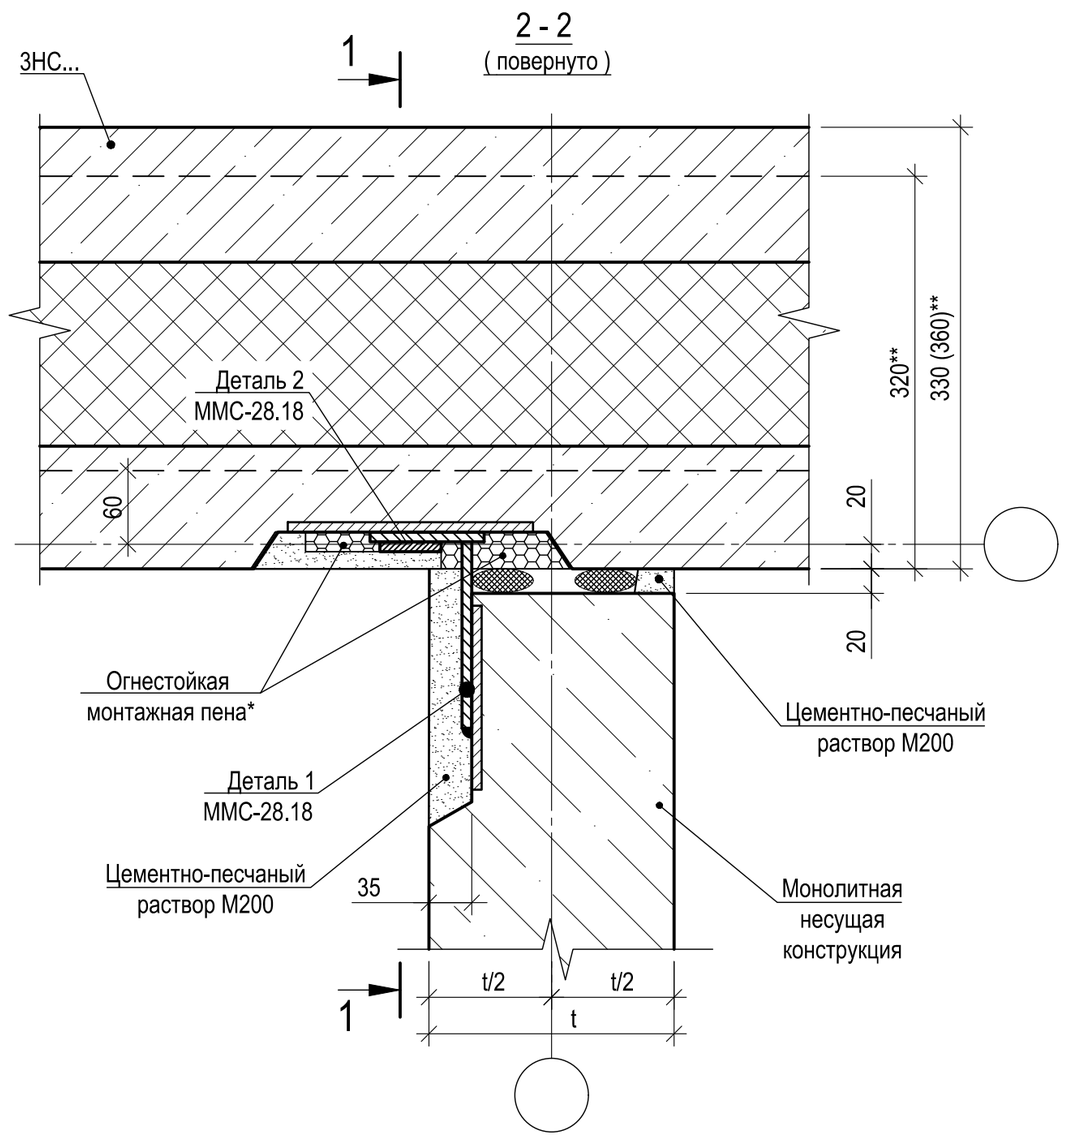

1. Сечение 1-1 см. л. 18. Сечение 2-2 замаркировано на л. 18.
2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
3. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
4. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
5. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине шва, в случае иных размеров диаметр уплотняющего жгута принимается согласно условию п. 15 на л. 2.
6. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.

Спецификация к узлу 11/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		м³
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	6,0		пог. м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	34	
Узел 11/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Формат А3


Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.

13
Р1

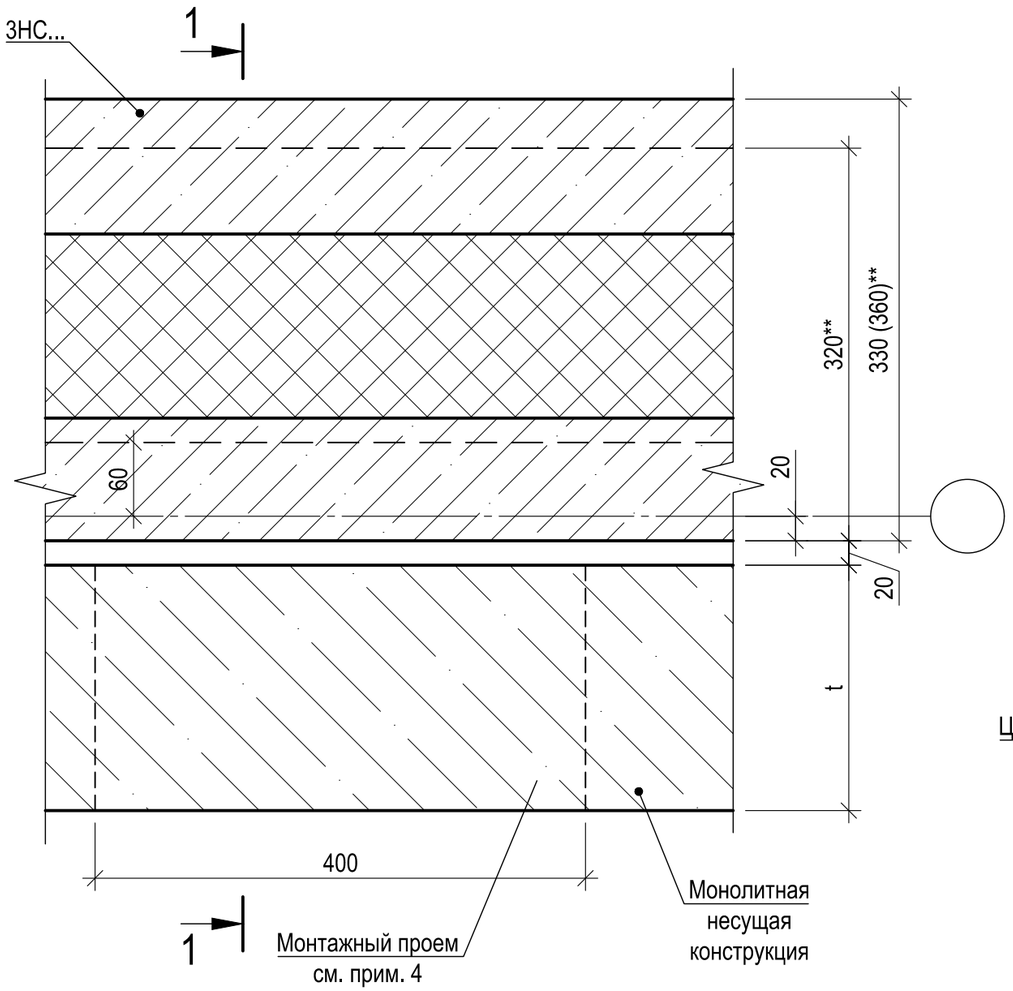

2 - 2
(повернуто)

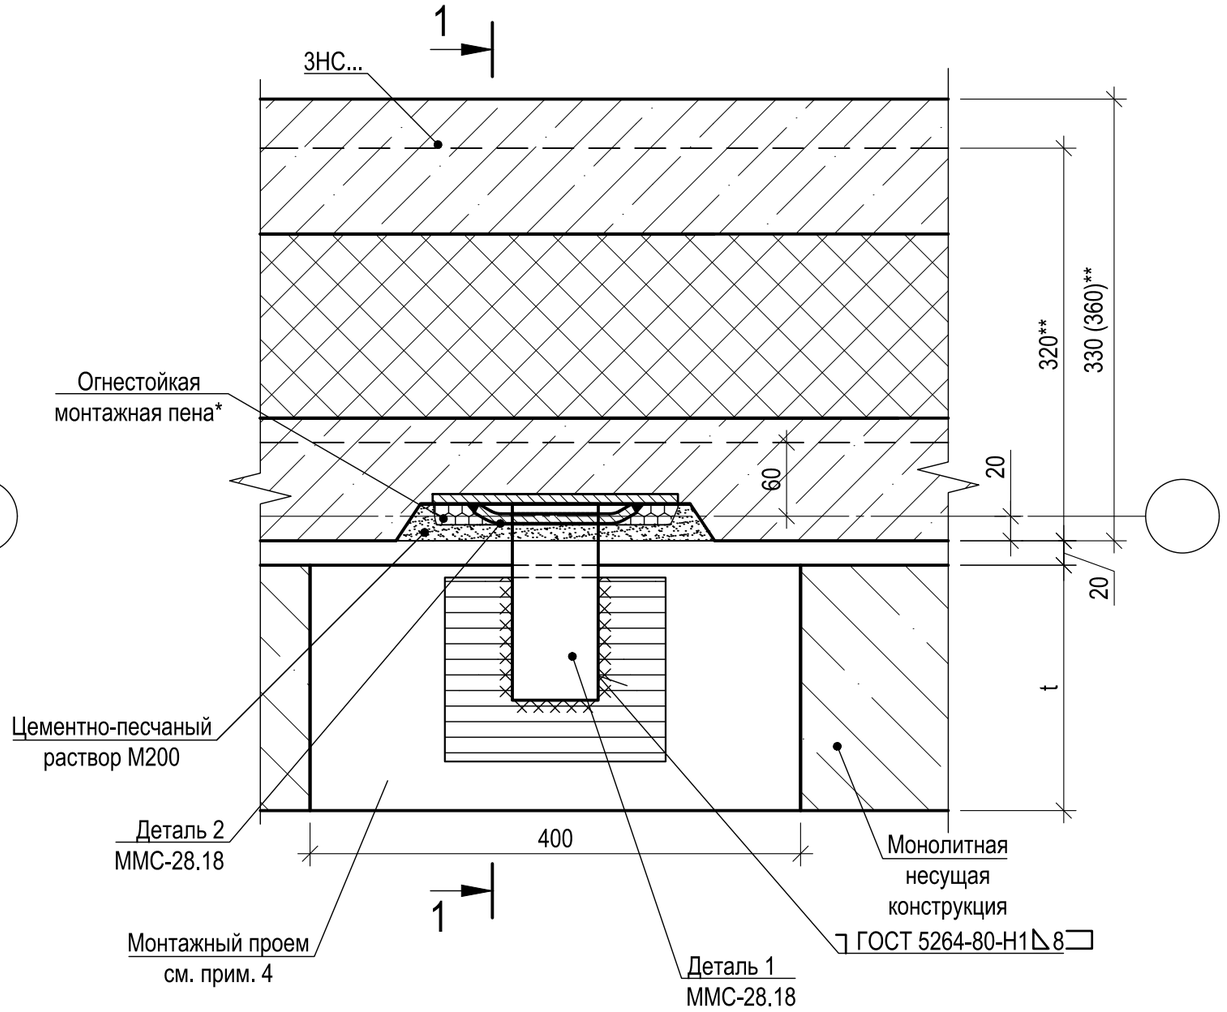

1. Сечение 1-1 см. л. 36, сечение 2-2 замаркировано на л. 36.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0,116 м^3.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
8. Спецификацию к узлу 13/Р1 см. л. 36.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	35	
Узел 13/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

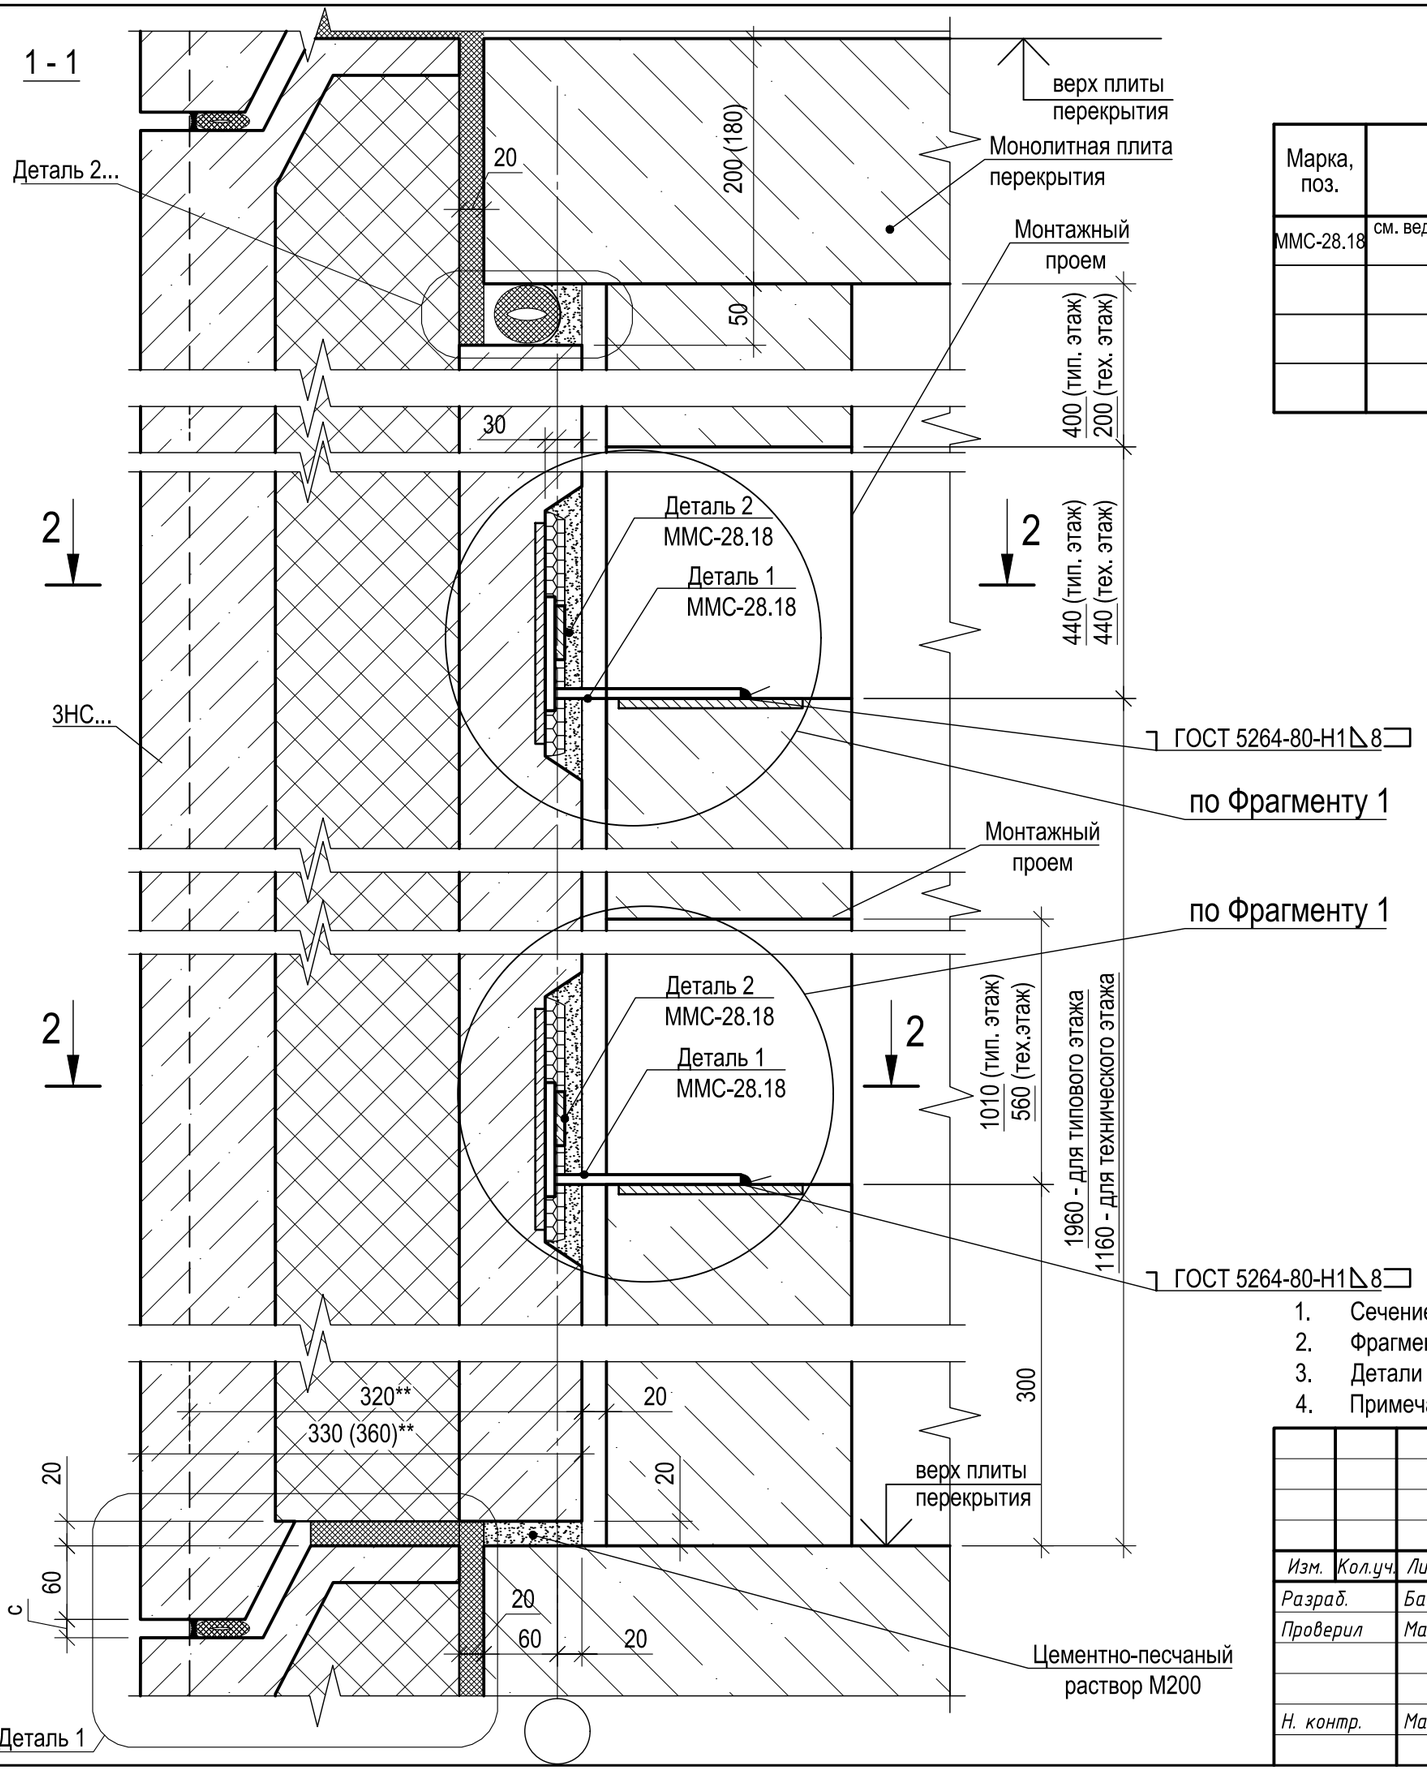

Спецификация к узлу 13/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		$м^3$
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		$м^3$ (приведенный объем (к емкости баллона))

1. Сечение 1-1 замаркировано на л. 35. Сечение 2-2 см. л. 35.
2. Фрагмент 1 см. л. 18.
3. Детали 1, 2... см. л. 13.
4. Примечание к узлу 13/Р1 см. л. 35.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

Сечение 1-1 к узлу 13/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

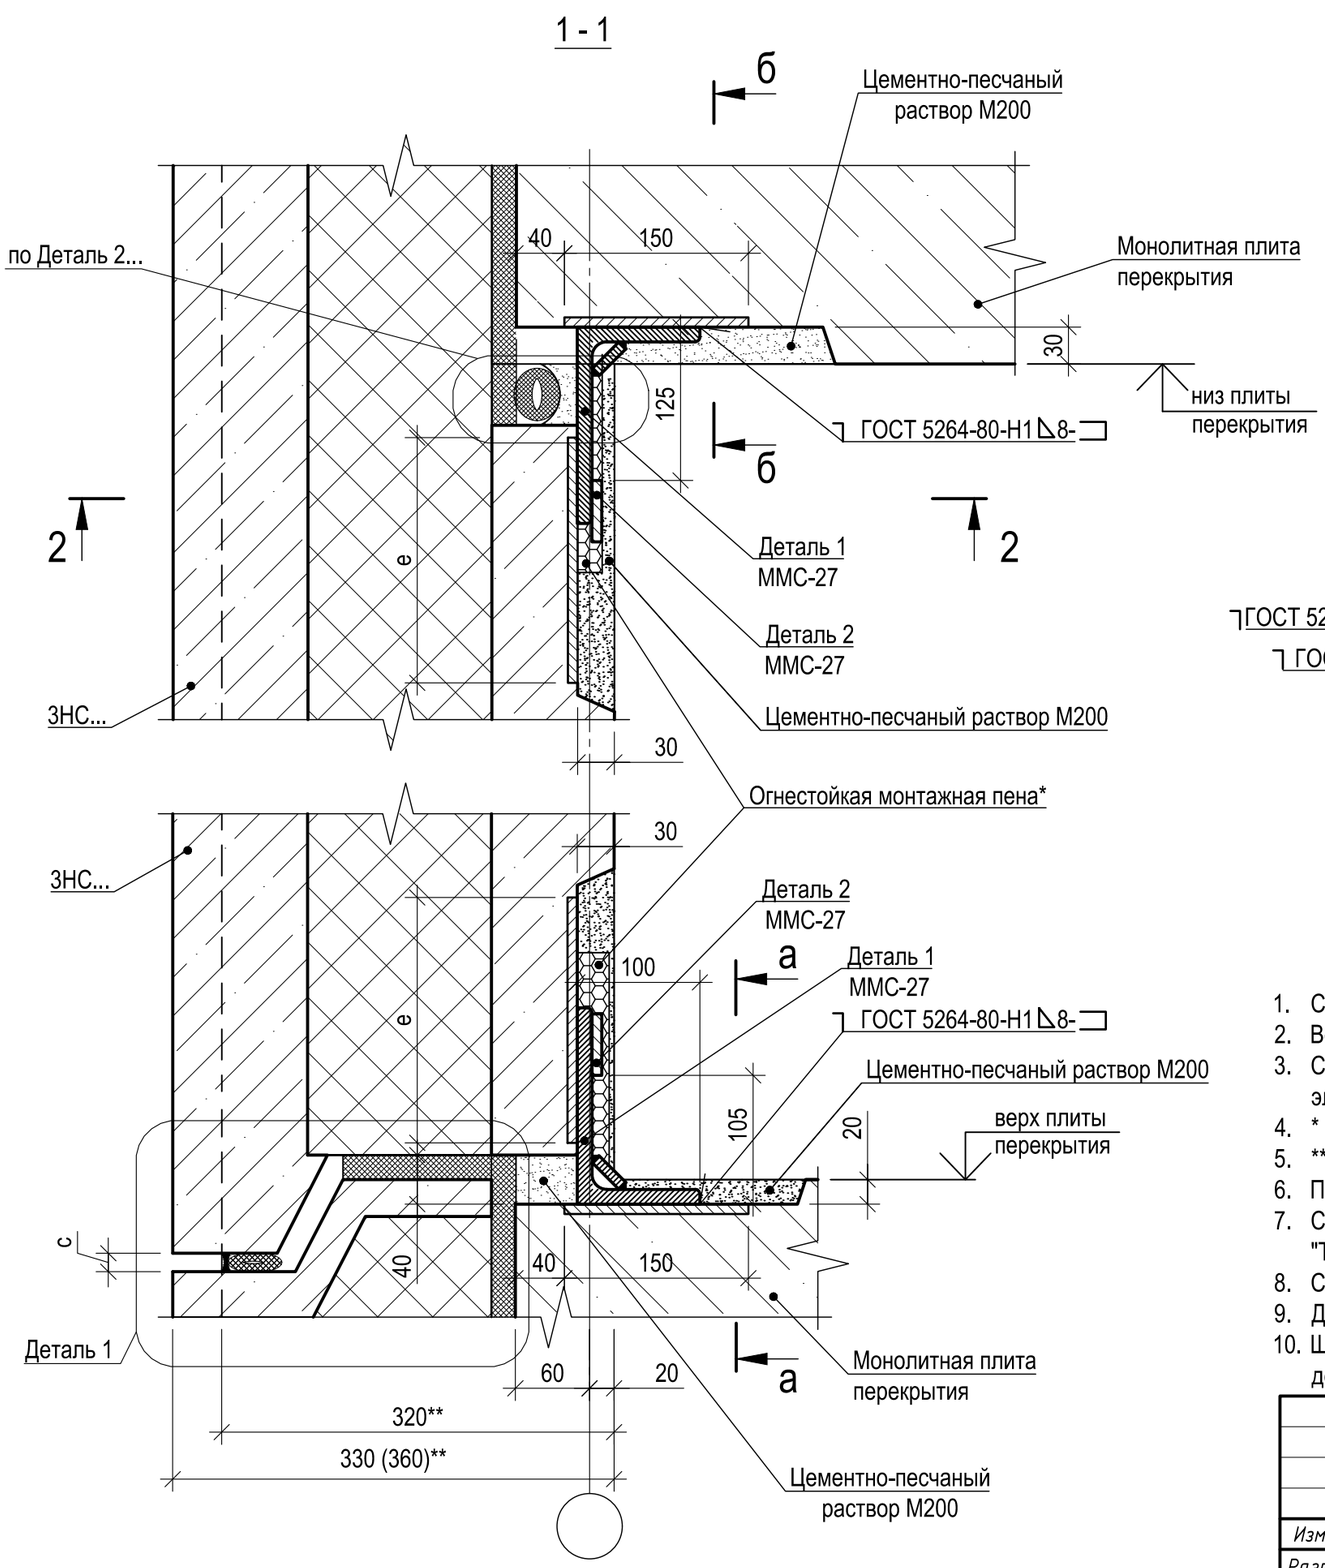

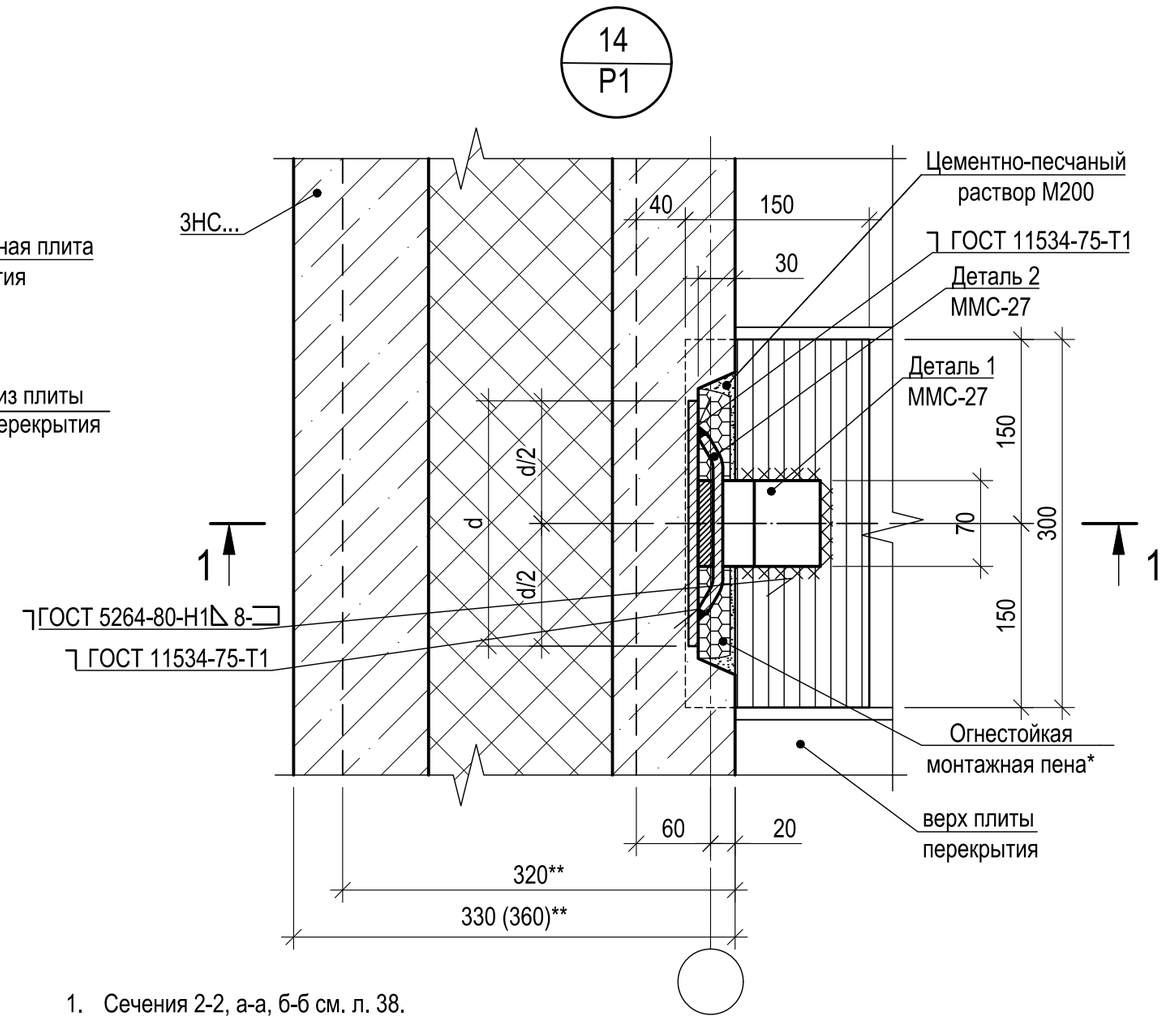

1. Сечения 2-2, а-а, б-б см. л. 38.
2. Величины толщин горизонтального (с) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
7. Стальные элементы в узле, после монтажа покрывать огнезащитным составом (огнезащитной краской) "Термобарьер" ТУ 2313-001-30642285-2011 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
8. Спецификацию к узлу 14/Р1 см. л. 38.
9. Детали 1, 2... см. л. 13.
10. Ширина пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 200 мм, высота пластины закладной детали в наружной панели (е) не менее 180 мм.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака


Реновация.
Жилой дом


Стадия	Лист	Листов
Р	37	


Узел 14/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

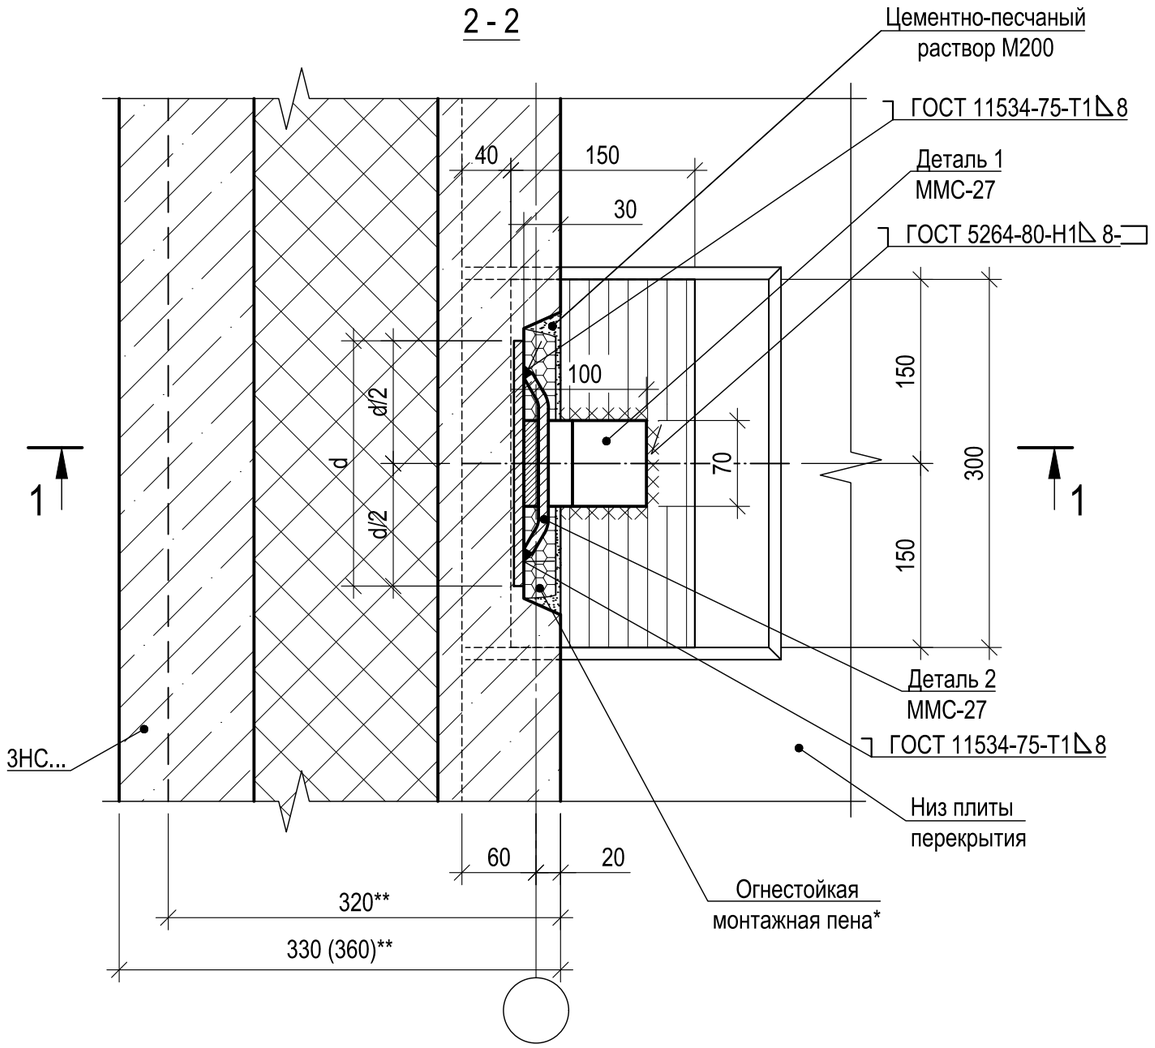

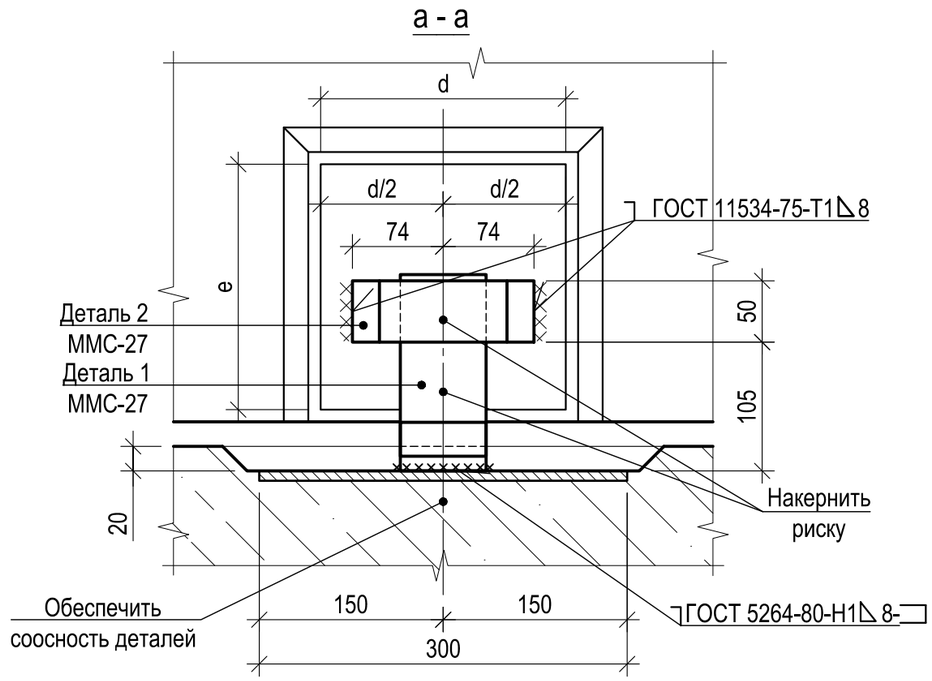

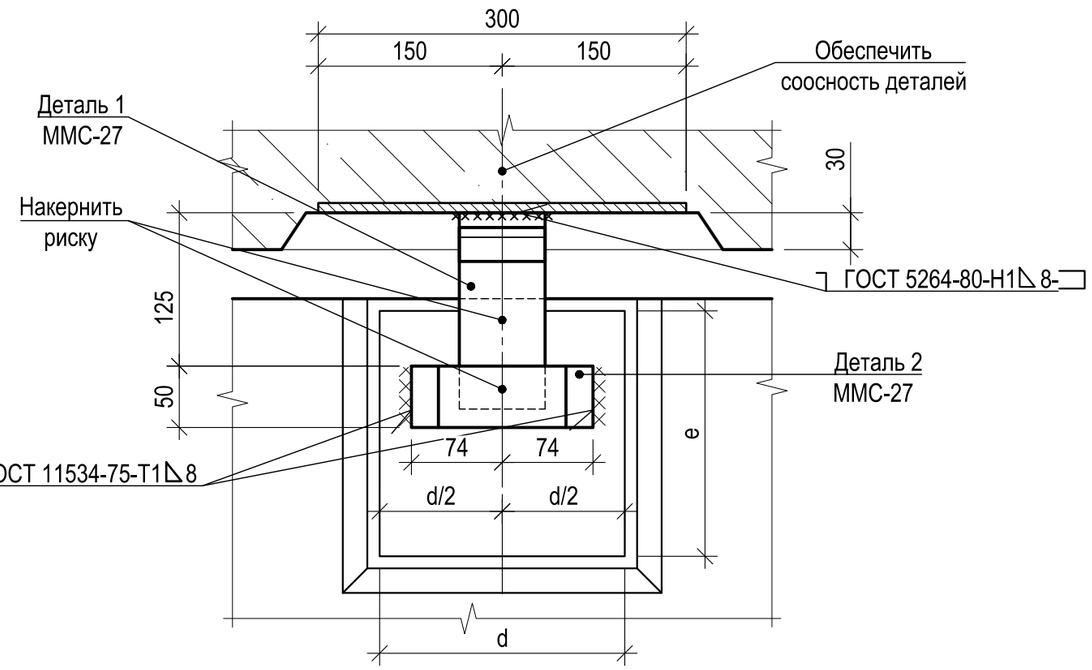

1. Сечение 1-1 см. л. 37. Сечение 2-2 замаркировано на л. 37.
2. Примечания к узлу 14/Р1 см. л. 37.
3. Ширина пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 200 мм, высота пластины закладной детали в наружной панели (e) не менее 180 мм.

Спецификация к узлу 14/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-27	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-27	2	2,25	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		$м^3$
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		$м^3$ (приведенный объем (к емкости баллона))

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	38	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Сечение 2-2 к узлу 14/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Формат А3

15
Р1

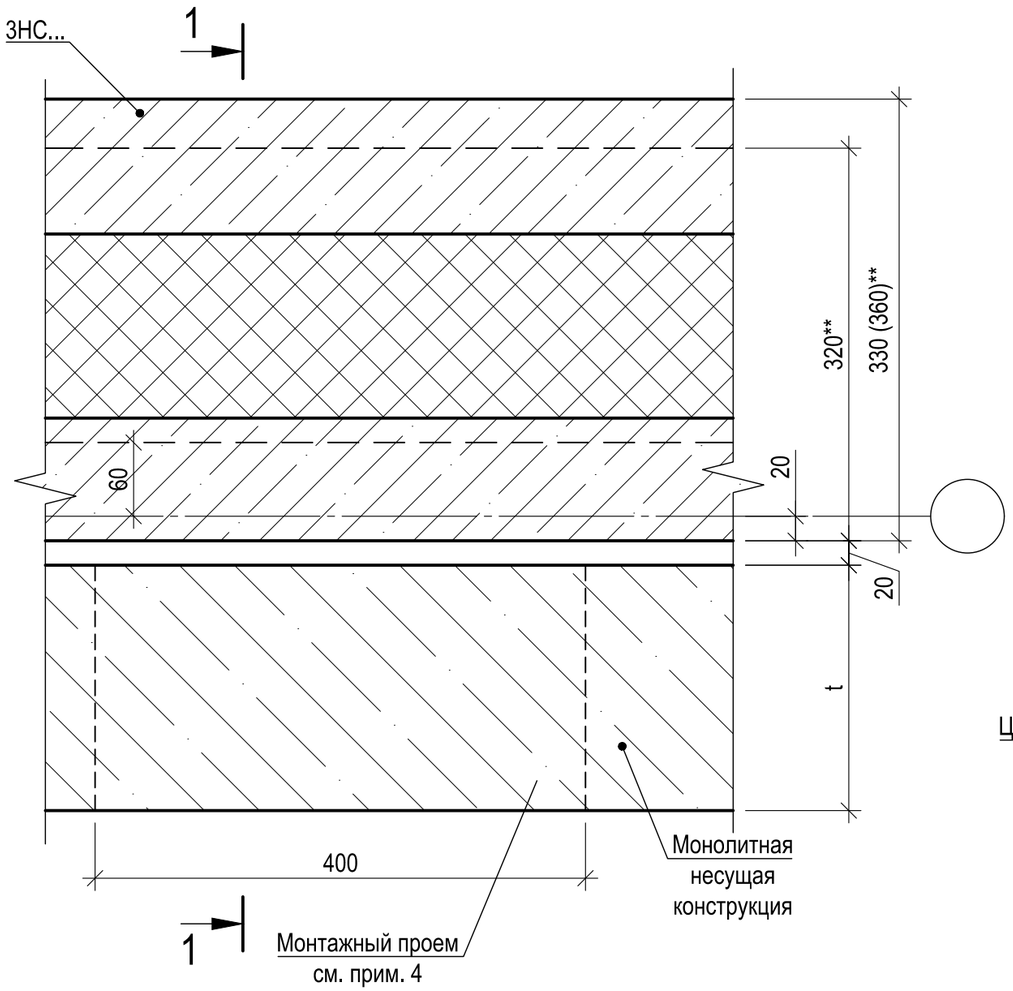

2 - 2
(повернуто)

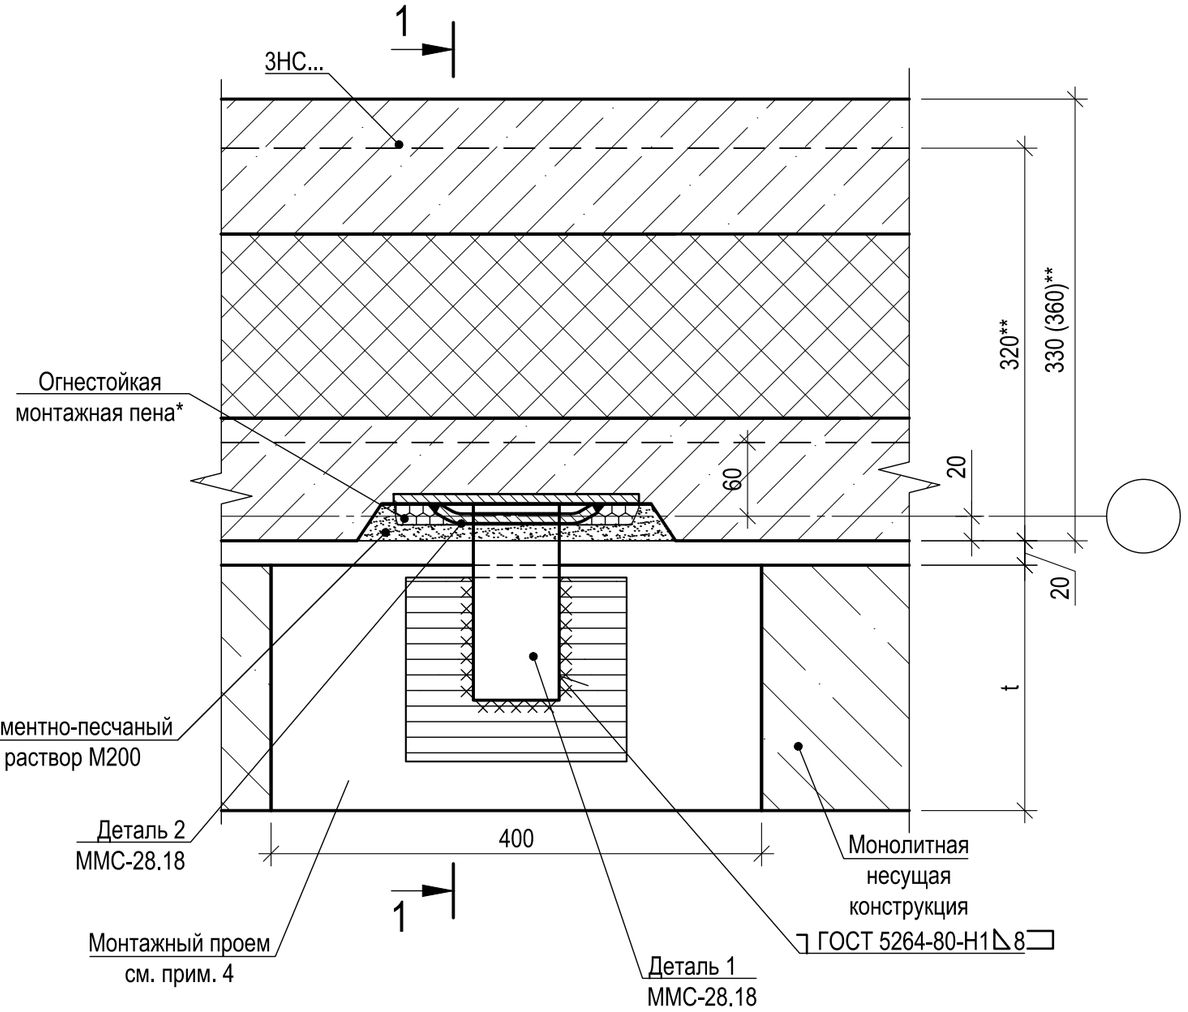

1. Сечение 1-1 см. л. 40, сечение 2-2 замаркировано на л. 40.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0,116 м^3.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
8. Спецификацию к узлу 15/Р1 см. л. 40.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	39	

Узел 15/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

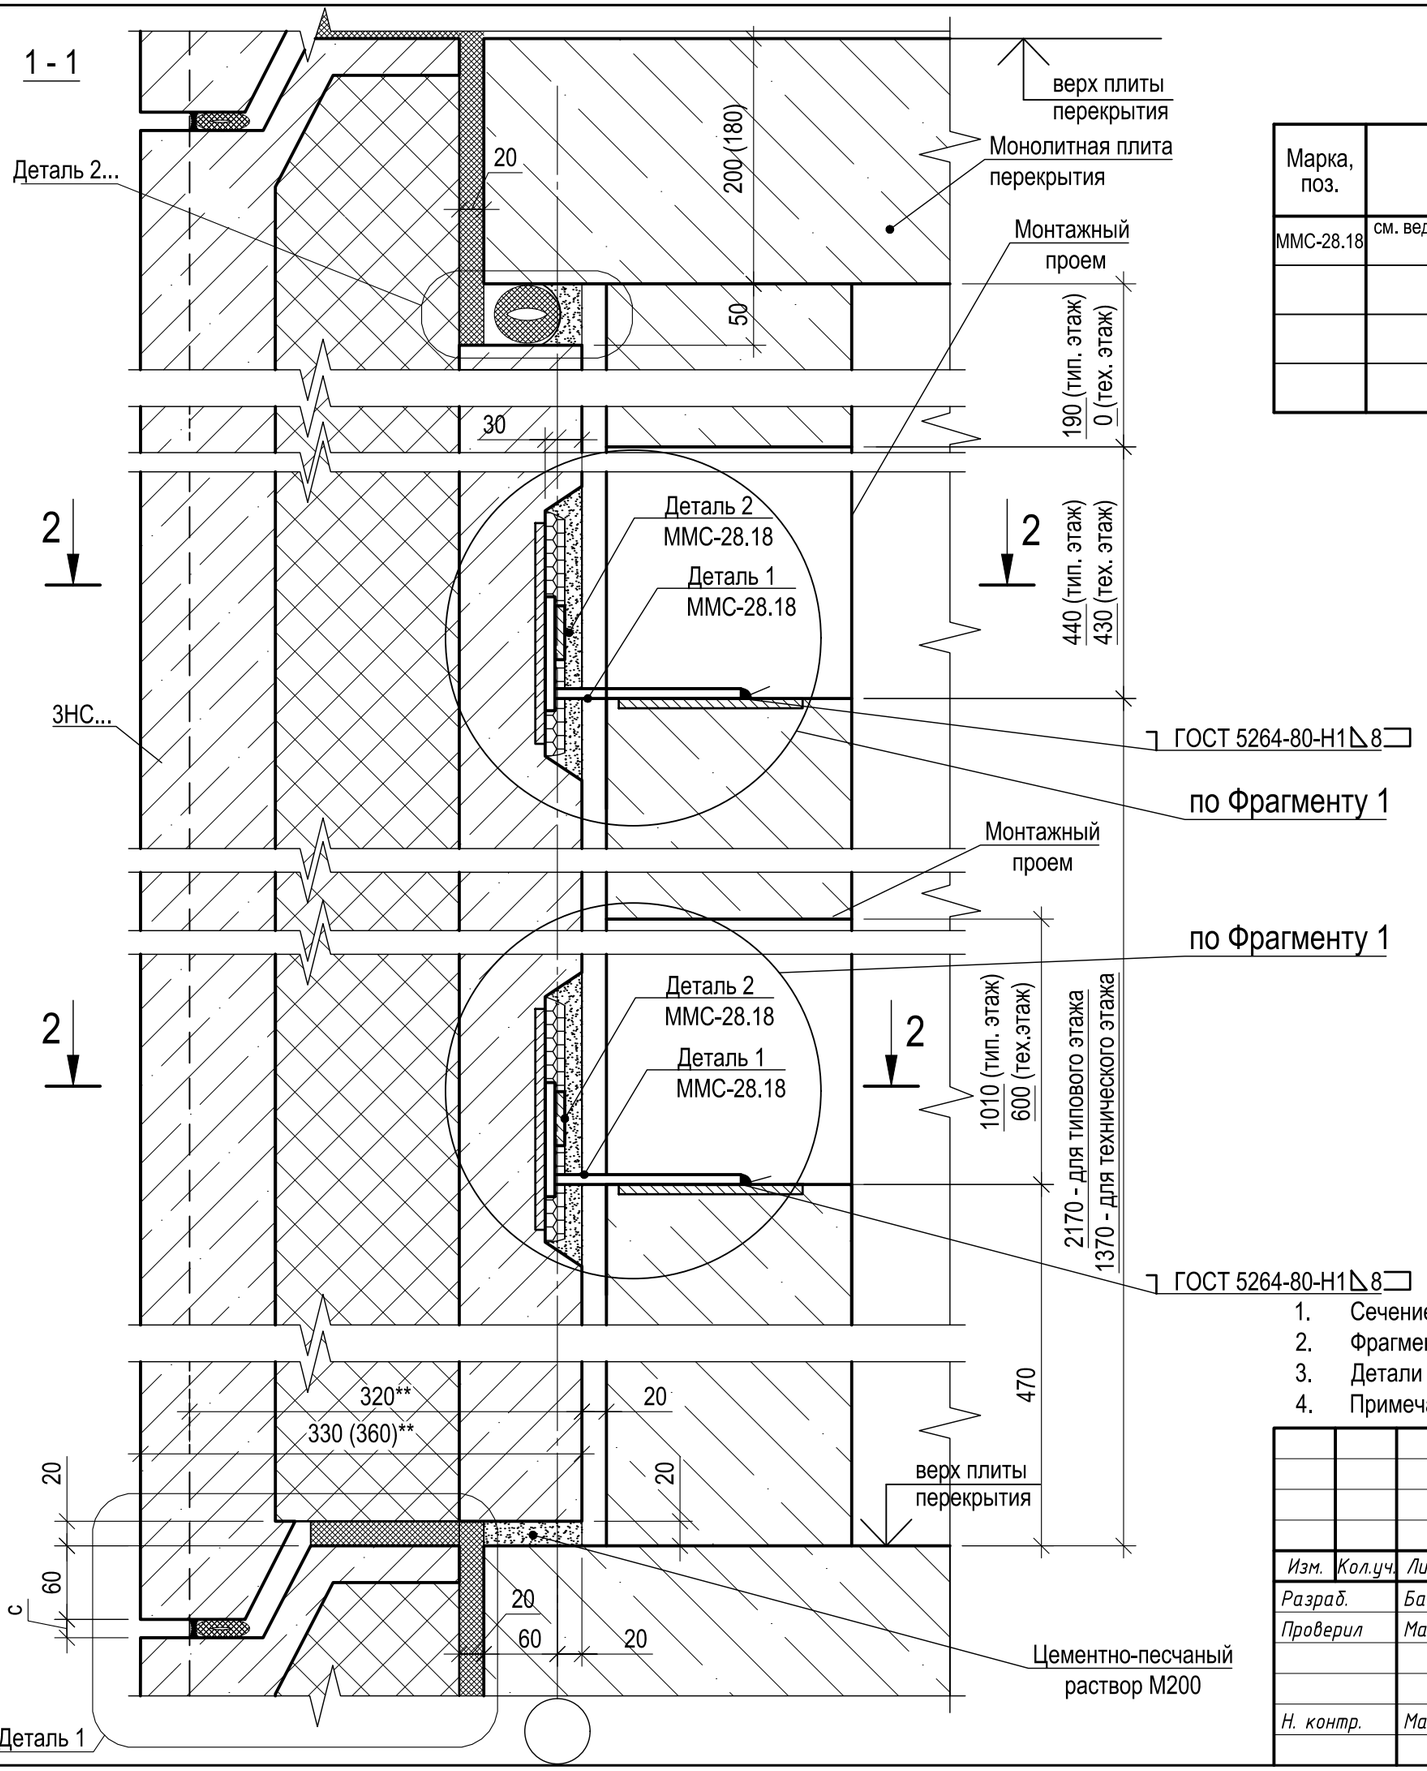

Спецификация к узлу 15/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		$м^3$
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		$м^3$ (приведенный объем (к емкости баллона))

1. Сечение 1-1 замаркировано на л. 39. Сечение 2-2 см. л. 39.
2. Фрагмент 1 см. л. 18.
3. Детали 1, 2... см. л. 13.
4. Примечания к узлу 15/Р1 см. л. 39.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	40	

Сечение 1-1 к узлу 15/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

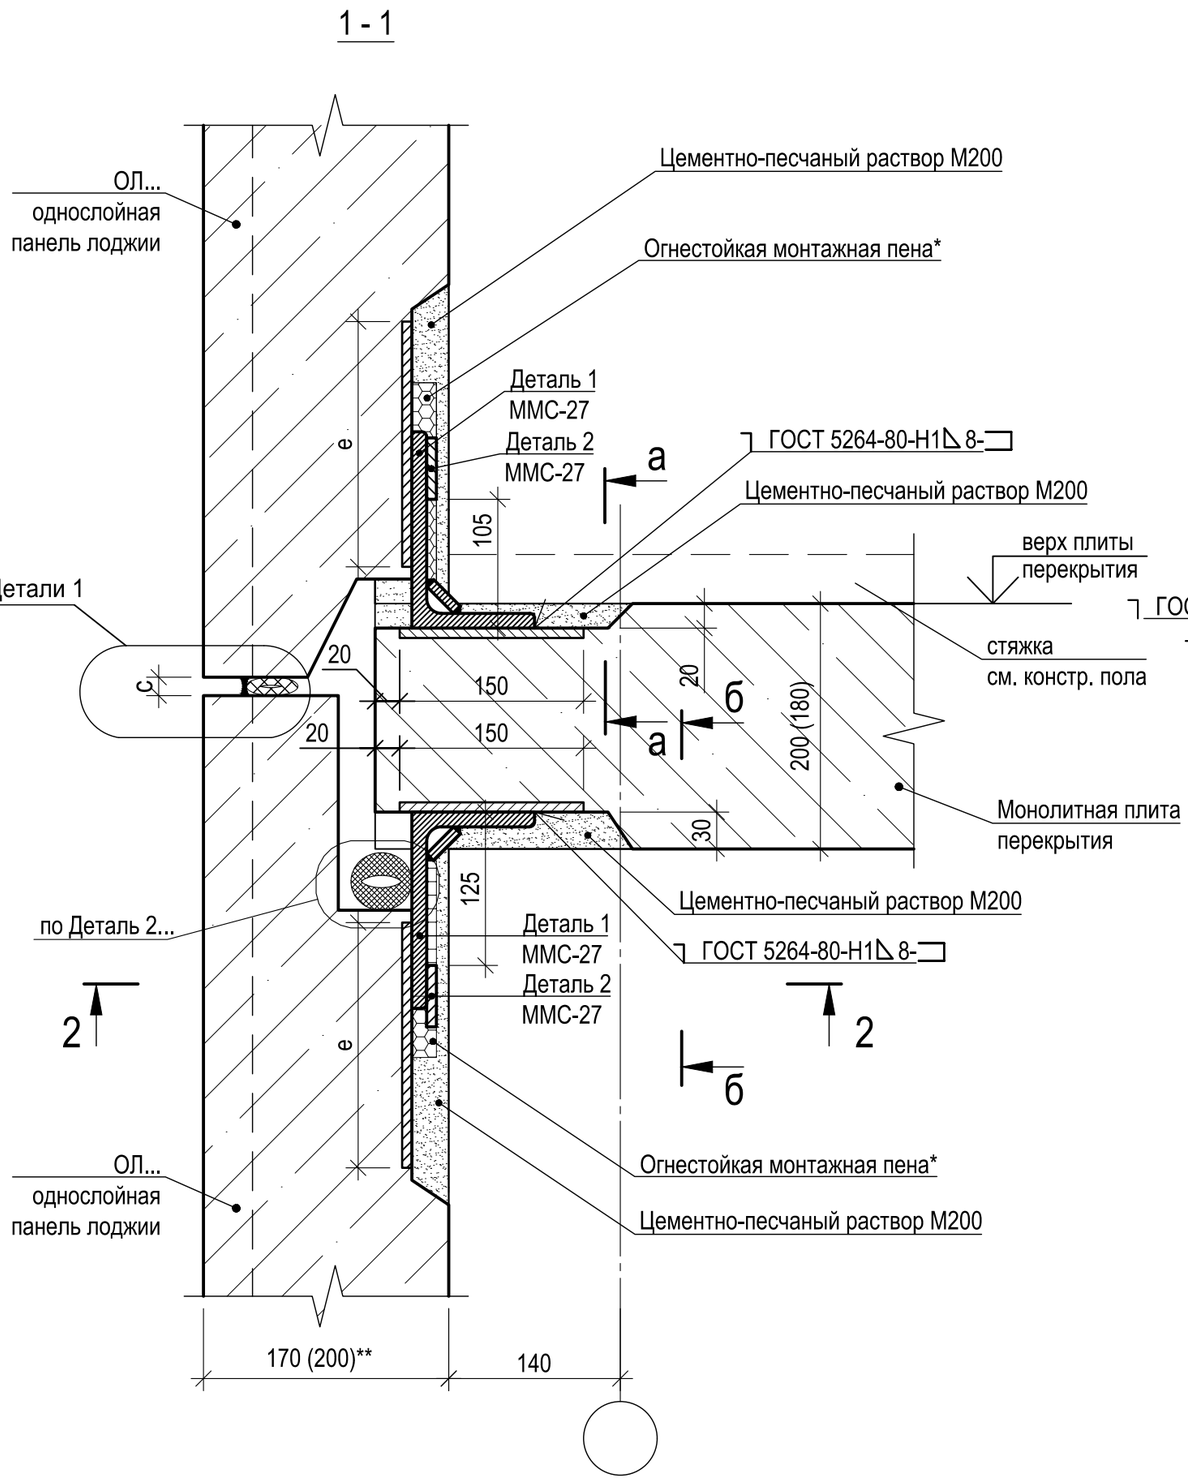

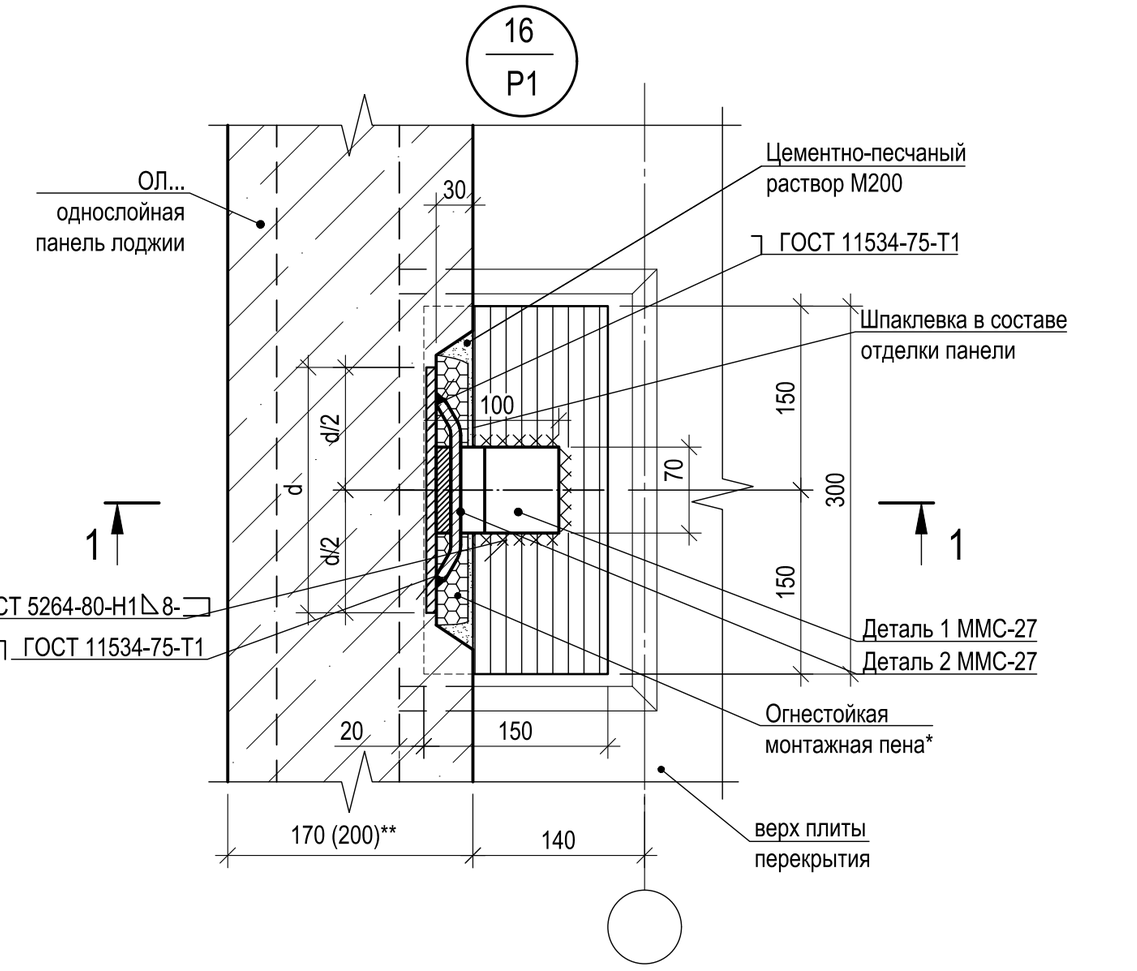

1. Узел 16/Р1 применяется для лоджии без остекления и без защиты от проникновения влаги атмосферных осадков в горизонтальный шов между панелями.
2. Величину толщин горизонтального (c) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сечения 2-2, а-а и б-б см. л. 42.
4. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. Спецификацию к узлу 16/Р1 см. л. 42.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. Детали 1, 2... см. л. 13.
10. Ширина пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 200 мм, высота пластины закладной детали в наружной панели (e) не менее 180 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	41	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 16/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


2 - 2

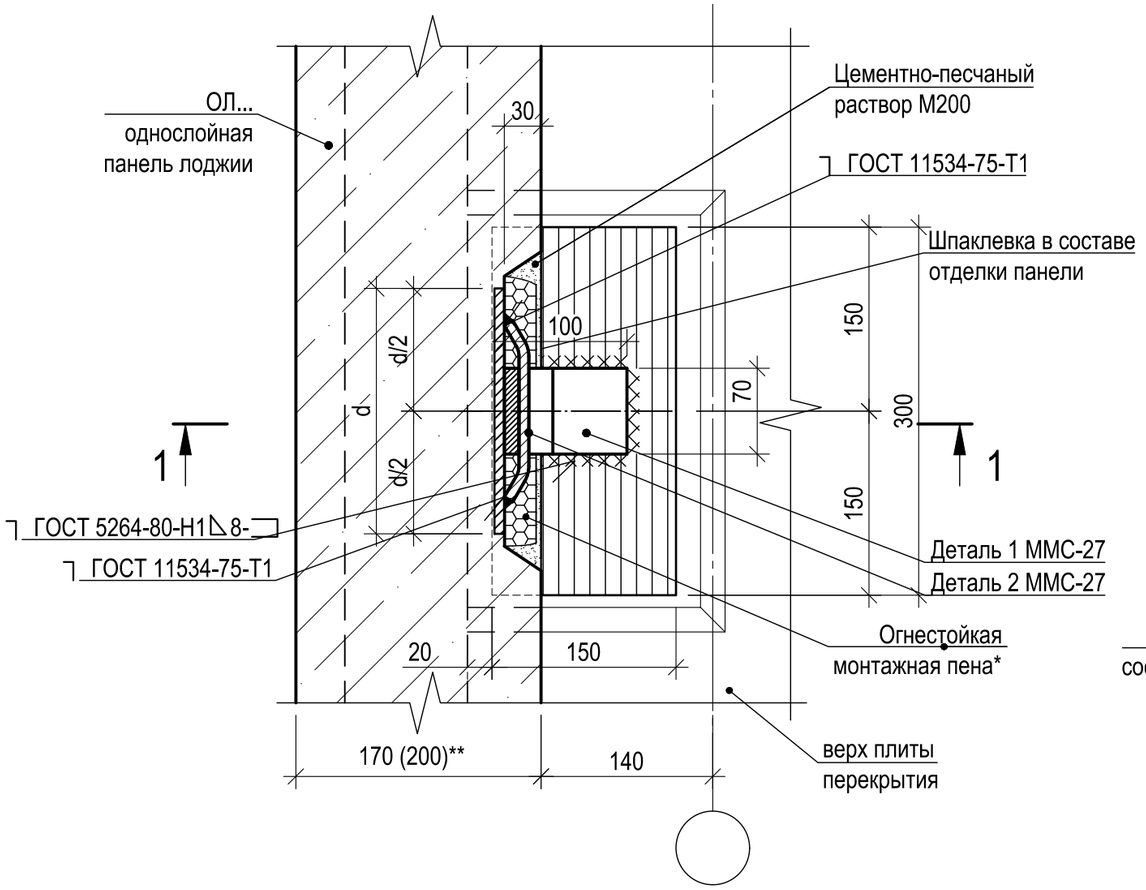

а - а

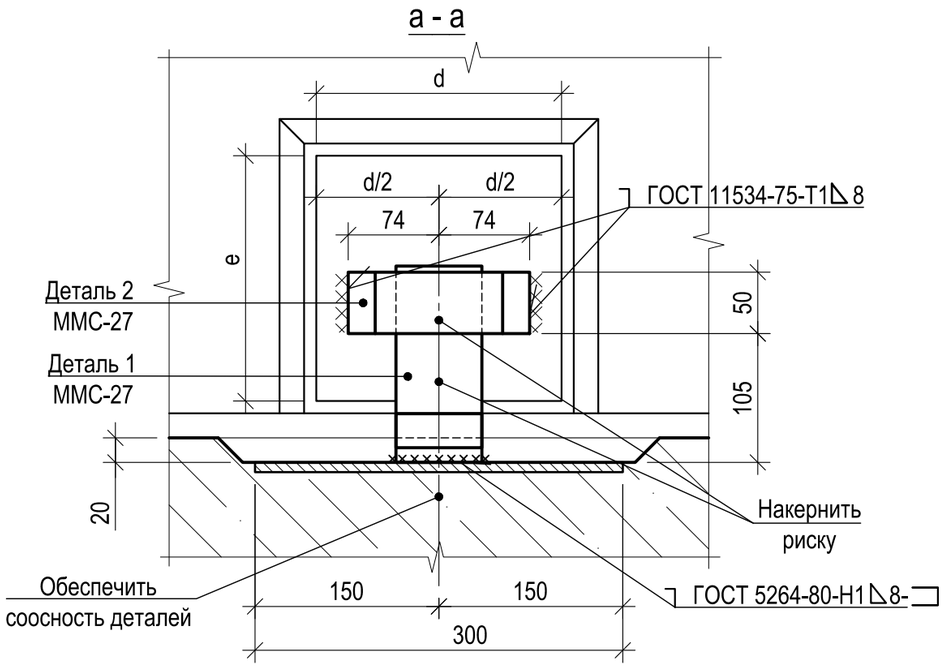

б - б

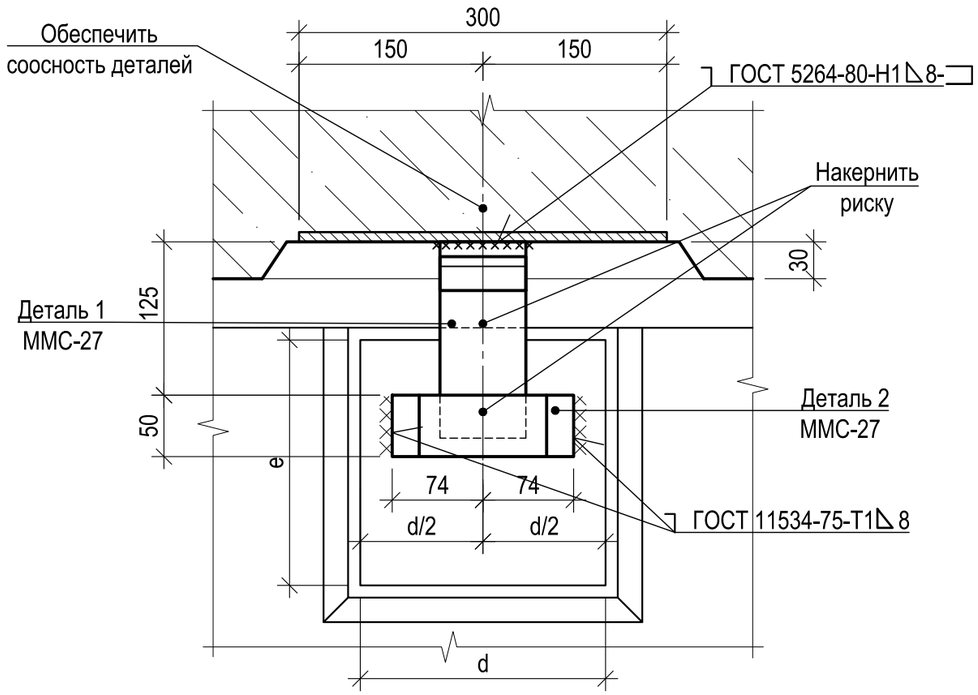

1. Сечение 1-1 к узлу 16/Р1 см. л. 41, к узлу 18/Р1 см. л. 45.
2. Сечения 2-2, а-а и б-б замаркированы на л. 41, 45.
3. Примечания к узлу 16/Р1 см. л. 41, к узлу 18/Р1 см. л. 45.
4. Ширина пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 200 мм, высота пластины закладной детали в наружной панели (e) не менее 180 мм.

Спецификация к узлам 16/Р1, 18/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-27	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-27	2	2,25	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		м³
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	42	

Сечение 2-2 к узлам 16/Р1, 18/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

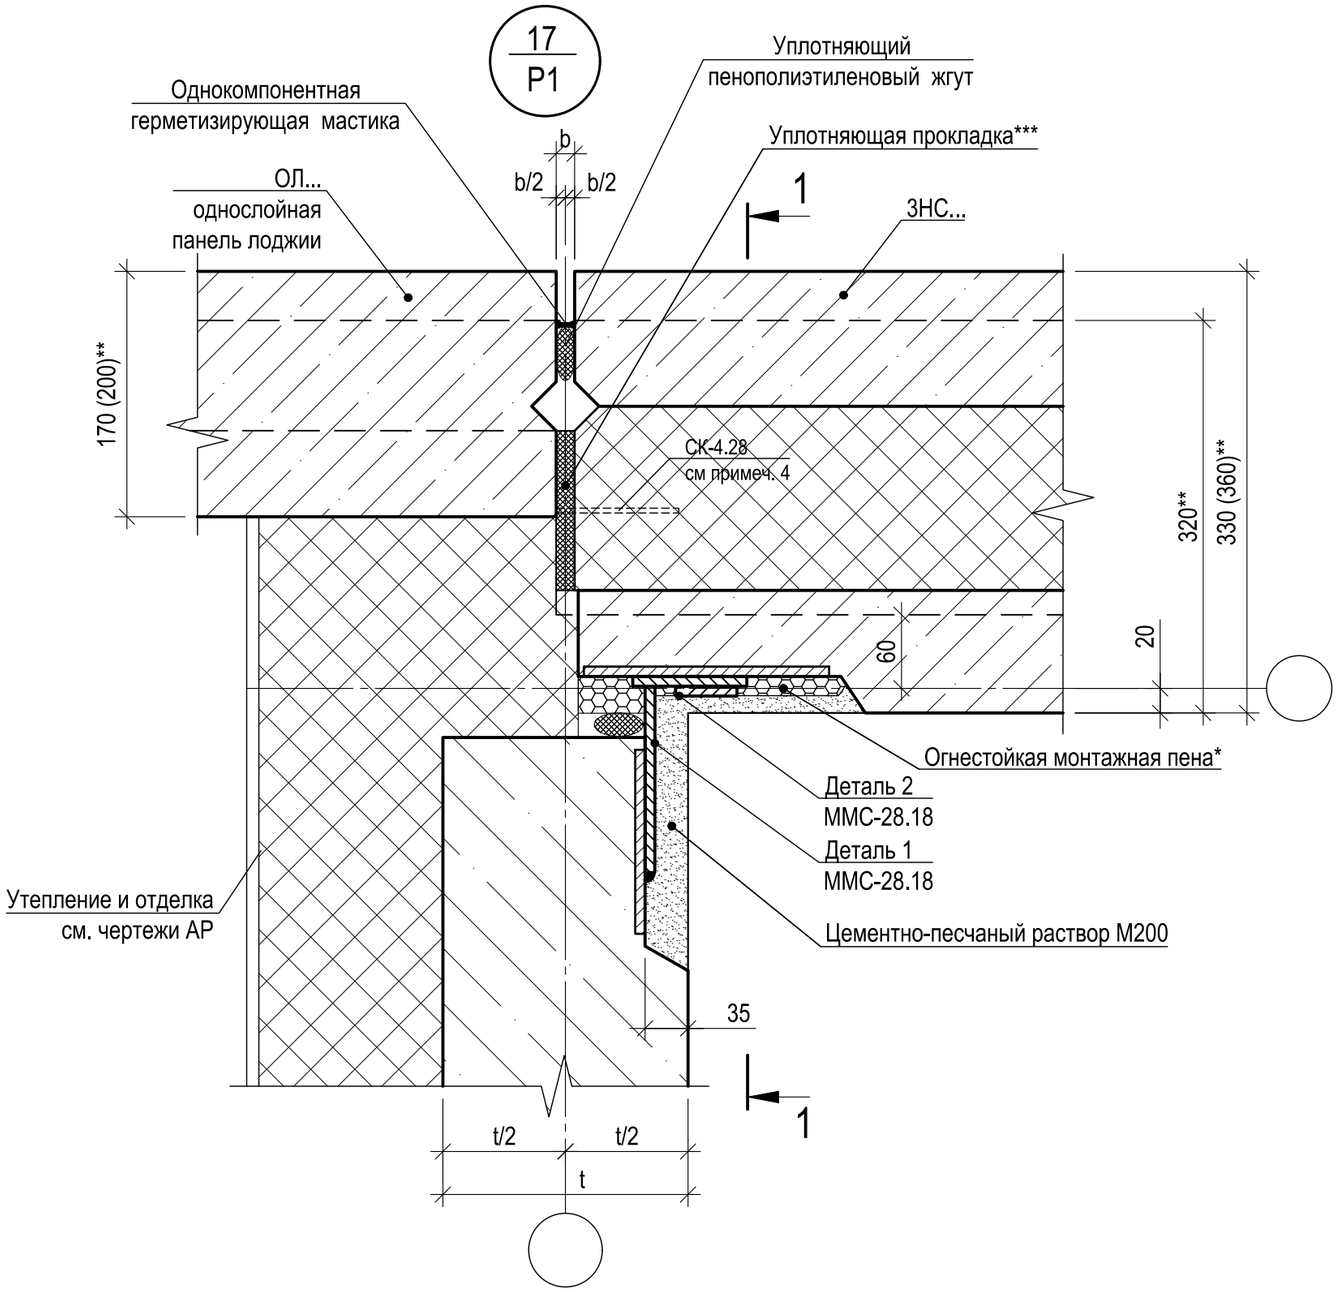

1. Сечение 1-1 см. л. 44.
2. Величины толщин вертикального (b), горизонтального (c) швов между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. Спецификацию к узлу 17/Р1 см. л. 44.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	43	
Узел 17/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

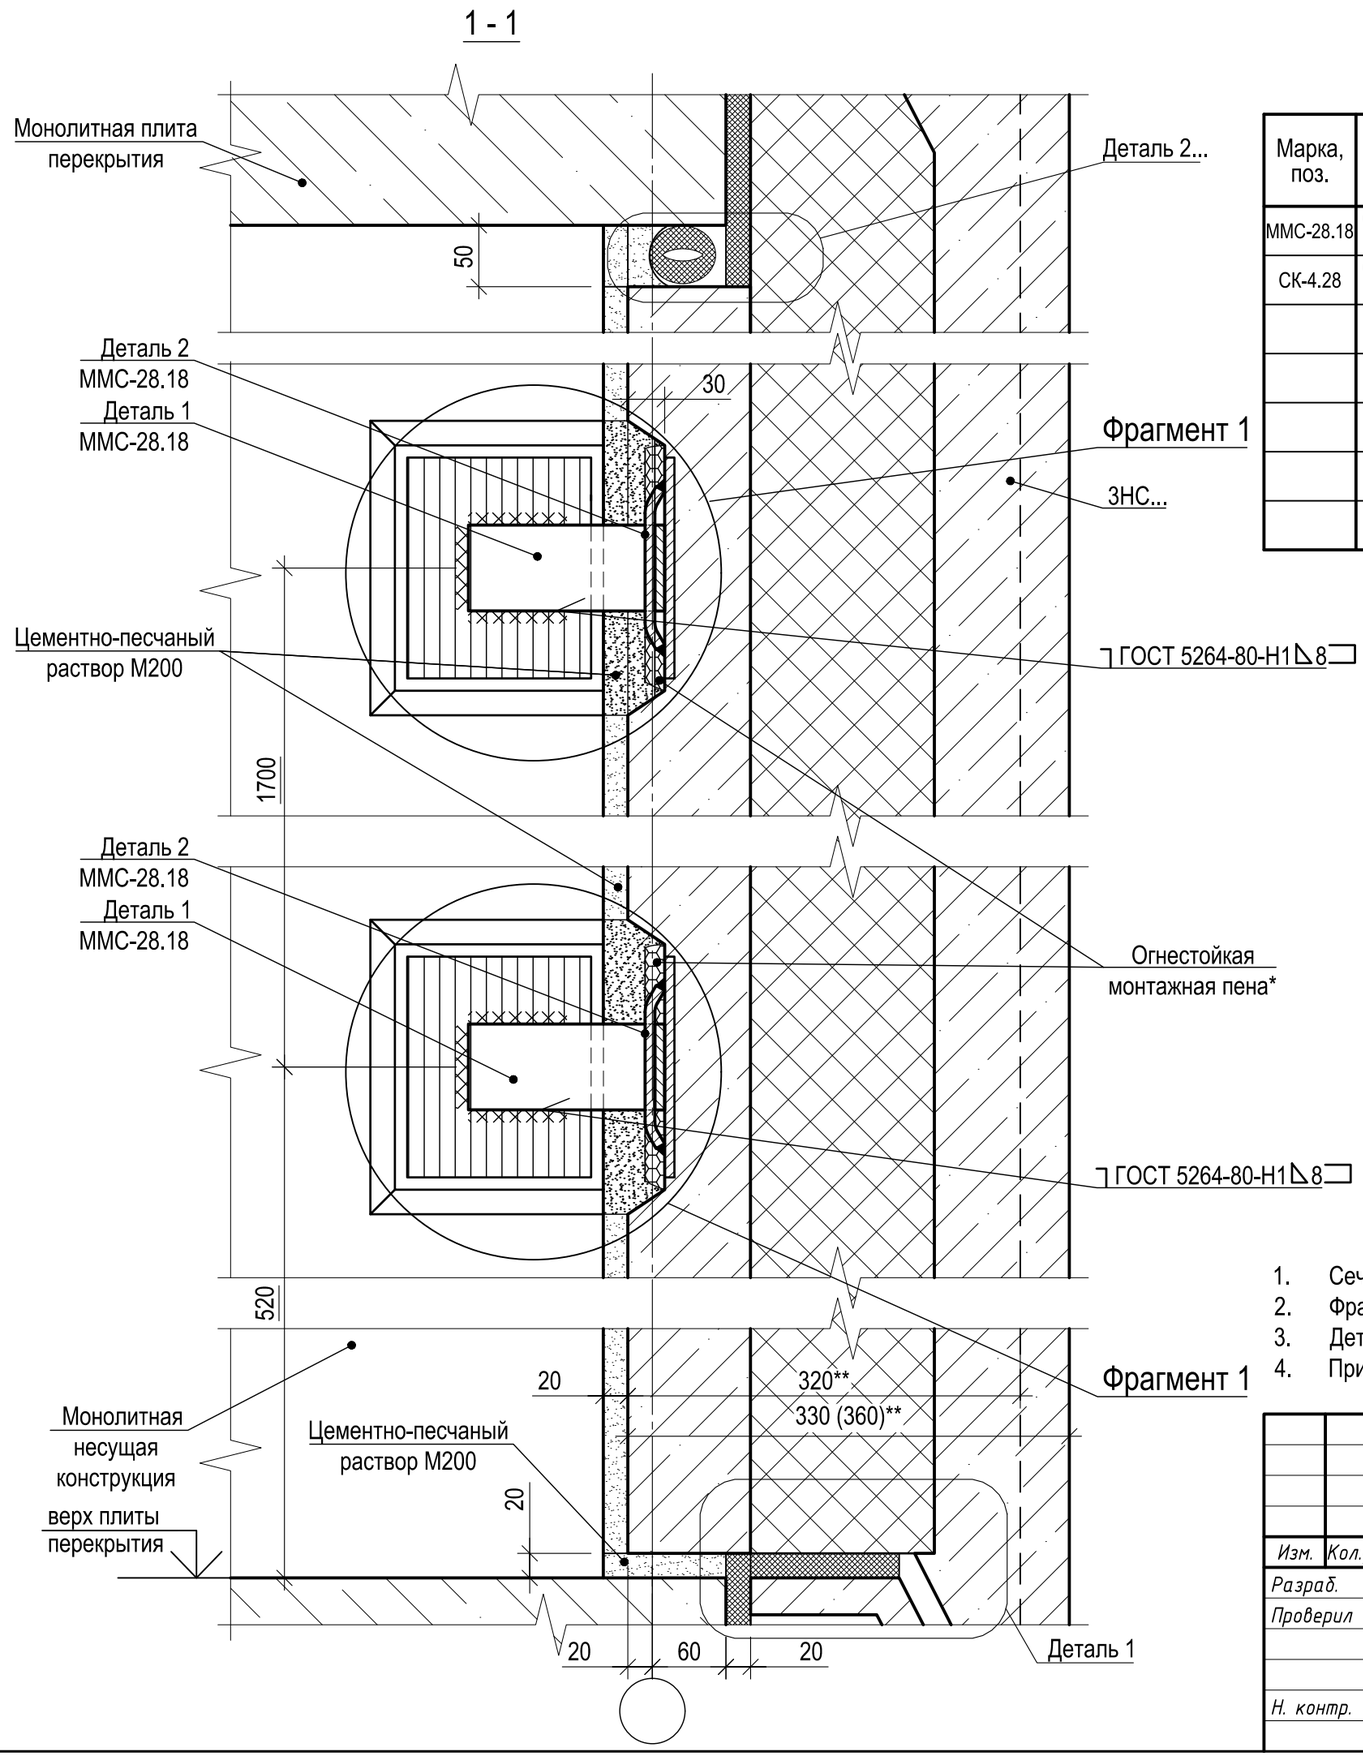

Спецификация к узлу 17/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	2	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,006		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	9,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0008		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0056		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

1. Сечение 1-1 замаркировано на л. 43.
2. Фрагмент 1 см. л. 18.
3. Детали 1, 2... см. л. 13.
4. Примечания к узлу 17/Р1 см. л. 43.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	44	

Сечение 1-1 к узлу 17/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

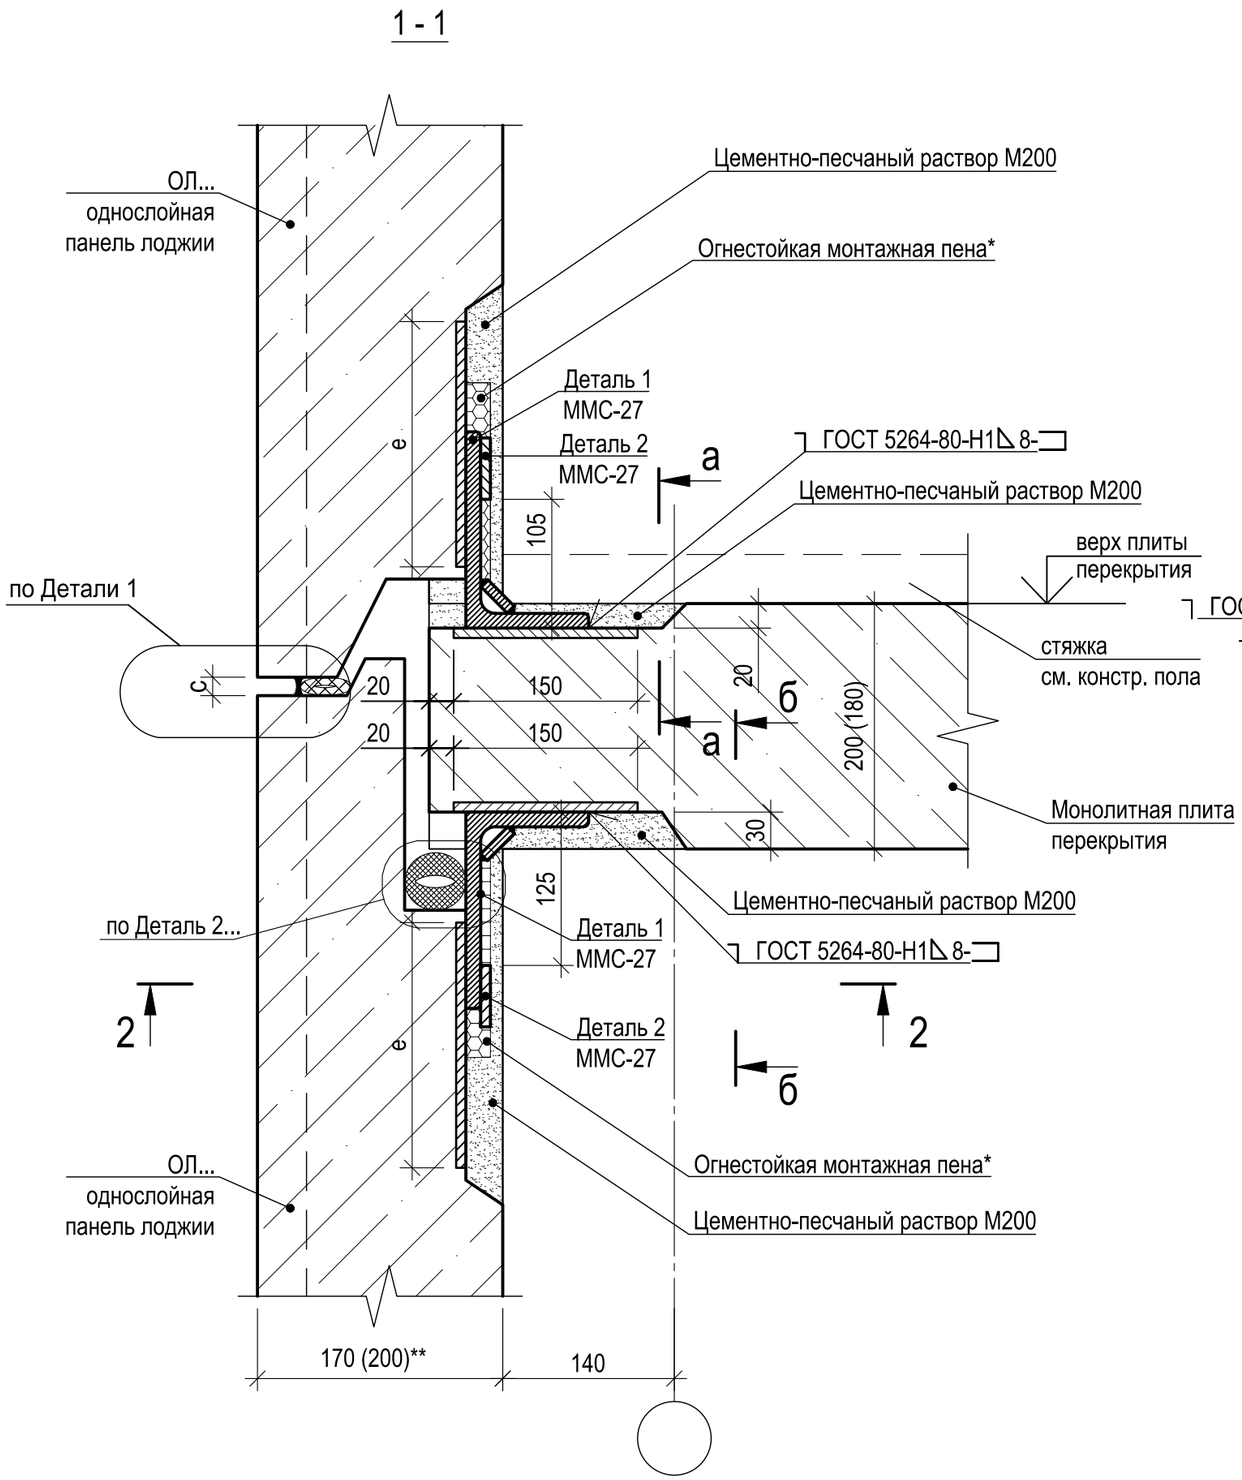

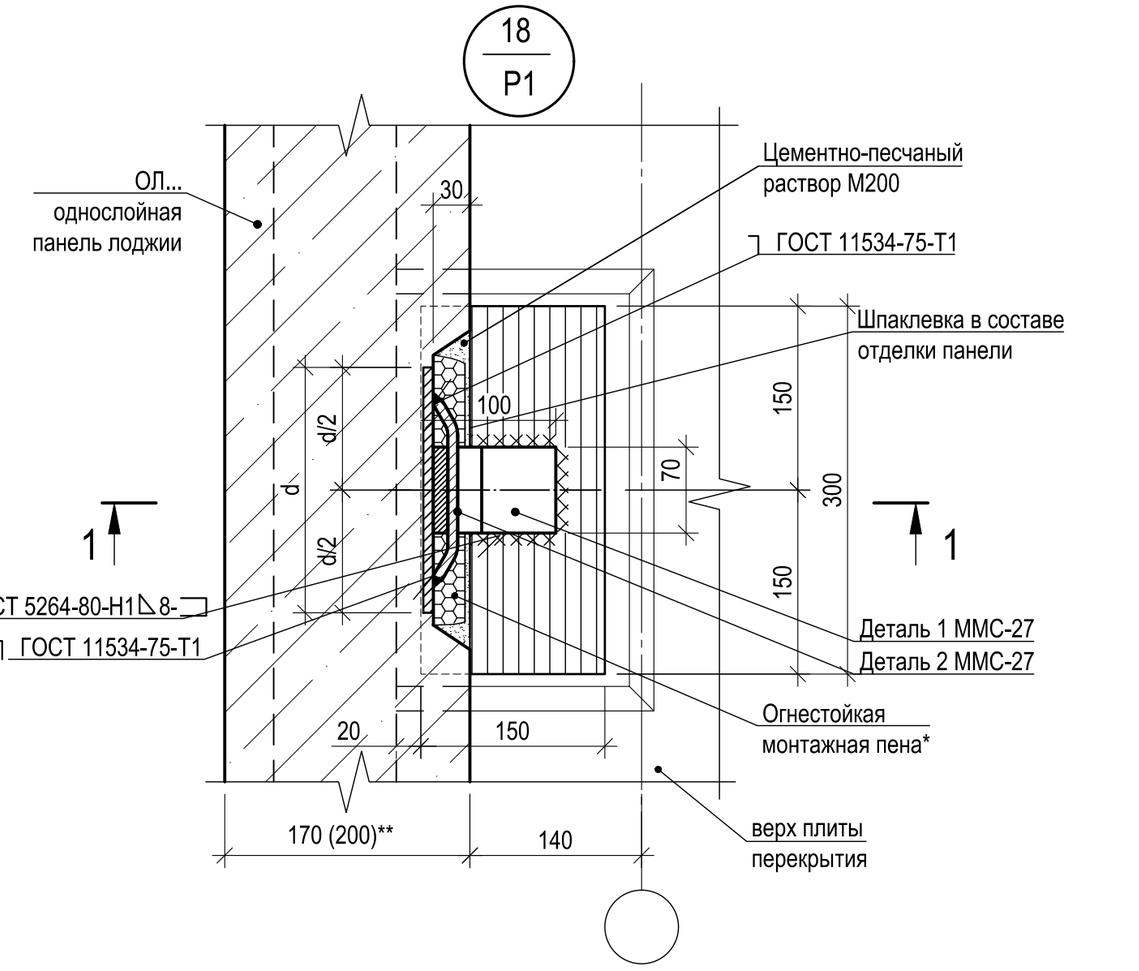

1. Узел 18/Р1 применяется для лоджии с наличием остекления и необходимостью защиты от проникновения влаги атмосферных осадков в горизонтальный шов между панелями.
2. Величину толщин горизонтального (с) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сечения 2-2, а-а и б-б см. л. 42.
4. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
5. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
6. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
7. Спецификацию к узлу 18/Р1 см. л. 42.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. Детали 1, 2... см. л. 13.
10. Ширина пластины закладной детали в наружной панели (d) не менее 200 мм, высота пластины закладной детали в наружной панели (e) не менее 180 мм.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака


Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	45	

Узел 18/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

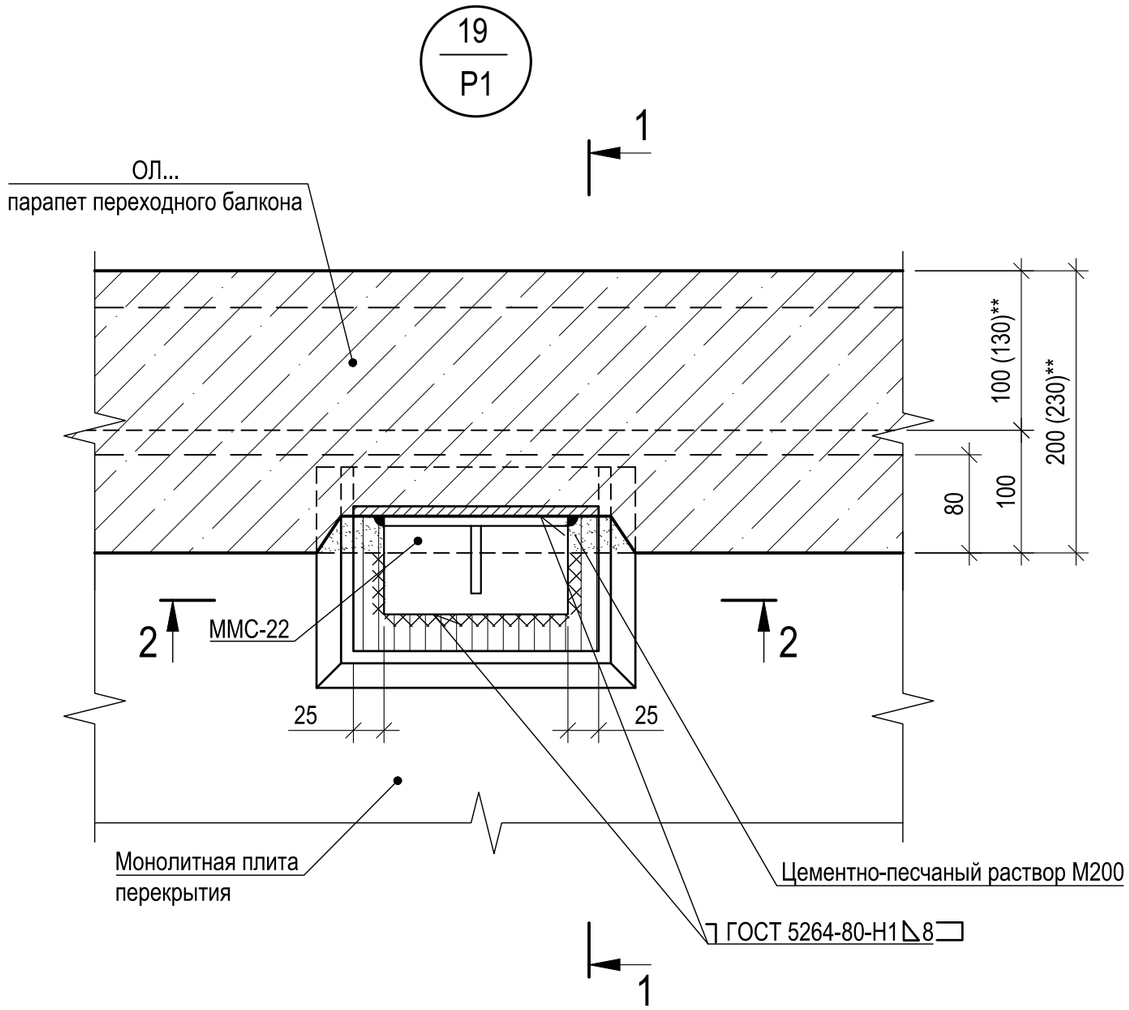

1. Сечения 1-1, 2-2 см. л. 47.
2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
3. Спецификацию к узлу 19/Р1 см. л. 47.
4. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	46	

Узел 19/Р1


МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3


Спецификация к узлу 19/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-22	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	ММС-22	1	2,09	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,002		м³

1 - 1

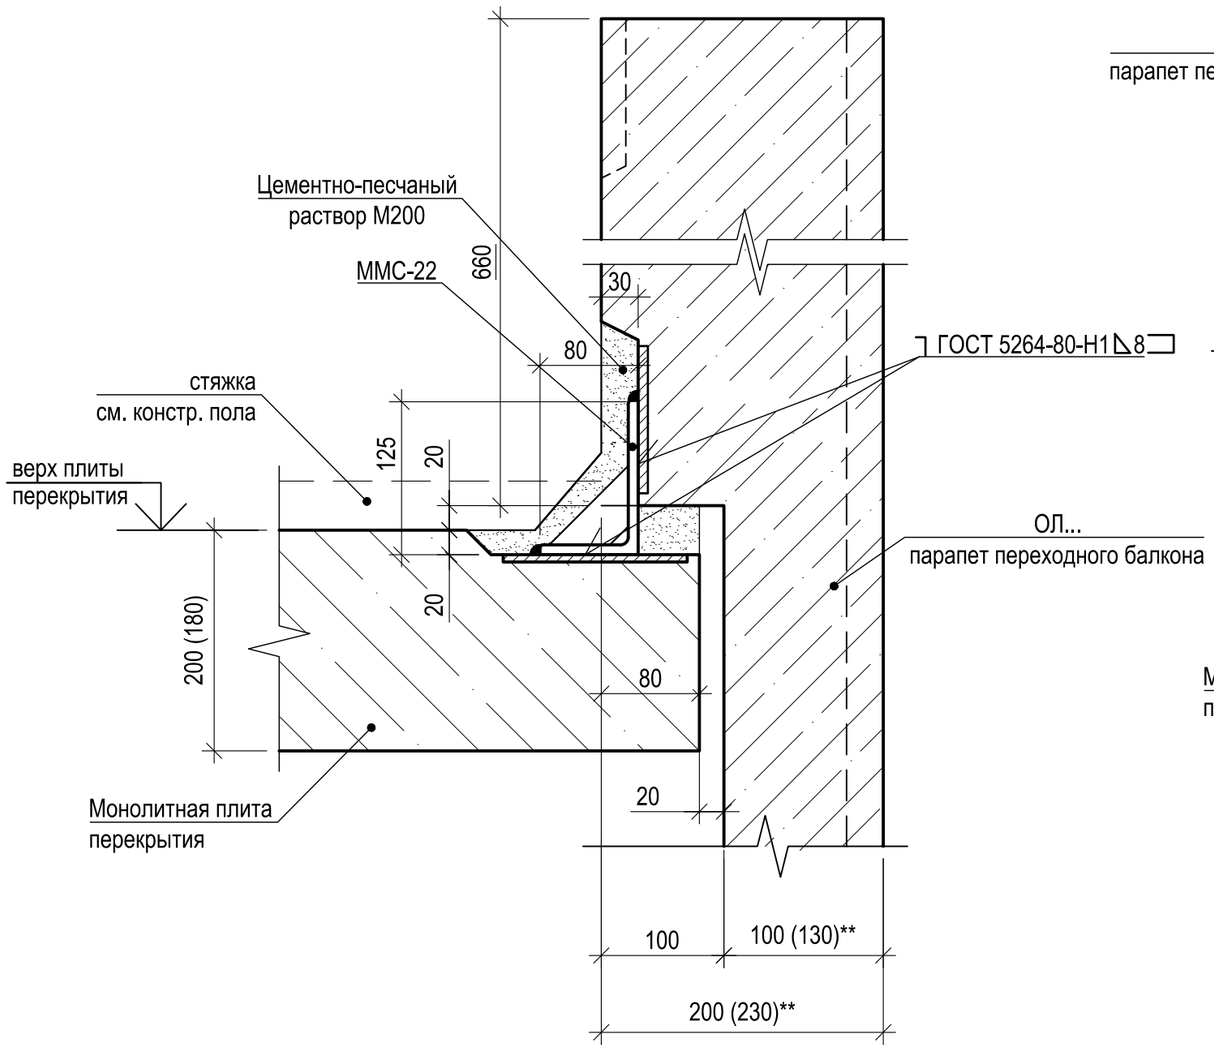

2 - 2

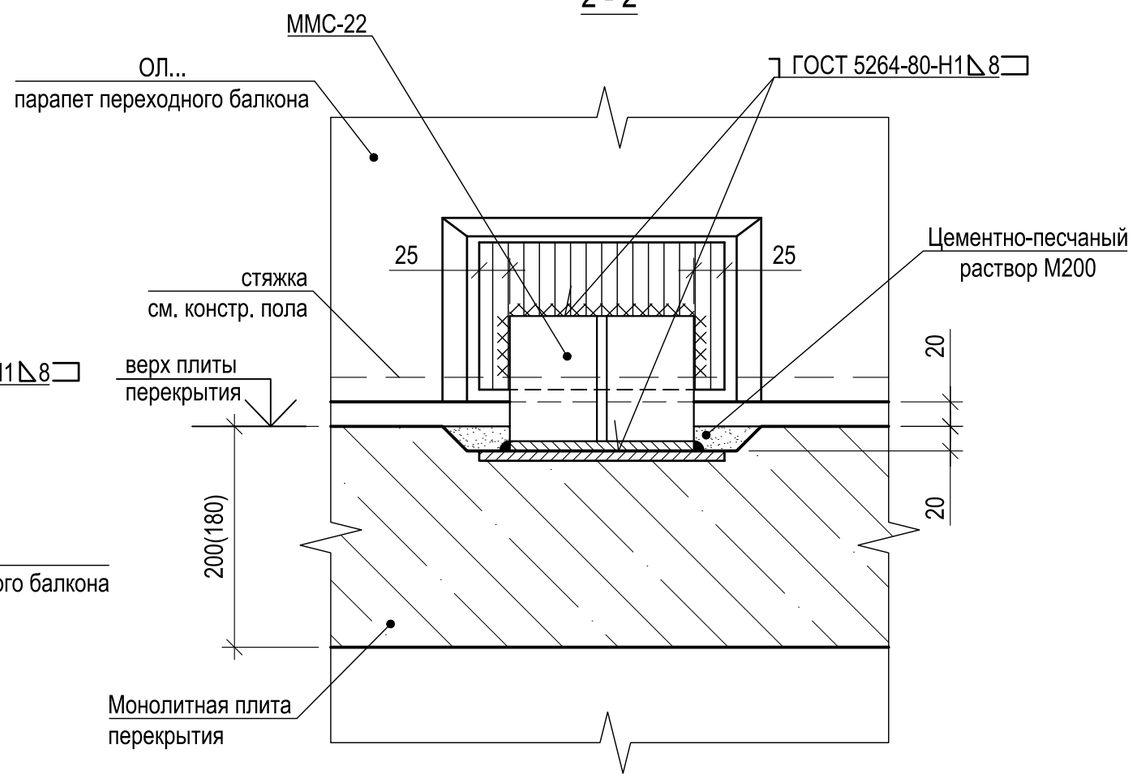

1. Сечения 1-1, 2-2 замаркированы на л. 46.
2. Примечания к узлу 19/Р1 см. л. 46.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	47	

Сечения 1-1, 2-2 к узлу 19/Р1

МФС Генеральный Подрядчик


Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

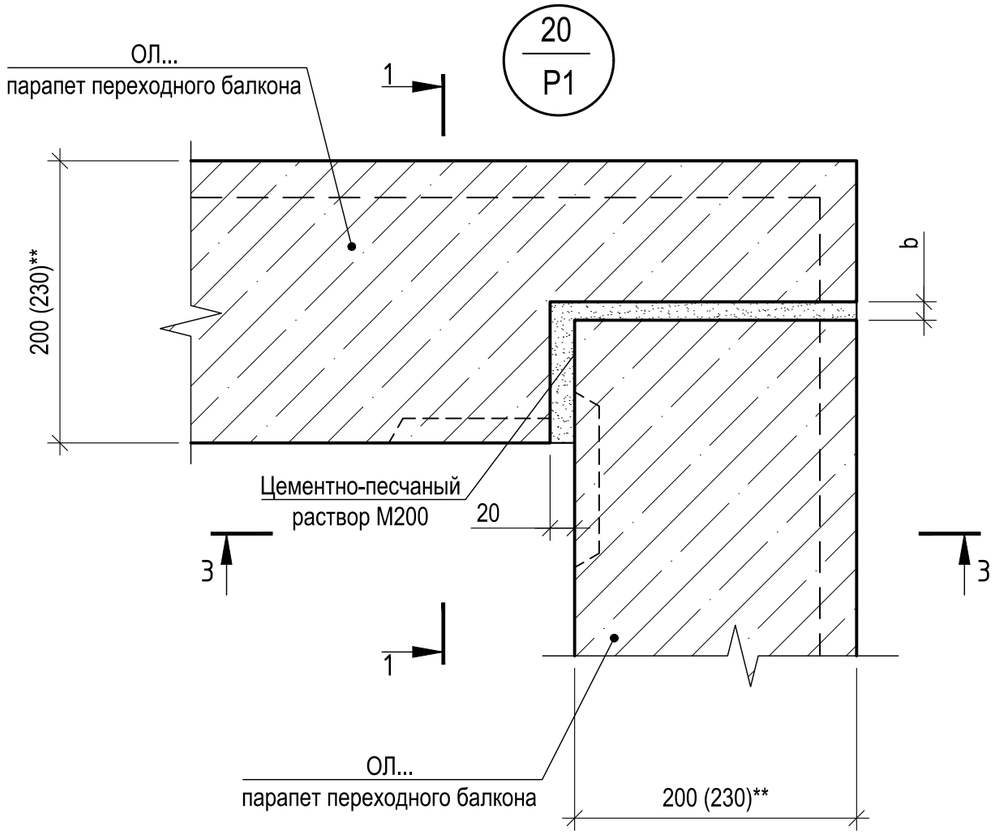

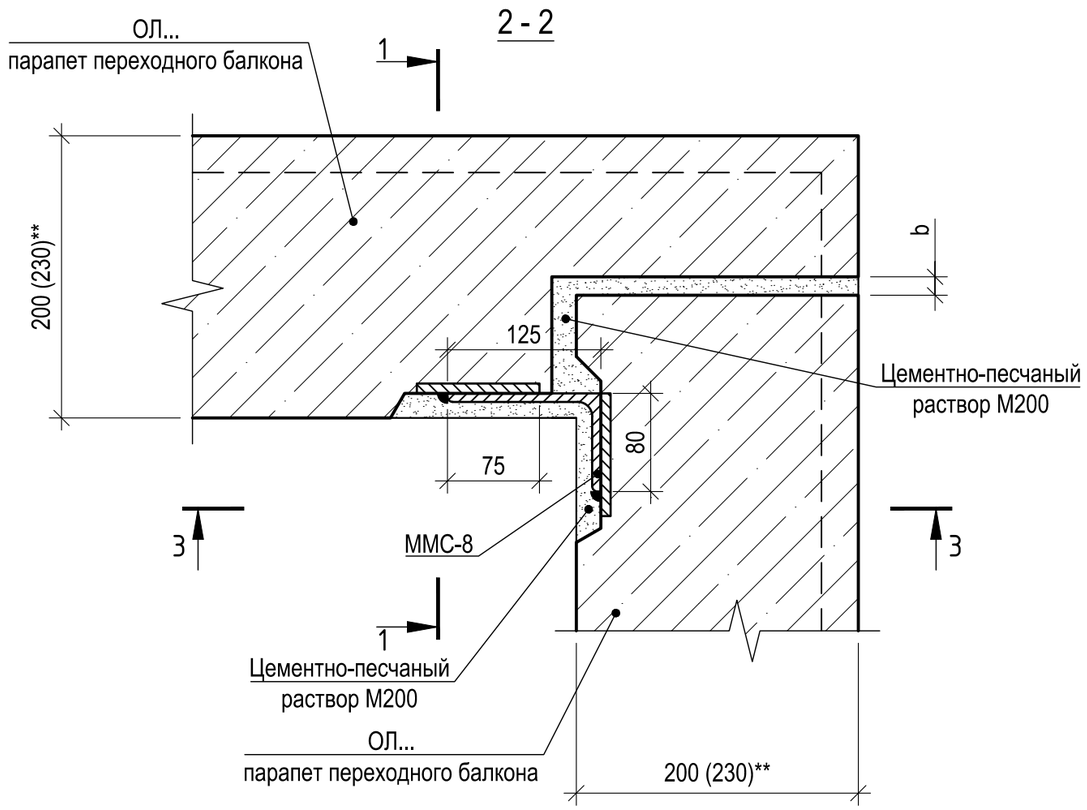

1. Сечения 1-1, 3-3 см. л. 49. Сечение 2-2 замаркировано на л. 49.
2. Величину толщины вертикального (b) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. Спецификацию к узлу 20/Р1 см. л. 49.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	48	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 20/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Формат А3


Спецификация к узлу 20/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-8	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	ММС-8	1	0,88	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,005		м³

1 - 1

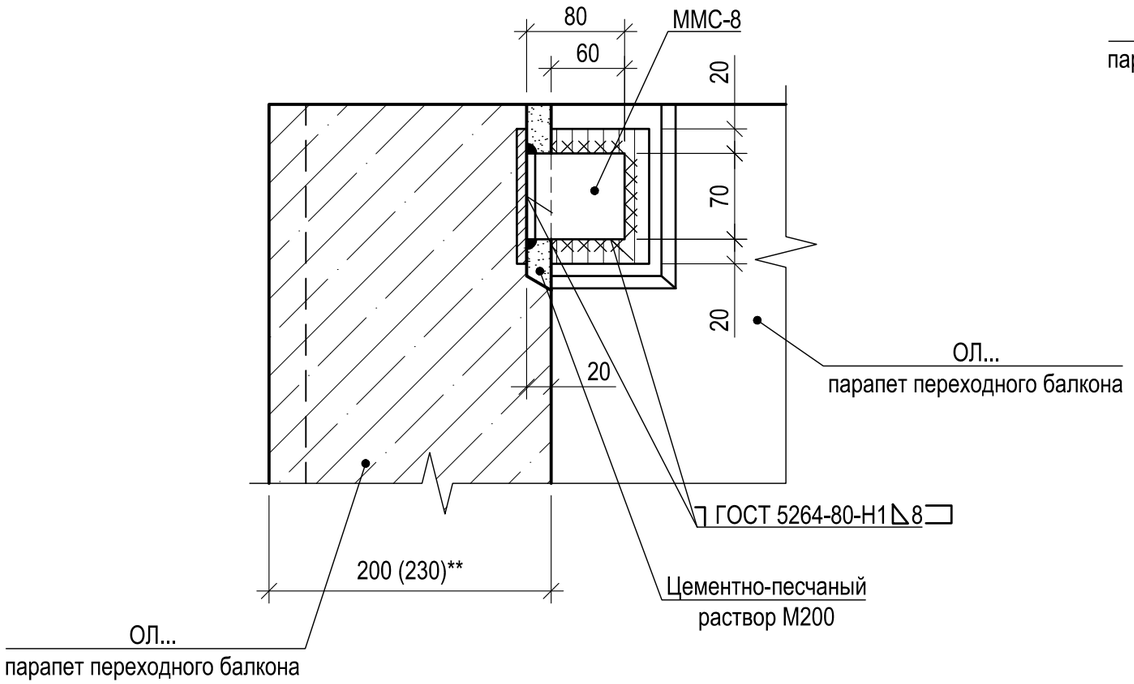

3 - 3

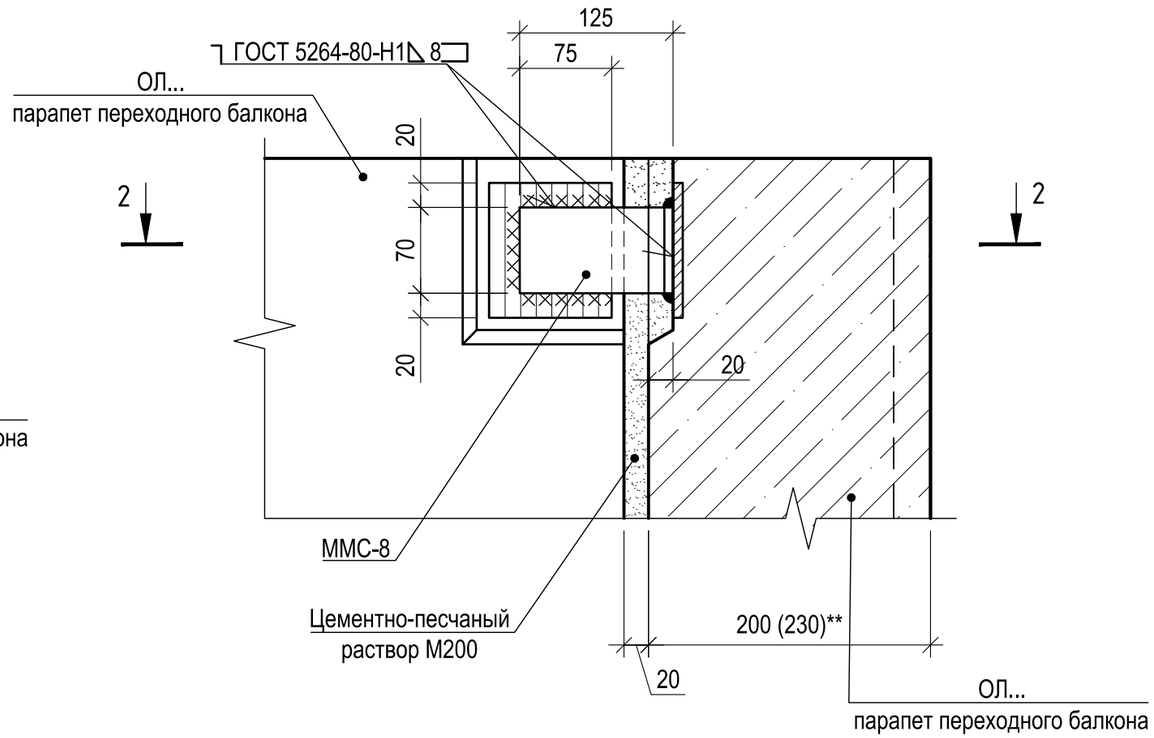

1. Сечения 1-1, 3-3 замаркированы на л. 48. Сечение 2-2 см. л. 48.
2. Примечания к узлу 20/Р1 см. л. 48.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	49	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Сечения 1-1, 3-3 к узлу 20/Р1	МФС	Генеральный Подрядчик	


Согласовано

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


21/Р1

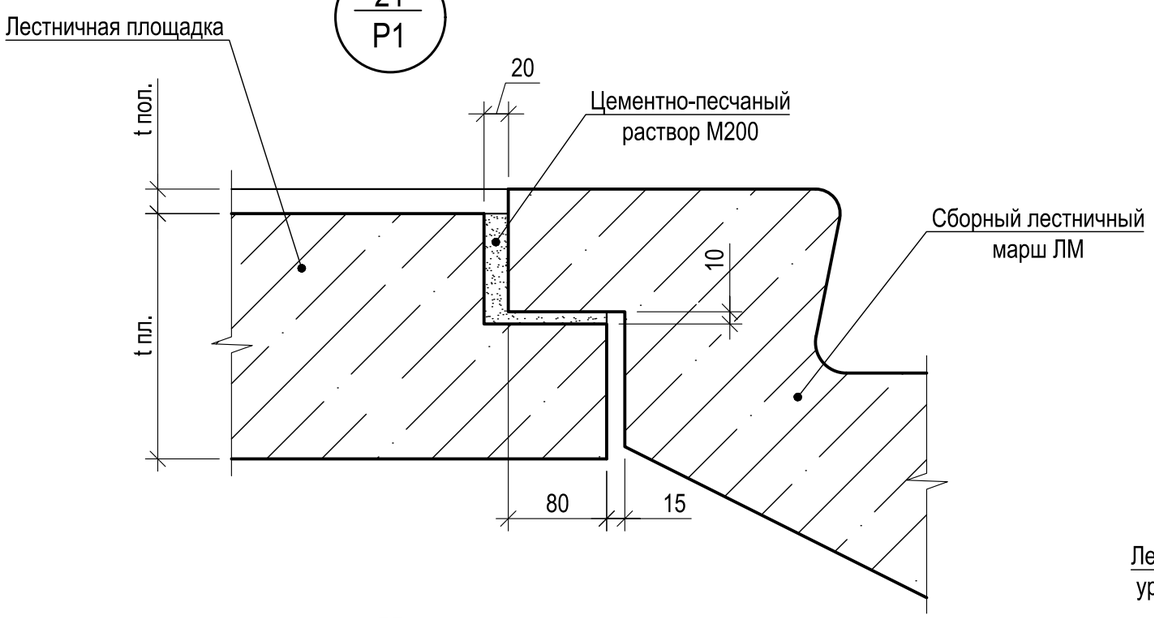


22/Р1

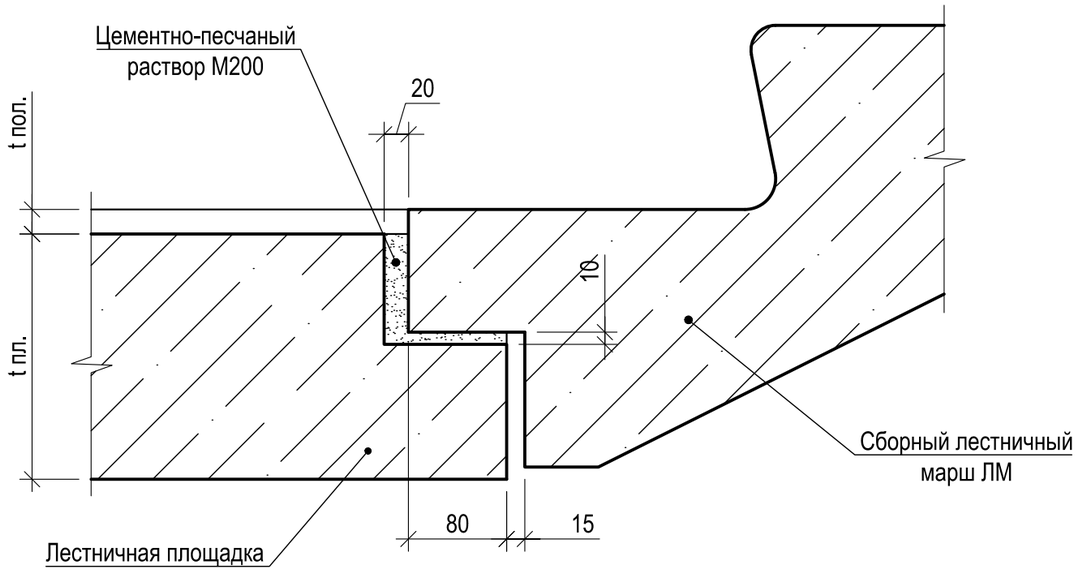

23/Р1

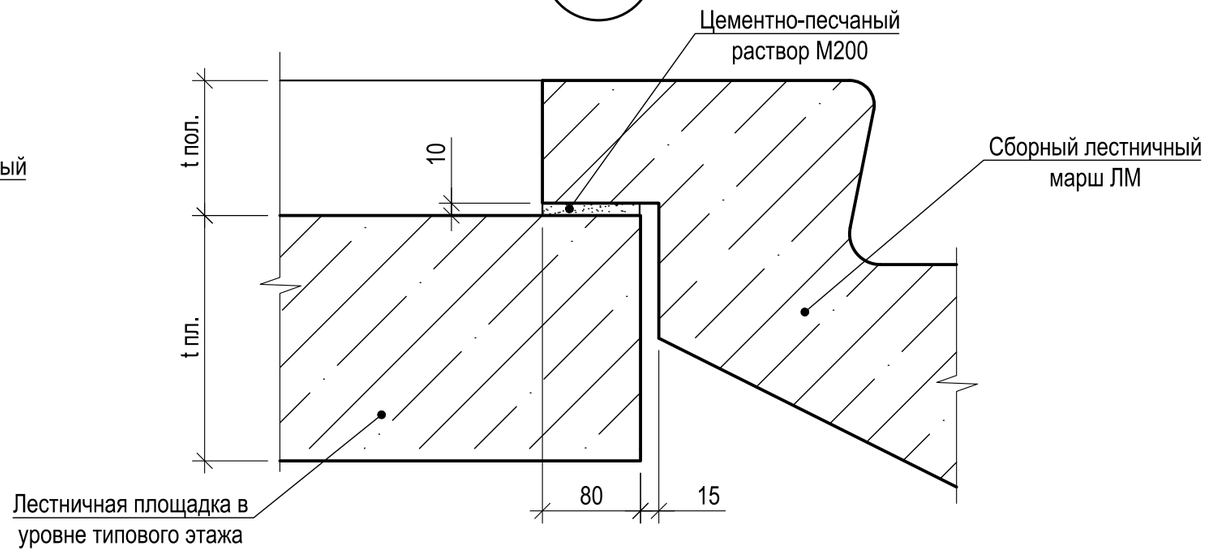

24/Р1

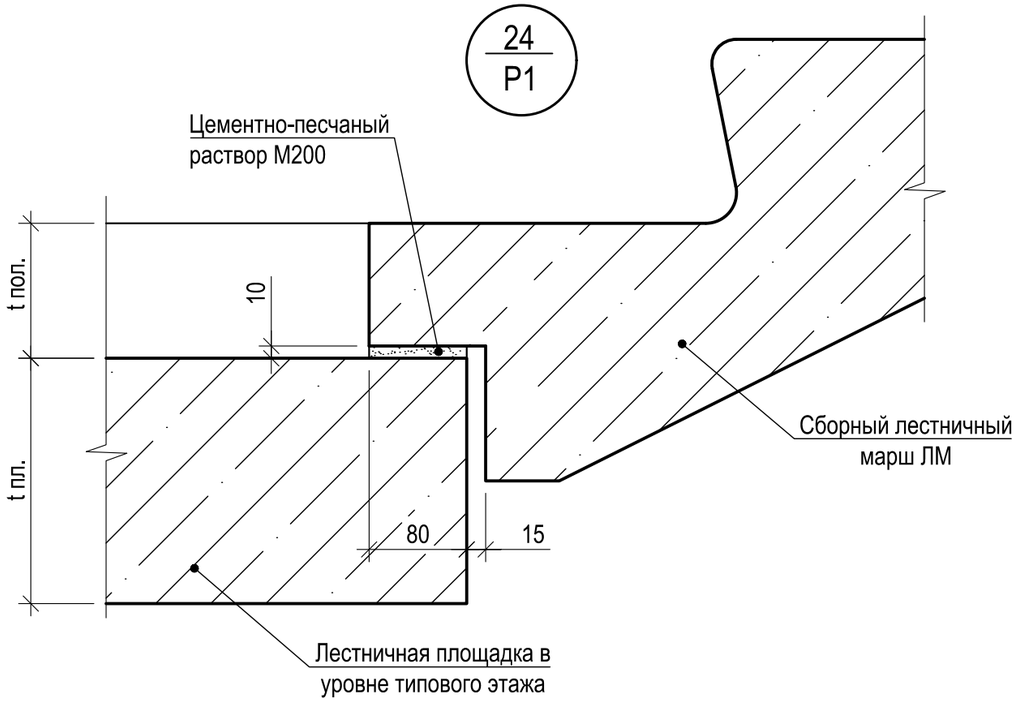

1. Спецификации к узлам 21/Р1, 22/Р1, 23/Р1, 24/Р1 см. л. 51.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ		
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака		
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия: Р	Лист: 50
Проверил		Мачехин			24.06.24			Листов:
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узлы 21/Р1, ..., 24/Р1	МФС Генеральный Подрядчик	

Согласовано


ВЗам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Формат А3

25
Р1

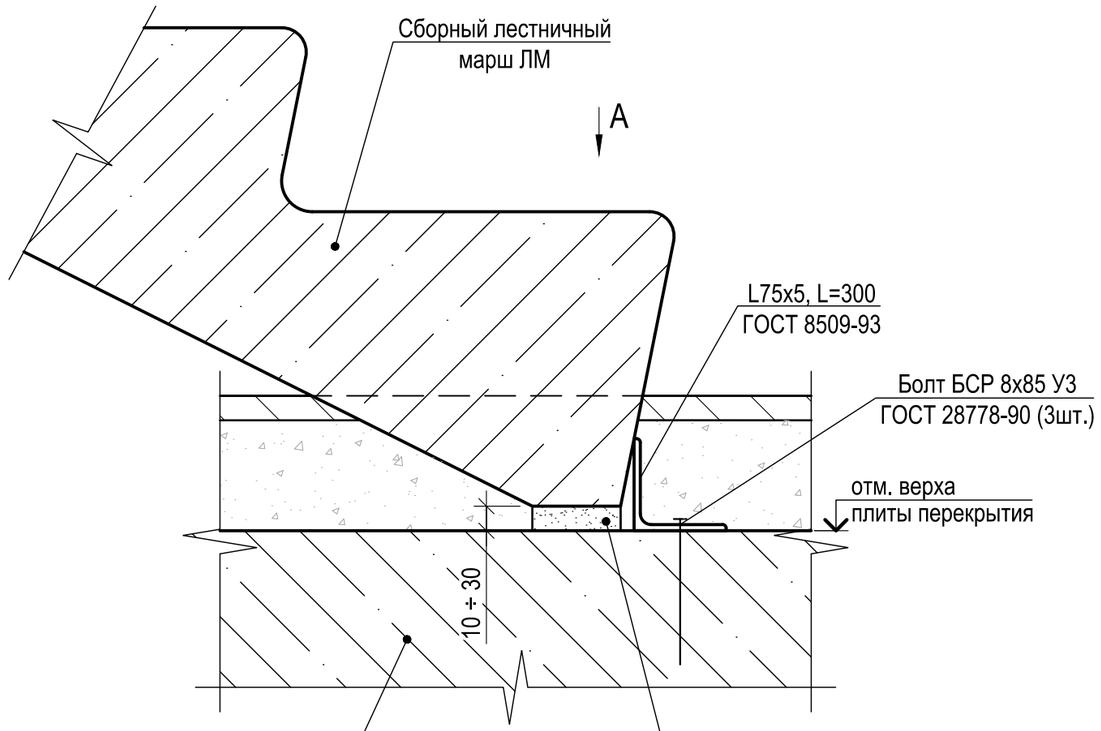

Вид А

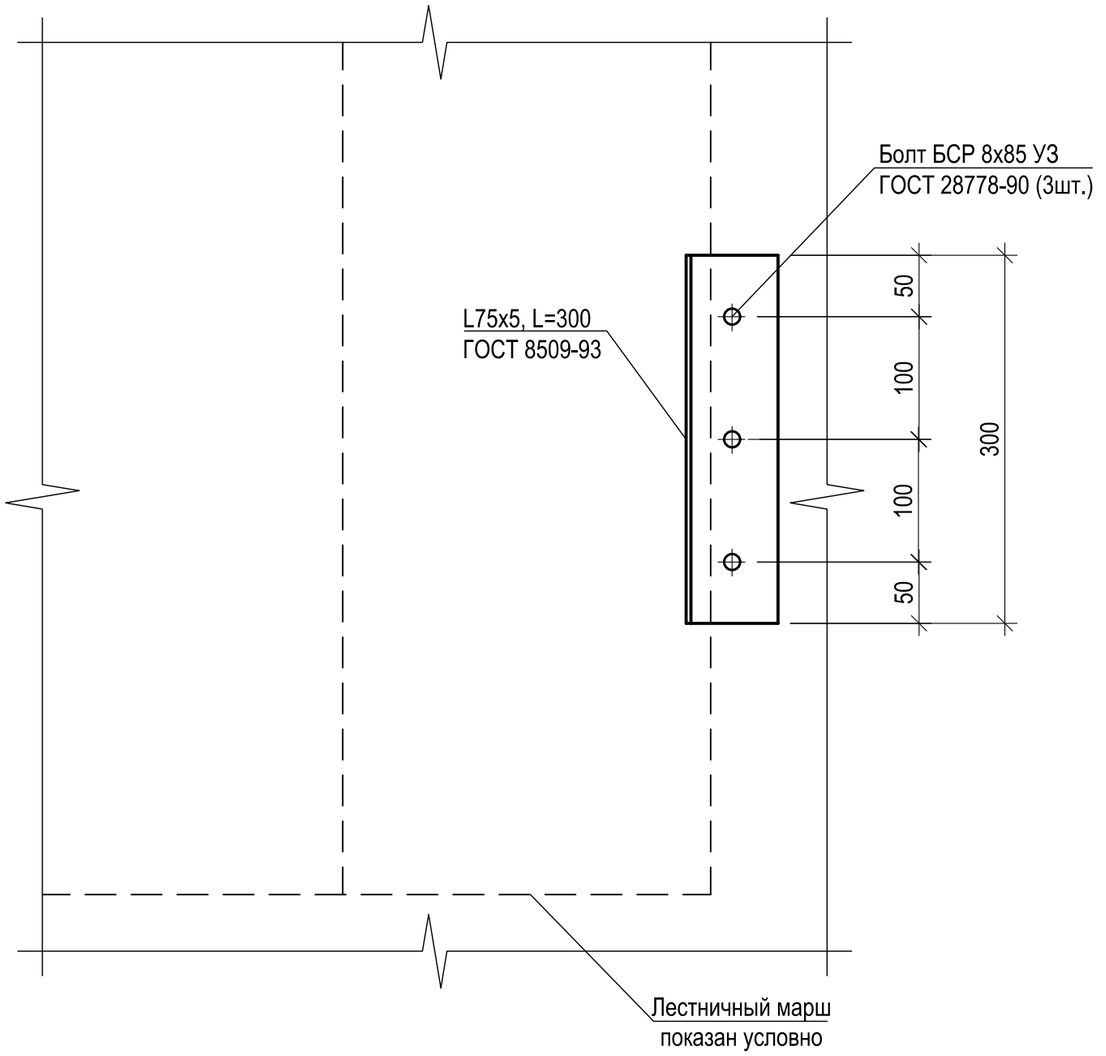

Групповая спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Узел 21/Р1			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,004		м³
		Узел 22/Р1			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,004		м³
		Узел 23/Р1			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,003		м³
		Узел 24/Р1			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,003		м³
		Узел 25/Р1			
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,001		м³
	ГОСТ 8509-93	Уголок L75x5, L=300	1		шт.
	ГОСТ 28778-90	Болт БСР 8х85 У3	3		шт.

1. Узлы 21/Р1, 22/Р1, 23/Р1, 24/Р1 см. л. 50.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	51	

Узел 25/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Согласовано


Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

26/P1

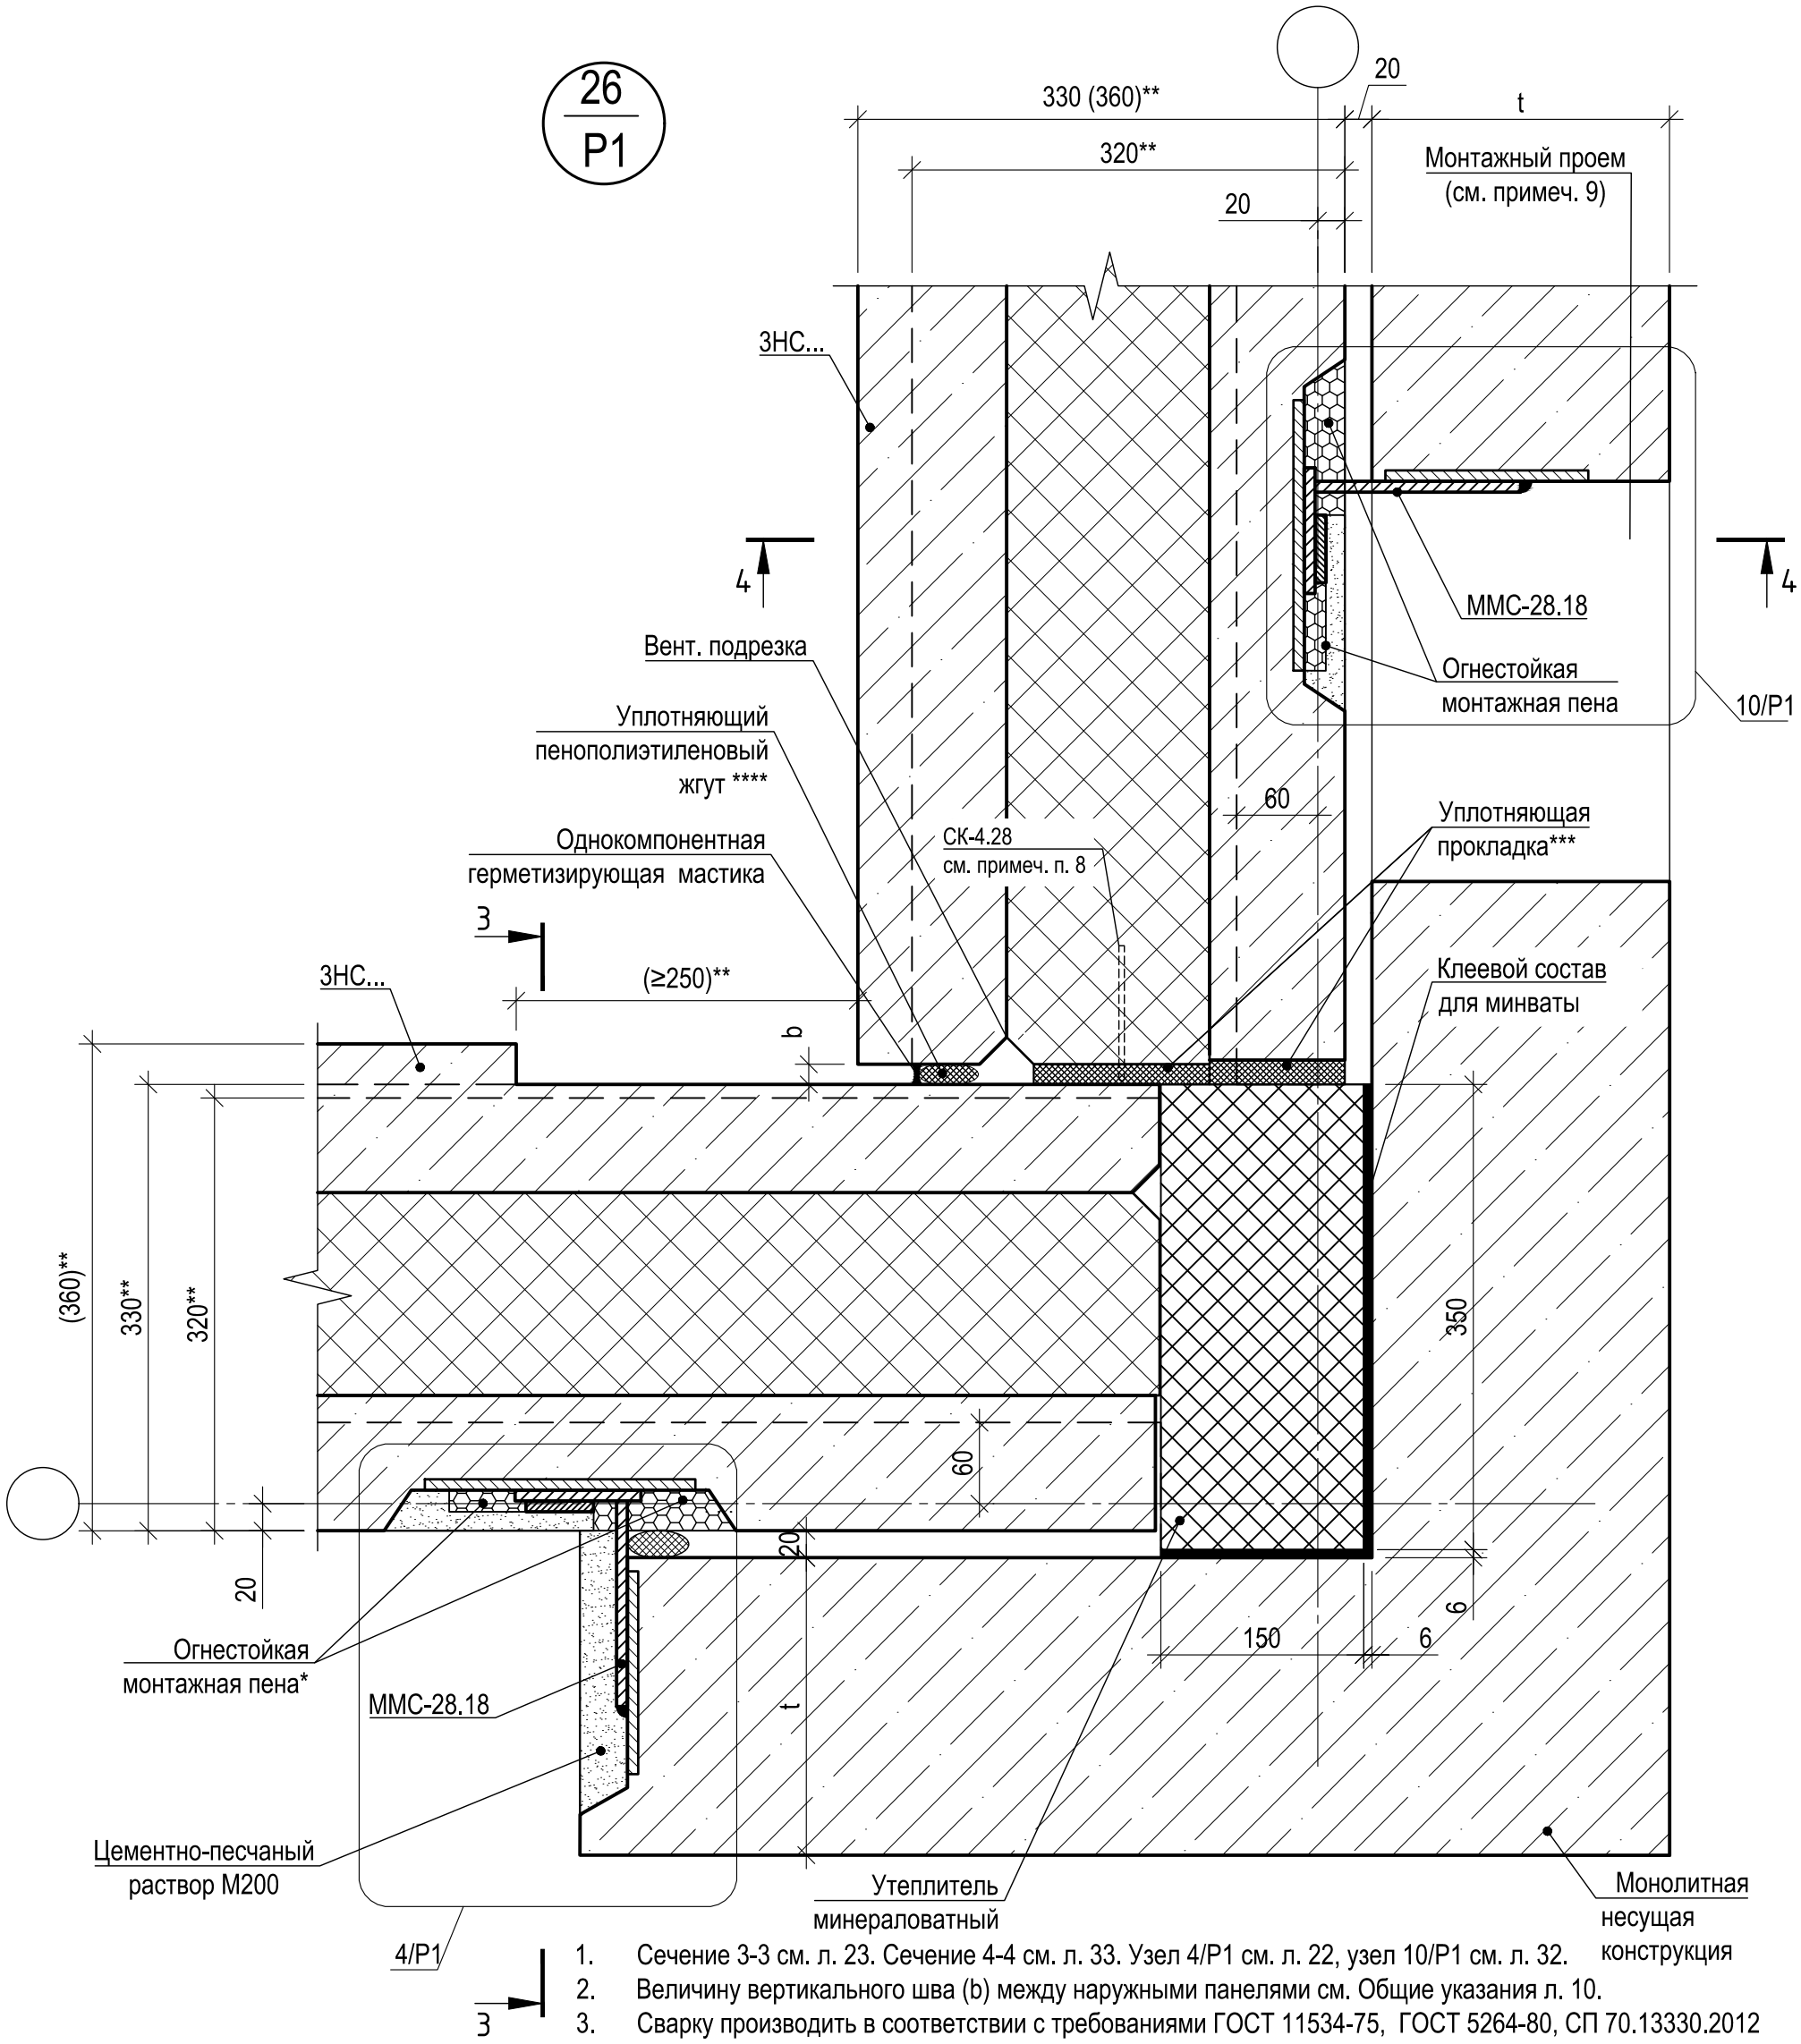

1. Сечение 3-3 см. л. 23. Сечение 4-4 см. л. 33. Узел 4/P1 см. л. 22, узел 10/P1 см. л. 32.
2. Величину вертикального шва (b) между наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
   Для угловой панели общей толщиной 360 мм обеспечить отсутствие выступающего кирпича на ширину не менее 250 мм от вертикального стыка.
6. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
7. **** - Диаметр жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
8. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
9. Монтажный проем после выполнения сварочных работ и заделки цементно-песчаным раствором заполнить кладкой из кирпича или ячеистых блоков на цементно-песчаном растворе, расход для заполнения проема 0,315 м^3.
10. Спецификацию к узлу 26/P1 см. л. 53.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ			
						Альбом типовых узлов. Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака			
Разраб.		Бакланов			24.06.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мачехин			24.06.24		Р	52	
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24	Узел 26/P1	МФС Генеральный Подрядчик		

Согласовано:
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

26/Р1

(в уровне плиты перекрытия)

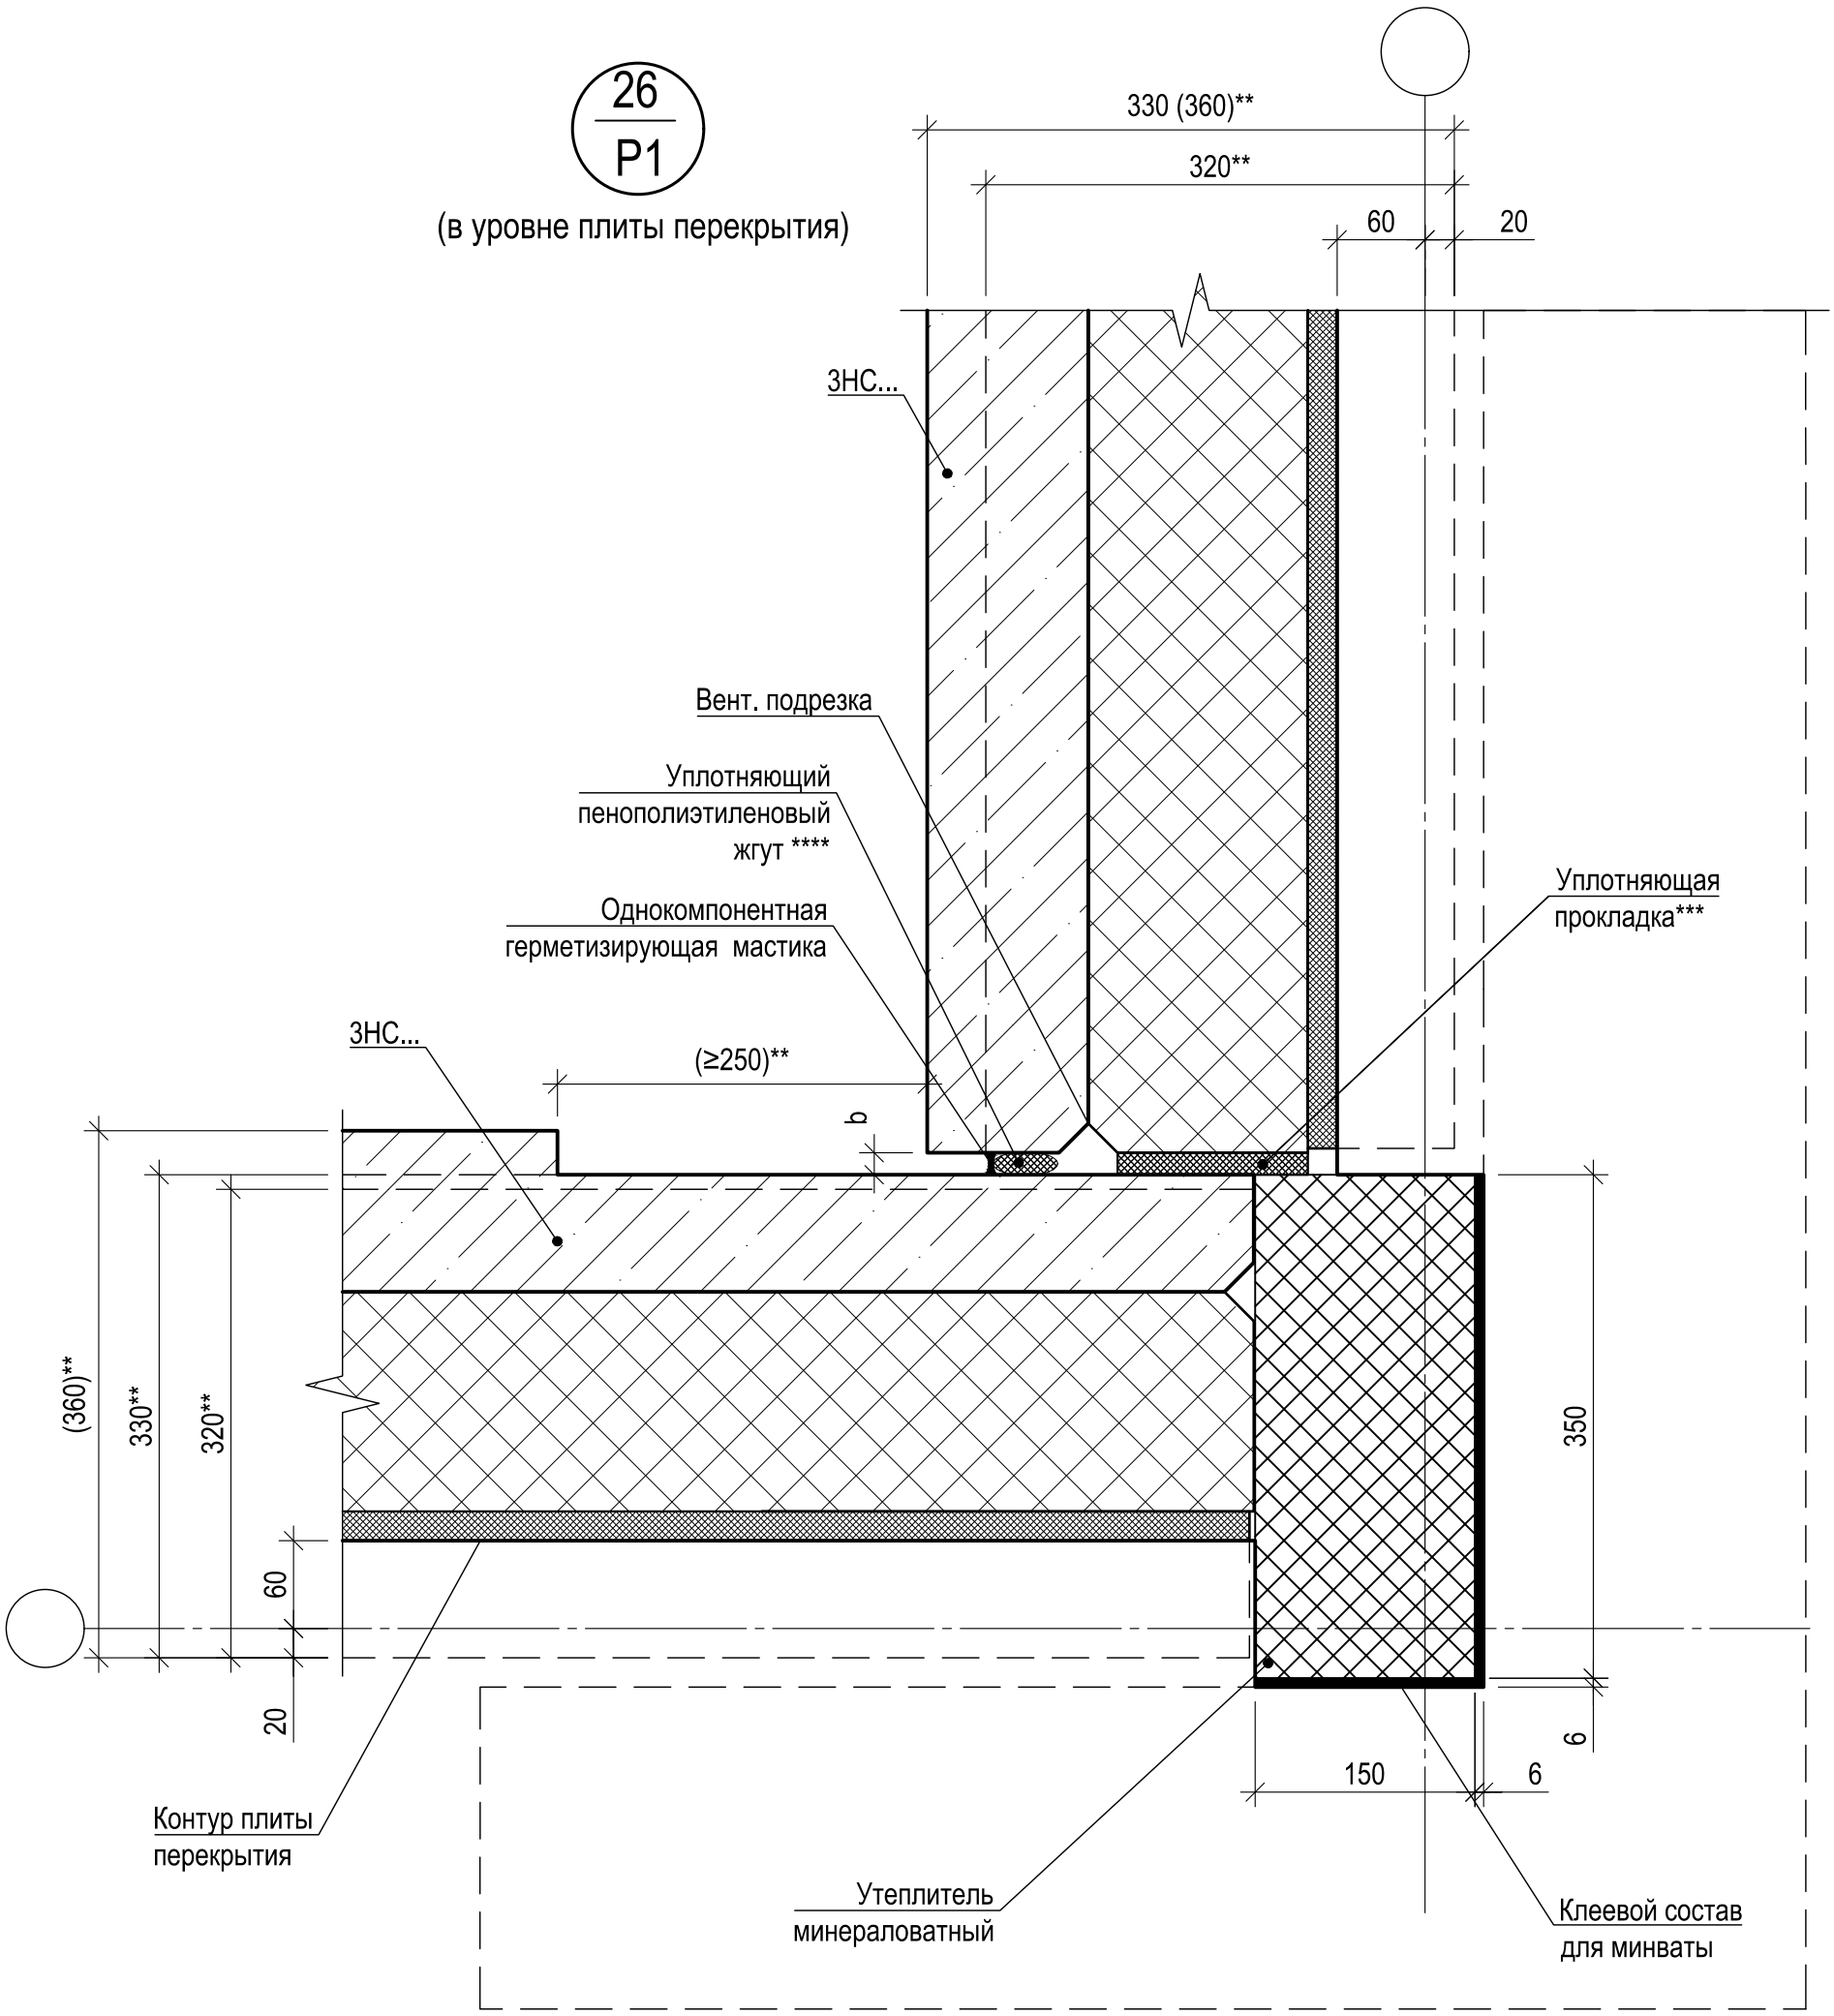

Спецификация к узлу 26/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут	3,0		$м^2$
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		$м^3$
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0056		пог.м
	ТУ производителя	Плита минераловатная	0,162		$м^3$
	ТУ производителя	Клеевой состав	1,53		$м^2$

1. Примечания к узлу 26/Р1 см. л. 52.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака


Реновация.
Жилой дом


Стадия	Лист	Листов
Р	53	

Узел 26/Р1 в уровне плиты перекрытия

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3

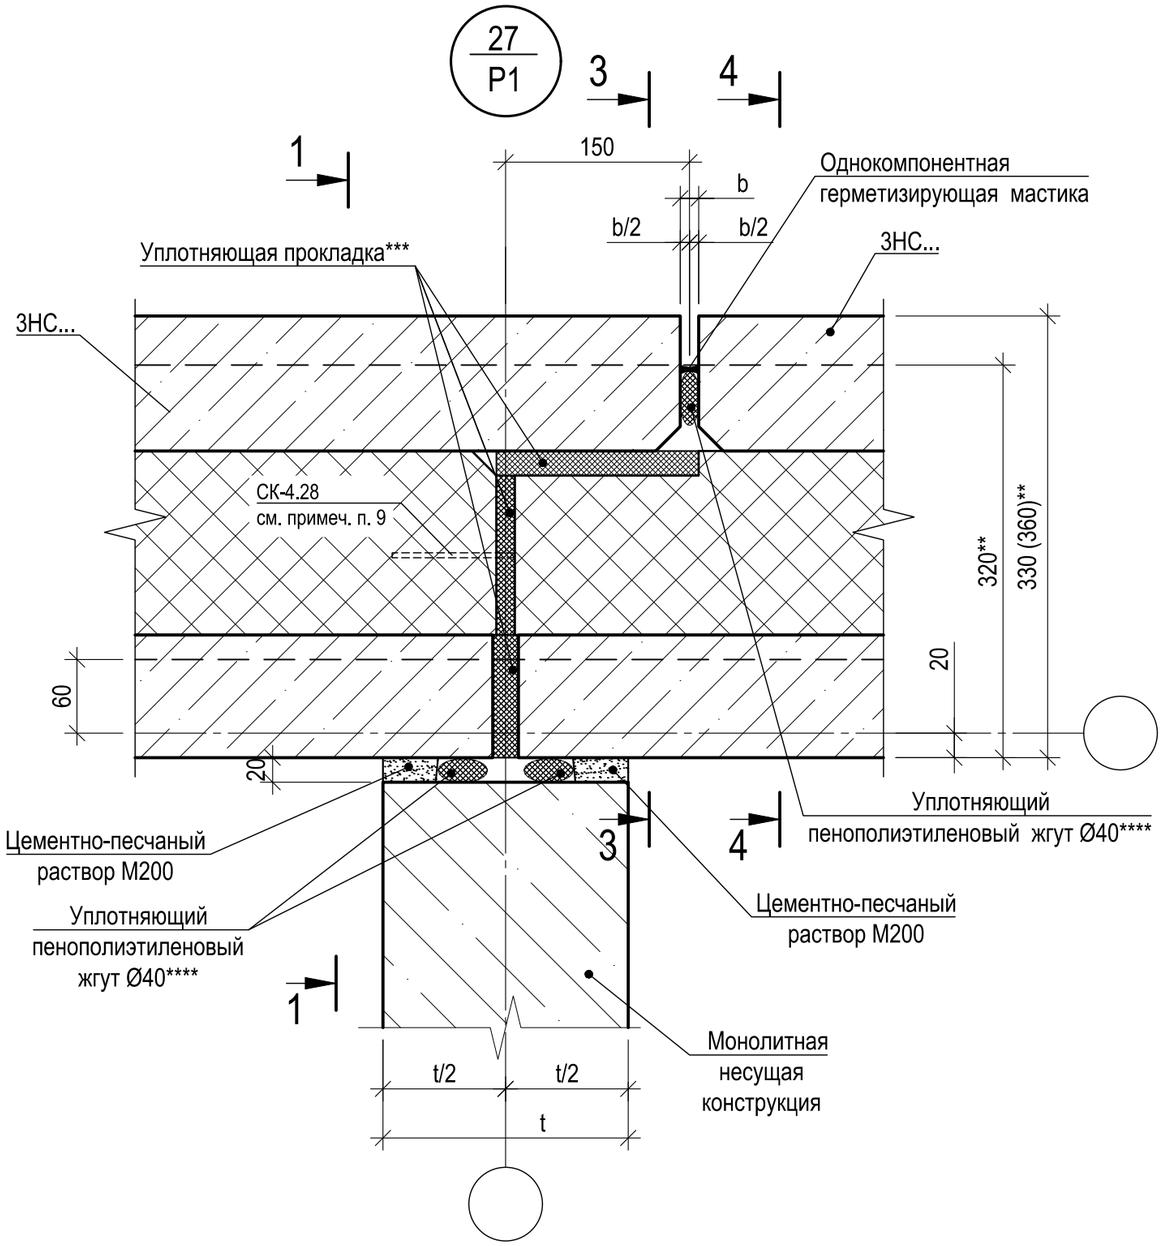

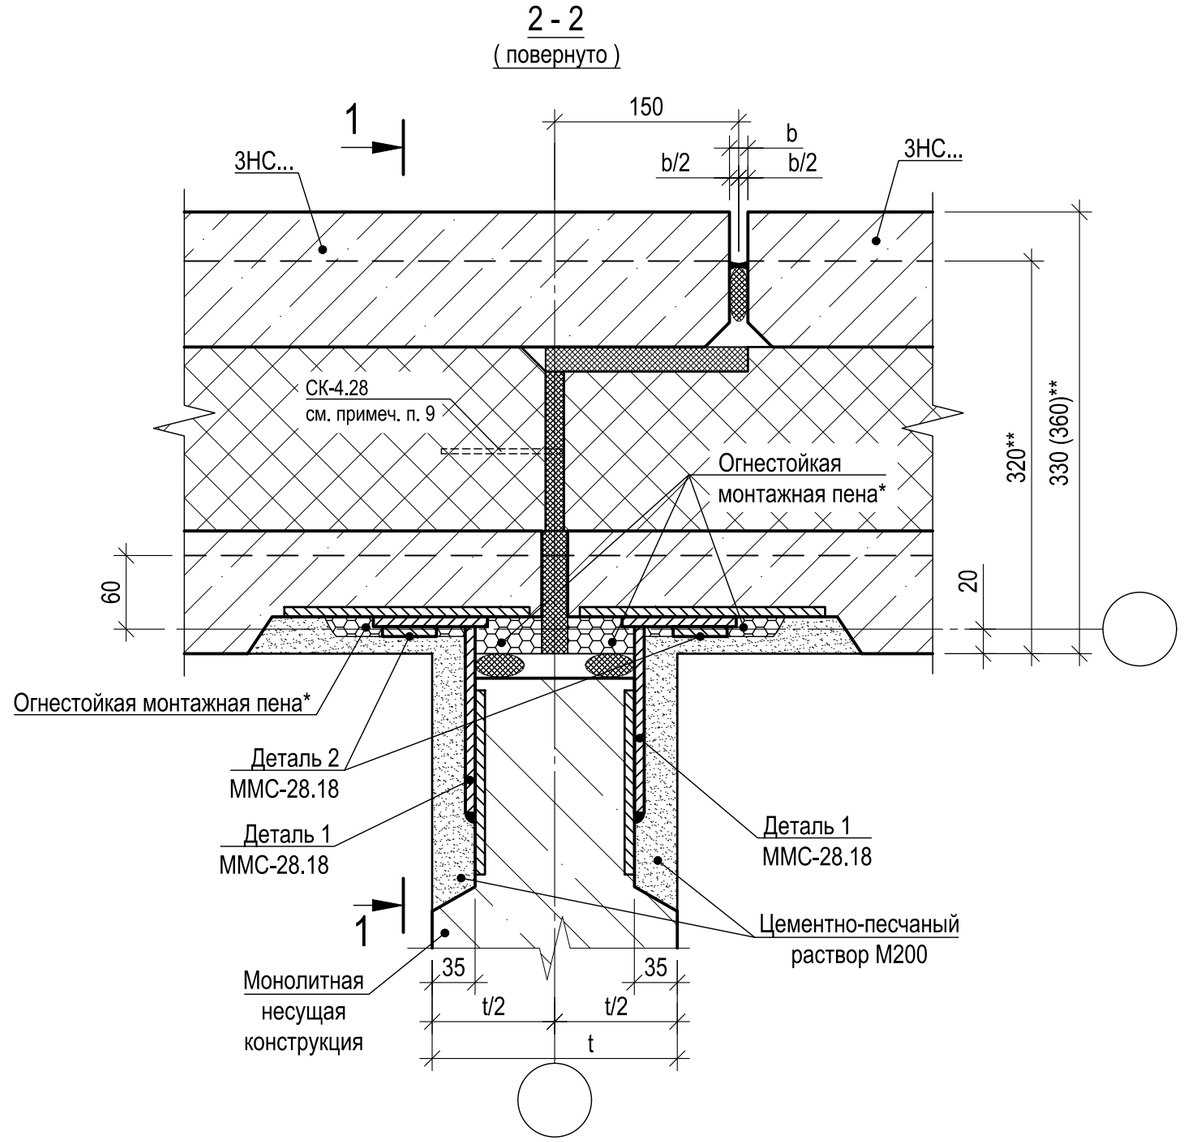

1. Сечение 1-1 см. л. 18, сечение 2-2 замаркировано на л. 18, сечения 3-3, 4-4 см. л. 55.
2. Величины толщин вертикального шва (b), горизонтального (c) шва между навесными наружными панелями см. Общие указания л. 10.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80, СП 70.13330.2012 электродами Э50А по ГОСТ 9467-75. Контроль качества сварных швов выполнять по ГОСТ 3242-79.
4. * - см. п. 13 на л. 2 и Узел заделки в зоне установки монтажной связи на л. 8.
5. ** - Указания по толщине панелей см. Общие указания л. 9.
6. *** - Прокладки крепятся при помощи металлических скоб СК-4.28 (к утеплителю) и при помощи полиуретанового клея (к бетонным поверхностям). Также указания по креплению уплотняющих прокладок см. Общие указания п. 17 на л. 2.
   Указания по маркировке уплотняющей прокладки см. Общие указания п. 18 на л. 2.
7. **** - Размер уплотняющего жгута приведен при проектной величине зазора, в случае иных размеров, диаметр уплотняющего жгута принимается согласно условию п. 15 Общих указаний на л. 2.
8. Последовательность монтажа связей см. Общие указания на л. 3.
9. СК-4.28 установить с шагом 500-600 мм из расчета 6 шт. на 3,0 п.м уплотняющей прокладки.
10. Спецификацию к узлу 27/Р1 см. л. 55.

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24


ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	54	
Узел 27/Р1	МФС Генеральный Подрядчик		

Формат А3

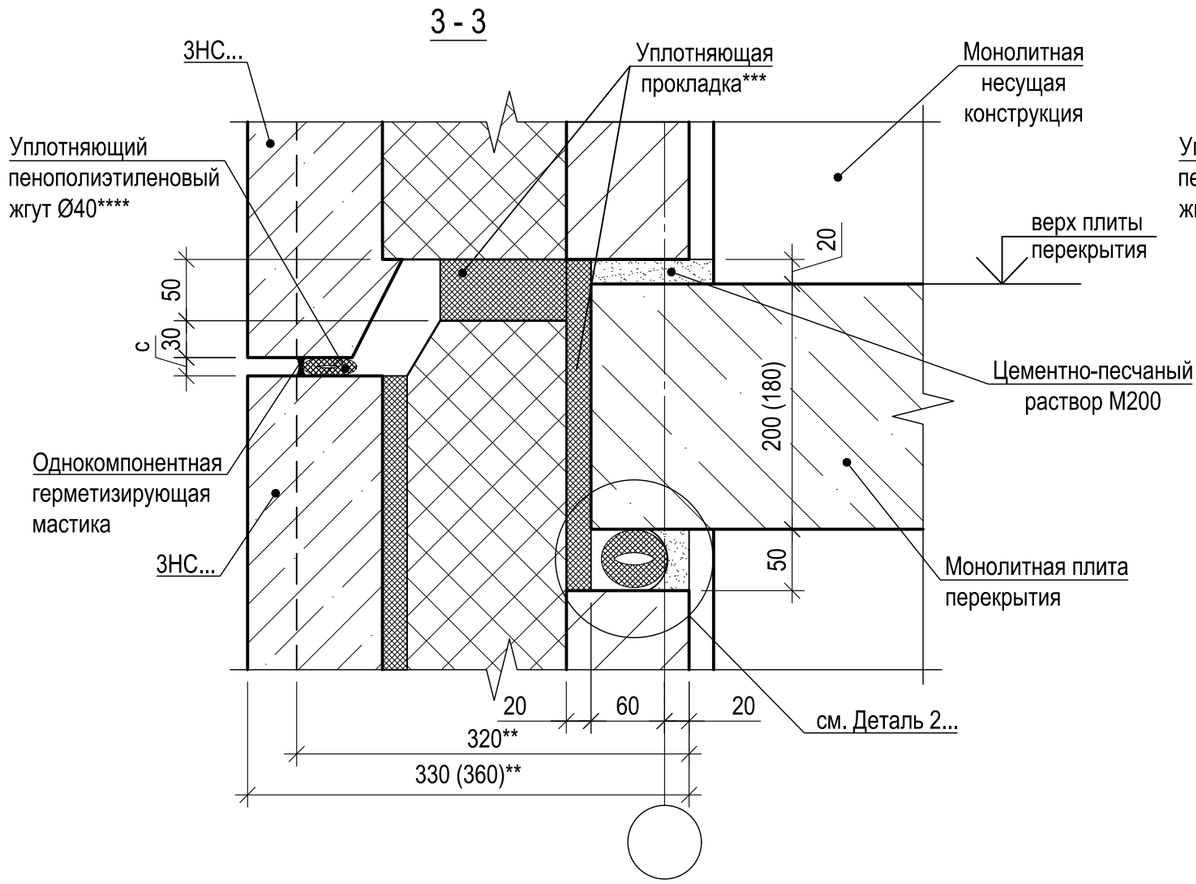

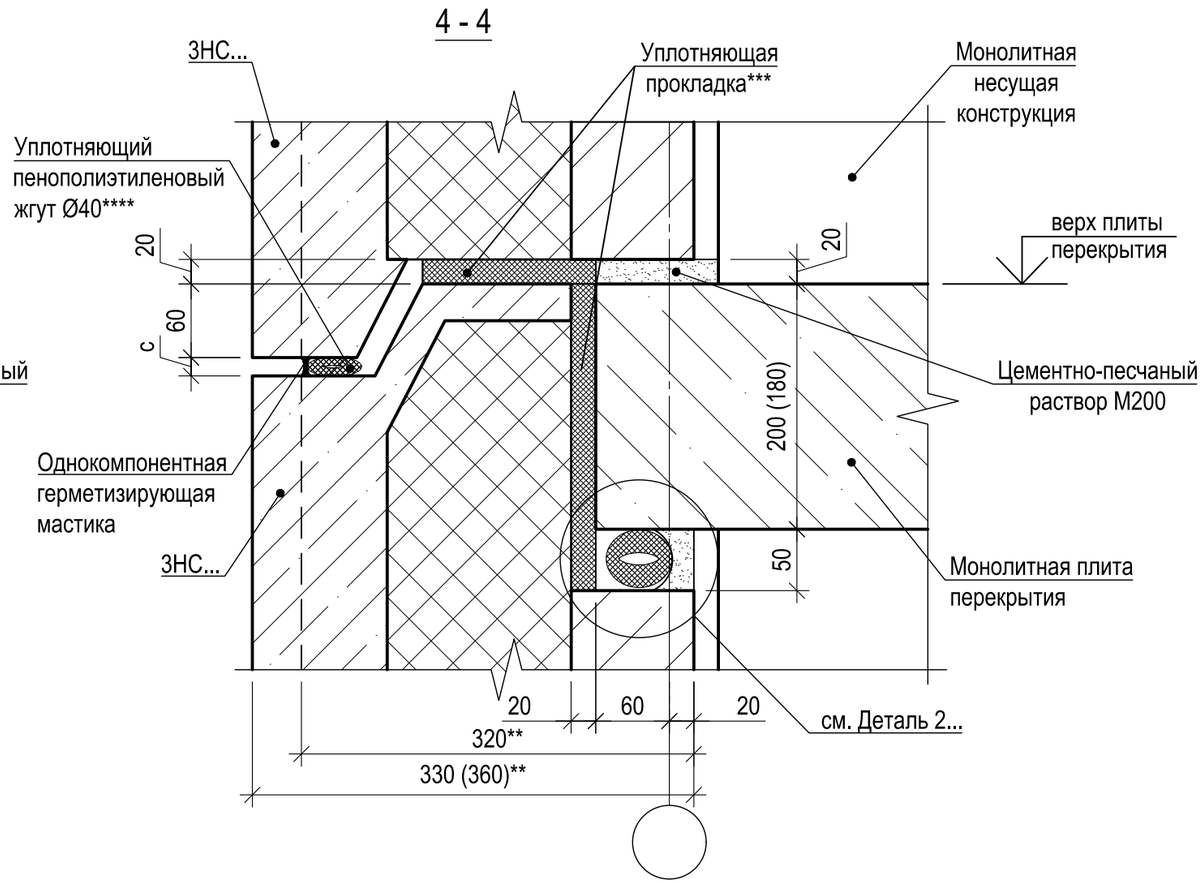

Согласовано

ВЗам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Спецификация к узлу 27/Р1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
ММС-28.18	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 12)	ММС-28.18	4	1,58	
СК-4.28	см. ведомость элементов монтажных связей (л. 11)	СК-4.28	6	0,026	
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М200	0,013		м³
	ТУ производителя	Уплотняющий пенополиэтиленовый жгут Ø40	9,0		пог. м
	ТУ производителя	Огнестойкая монтажная пена	0,0015		м³ (приведенный объем (к емкости баллона))
	ТУ производителя	Уплотняющая прокладка***	0,0195		м³
	ТУ производителя	Однокомпонентная герметизирующая мастика	0,00019		м³

1. Сечения 3-3, 4-4 замаркированы на л. 54.
2. Примечания к узлу 27/Р1 см. л. 54.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Бакланов			24.06.24
Проверил		Мачехин			24.06.24
Н. контр.		Марушкевич			24.06.24

ЖД-ТАС-РЕН-КР-КЖС-ТУ.ТЭ

Альбом типовых узлов.
Монтажные узлы сборных конструкций типовых этажей и чердака

Реновация.
Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	55	

Сечения 3-3, 4-4 к узлу 27/Р1

МФС Генеральный Подрядчик

Формат А3
