ФОНД РЕНОВАЦИИ

Московский фонд реновации жилой застройки
Ильинка ул., д. 13, г. Москва, 109012
тел.: + 7 (495) 651-07-97, + 7 (495) 651-07-67 (канц.)
https://fr.mos.ru; e-mail: info@mosfr.ru, help@mosfr.ru
ОКПО 19806148; ОГРН 1177700018319
ИНН/КПП 7703434808/771001001

Заместителю генерального директора по проектированию ООО «ГП-МФС» М.М. Скрипицыну

О результатах рассмотрения рабочей документации по объекту «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)», договор от 30.07.2021 № 120-0621-ОК-1

Уважаемый Михаил Михайлович!

Комплекты рабочих чертежей марки **20.2-АИ2.2** «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 2-х комнатная квартира для инвалида-колясочника. Корпус 20.2. Секция 2 Этаж 2-8. Отделочные чертежи.», **20.7-АИ2.1** «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 4-х комнатная квартира. Корпус 20.7. Этаж 21-25. Отделочные чертежи.» по объекту ***«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»***, направленные в Московский фонд реновации жилой застройки с сопроводительным письмом от 20.11.2024 № 2/1-22587-И, рассмотрены.

К комплектам **20.2-АИ2.2**, **20.7-АИ2.1** подготовлены замечания.

Прошу Вас дать поручение ответственным исполнителям откорректировать рабочую документацию и направить на повторное рассмотрение в кратчайшие сроки.

Приложение:
1. Замечания по комплекту **20.2-АИ2.2** на 4 л. в 1 экз.
2. Замечания по комплекту **20.7-АИ2.1** на 3 л. в 1 экз.


Начальник Территориального управления развития проектов № 5 **Н.В. Белина**

ГП-МФС ООО
Вх.№ 2/1-23496 от 28.11.2024
Количество: 1 листов



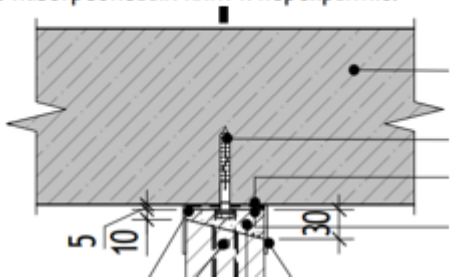
Морозова Т.Н.
+7 (495) 651-07-97, доб. 77572

Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.2-АИ2.2 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 2-х комнатная квартира для инвалида-колясочника. Корпус 20.2. Секция 2. Этаж 2-8. Отделочные чертежи.»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»

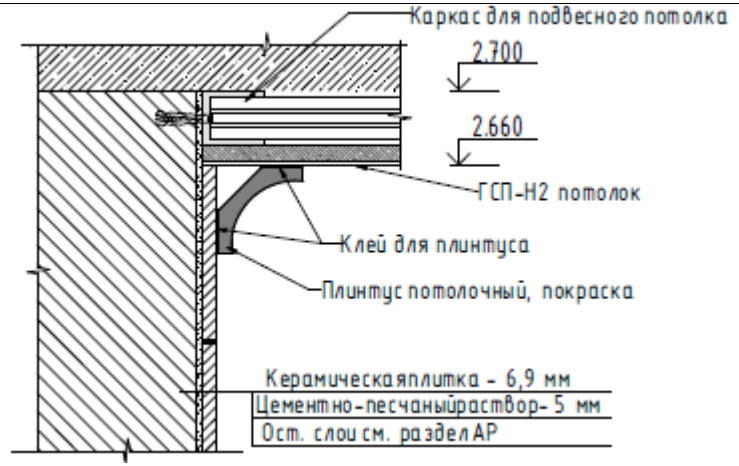
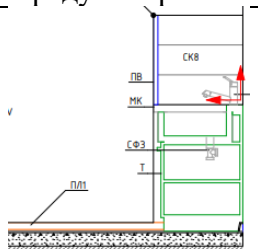

Дата замечаний**: 23.11.2024**

№ п/п	№ листа	Замечание	Обоснование	Статус замечаний
		Отклонение от ПД		
1.		Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Исключить все несоответствия.		впервые
		Оформление и комплектование тома		
1.	1	Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР. Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать. Исключить часть «Указания по укладке полов». Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий.		впервые
2.		Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони. Ламинат **Floorwood** Дуб Энтони D4620. Ламинат Swiss Krono, Europe line special Edition. Арт. 4620 Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V.		впервые
3.	2,9	На плане полов в месте примыкания керамогранитной плитки к порогу с/у замаркирован узел №1.2  На схеме узла №1.2 указано примыкание ламината к порогу с/у. Привести в соответствие. Исключить на схемах узлов информацию о типовых квартирах, не относящуюся к санузлу, выполняемому в построечных условиях * Порог для квартиры МГН не более 14 мм. ~~Порог для типовой квартиры - 15мм~~		впервые

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 2 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ





		Представленные в данном комплекте схемы узлов №1.2, 1.1 не соответствуют порогам санузлов типовых квартир на данном объекте.		
4.	2	13. Гидроизоляция в помещениях с мокрым процессом и санузлах должна быть заведена на 200 мм на стены. Информацию о подготовительных слоях указать в комплектах АР.		впервые
5.	3,12	На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели. На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам. Привести в соответствие. Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте. На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер. Узел примыкания внутренней стены из пазогребневых плит к перекрытию.  Узел верхнего примыкания газобетонной стены к ж/б перекрытию (1:10)  		впервые
6.	3	7. В помещениях шириной более 3600мм, применять полотно со стыковочным швом. Исключить данное примечание.		впервые
7.	12	Согласно АР3 перегородка между с/у и холлом/жилой комнатой выполнена из ПГП, перегородки ПГП не доходят до плиты перекрытия 15-30 мм Узел примыкания внутренней стены из пазогребневых плит к перекрытию.  На узле №6.1 зазор 15-30 мм между ПГП и плитой графически изобразить в соответствии с масштабом и поставить размер № 6.1. Типовой узел. Схема монтажа потолочного карниза. М1 : 2		впервые

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 3 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

		 Согласно АР4 изм.2 потолки в с/у в строительном исполнении выполняются на металлическом каркасе П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27): 1. Подвесной потолок на металлическом каркасе (профиль 27мм) с зашивкой одним листом ГСП-Н2 (Металлический каркас П 113 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)) - 12,5мм Согласно системе П 113 профиль направляющий ПН 28х27 крепится по периметру к стенам и имеет размер 28 мм х 27 мм, согласно изображению на узле профиль ПН 28х27 примыкает к плите перекрытия, соответственно крепеж профиля будет попадать в зазор между ПГП и плитой перекрытия Предусмотреть альтернативный способ крепления профиля в с/у.		
8.	5	 Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой.		впервые
9.		Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул).		впервые
10.		Указать описание отделки торца ванны 		впервые

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 4 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

		Проектные решения		
1.	2,12	Исключить уклон пола в квартирах инвалида (в жилой комнате и кухне) и предусмотреть общую высоту порога и перепада не более 14 мм вместо 28 мм в соответствии с п.6.2.4 СП 59. 13330.2016 Лоджия кухня 	п.6.2.4 СП 59. 13330.2016	впервые
2.	9	В схемах узлов №1.1, 1.2 для порога санузла инвалида указать высоту равной 14мм вместо «не более 14мм». 		впервые
3.		Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.		впервые
4.		Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов. Плитка в квартире плитка в МОП  		для учета в работе
		Рекомендации		
1		Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм.  Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм 	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53	впервые

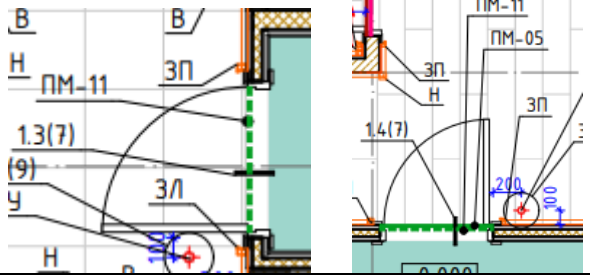
Начальник отдела технологии отделочных работ
инженерно-технологического
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 5 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24


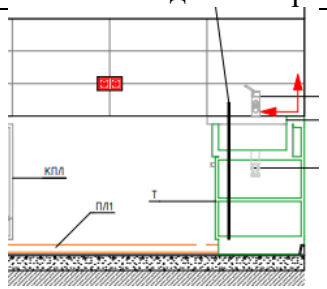

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Замечания к РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ по комплекту
20.7-АИ2.1 «Архитектурные решения интерьеров. Типовая 4-х комнатная квартира.
Корпус 20.7. Этаж 21-25. Отделочные чертежи.»
Объект «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории
по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (ЗАО)»




Дата замечаний**: 25.11.2024**

№ п/п	№ листа	Замечание	Обоснование	Статус замечаний
		Отклонение от ПД		
1.		Имеются отклонения от утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза». Исключить все несоответствия.		впервые
		Оформление и комплектование тома		
1.	1	Исключить часть «Монтаж», данная информация относится к комплектам АР. Информацию, указанную в части «Отделка помещений», указать с планами и ведомостями отделки, в общих данных не указывать. Исключить часть «Указания по укладке полов». Информацию о Т-образном профиле указать в ведомости напольных покрытий.		впервые
2.	2	Уточнить название бренда или коллекции для ламината. В каталоге Swiss Krono отсутствует ламинат Дуб Энтони. Ламинат **Floorwood** Дуб Энтони D4620. Ламинат Swiss Krono, Europe line special Edition. Арт. 4620 Дуб Энтони, 1382x195x8 мм, 32 класс, с фаской 4V.		впервые
3.	2	13. Гидроизоляция в помещениях с мокрым процессом и санузлах должна быть заведена на 200 мм на стены. Информацию о подготовительных слоях не указывать в данном комплекте.		впервые
4.	2	Исключить на плане полов профиль ПМ-11 (он учитывается в составе СТМ согласно схемам узлов №1.3, №1.4). Оставить только профиль ПМ-05 для ламината, примыкающего к порогу.  		впервые

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 6 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

5.	3,10	На схеме узла №6.2 указано примыкание натяжного потолка к наружной стеновой панели. На плане потолков узел замаркирован к стенам из блоков, из ПГП и к монолитным стенам. Привести в соответствие. Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте, в том числе, к СТМ. На узле указать зазор (в масштабе) между стеной и перекрытием в соответствии с узлами, указанными в АР, поставить размер.  		впервые
6.	3	 Исключить данное примечание.		впервые
7.	5	 Напольный плинтус указать по всему периметру стен, включая пространство за тумбой с мойкой.		впервые
8.	6	 В типовой квартире не указывать два глазка в двери.		впервые
9.	7	Исключить узлы №1.14, №1.15, т.к. они не соответствуют проектному решению по применению СТМ.		
10.		Для межкомнатных дверей и для панели МДФ внутренней отделки входной двери указать колористическое решение (производителя, коллекцию, артикул).		впервые

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 7 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

11.	10	2. Узлы для сан.узлов в строительном исполнении содержатся в 120-0621-ОК-1-20.7-АИ2.2 Отредактировать марку комплекта в ссылке: указать 20.2-АИ2.2		впервые
		Проектные решения		
1.		Исключить несоответствия между комплектами АИ и РД АР.		впервые
2.		Для отделки пола в коридоре квартиры применить плитку, более визуально отличную от плитки для облицовки пола в межквартирном коридоре. Рекомендуется применять в квартире плитку теплых тонов. Плитка в квартире плитка в МОП  		для учета в работе
		Рекомендации		
1		Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм.  Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм 	Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53	впервые

Начальник отдела технологии отделочных работ
инженерно-технологического
управления Морозова Т.Н.
tatiana.morozova@mosfr.ru
+7 (495) 651-07-97 доб. 77572

Документ зарегистрирован № ФР-15-30534/24-2 от 28.11.2024 Морозова Т.Н. (Фонд реновации)
Документ зарегистрирован № 2/1-23496 от 28.11.2024 ("ГП-МФС" ООО)
Страница 8 из 8. Страница создана: 26.11.2024 10:24
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
